


FWL Neubau Feuerwache Lohmar_Index D Entwurf - 21.01.2026

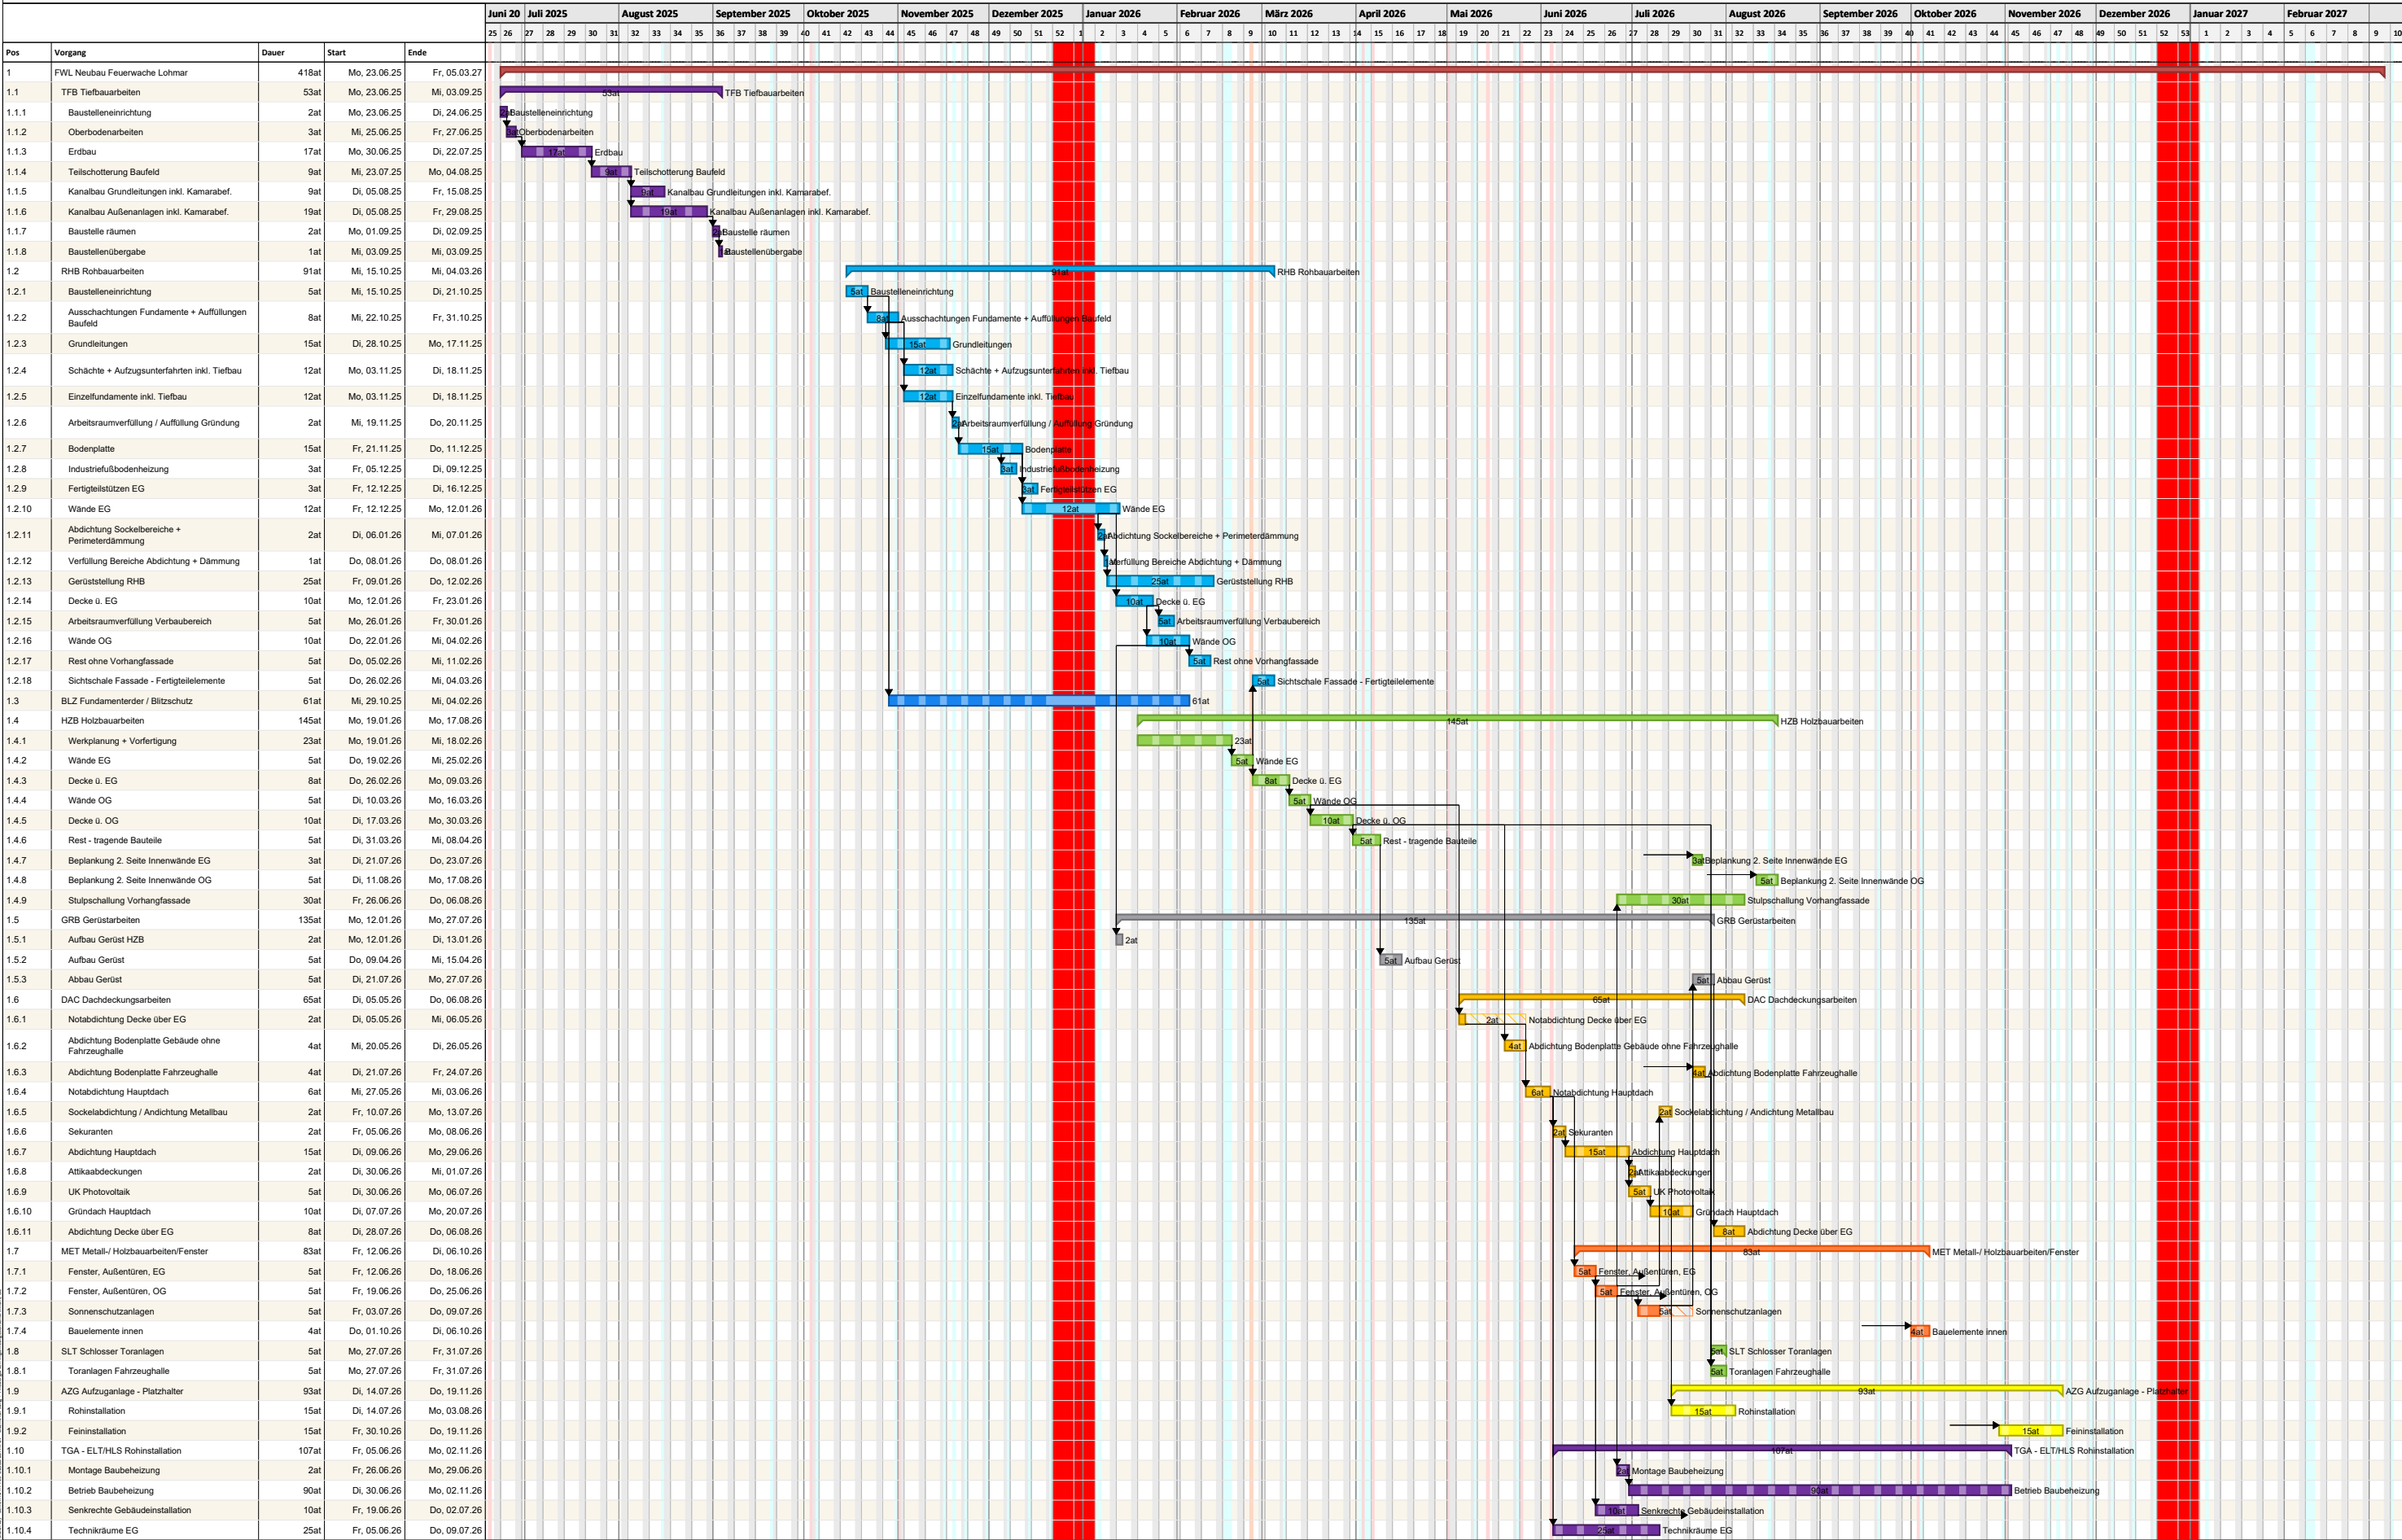

2023 (10.4) Seite 16 FWL_Ausführungsterminplan_Index D_260121.PPL

		Juni 20		Juli 2025		August 2025		September 2025		Oktober 2025		November 2025		Dezember 2025		Januar 2026		Februar 2026		März 2026		April 2026		Mai 2026		Juni 2026		Juli 2026		August 2026		September 2026		Oktober 2026		November 2026		Dezember 2026		Januar 2027		Februar 2027																																																		
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																																																																								
1.10.5	Horizontale Installation EG inkl. Fahrzeughalle	15at	Di, 30.06.26	Mo, 20.07.26																																																																																								
1.10.6	Horizontale Installation OG	15at	Di, 21.07.26	Mo, 10.08.26																																																																																								
1.11	TRB Trockenbauarbeiten	88at	Di, 23.06.26	Do, 22.10.26																																																																																								
1.11.1	TRB-Wände EG - UK + 1. Seite, inkl. UK vor Außenwänden	6at	Di, 23.06.26	Di, 30.06.26																																																																																								
1.11.2	TRB-Wände OG - UK + 1. Seite, inkl. UK vor Außenwänden	8at	Mi, 01.07.26	Fr, 10.07.26																																																																																								
1.11.3	TRB-Wände EG - 2. Seite	6at	Di, 21.07.26	Di, 28.07.26																																																																																								
1.11.4	TRB-Wände OG - 2. Seite	7at	Di, 11.08.26	Mi, 19.08.26																																																																																								
1.11.5	Decken EG	14at	Di, 15.09.26	Fr, 02.10.26																																																																																								
1.11.6	Decken OG	14at	Mo, 05.10.26	Do, 22.10.26																																																																																								
1.12	IPU Innenputzarbeiten / Lehnbauarbeiten	27at	Mo, 27.07.26	Di, 01.09.26																																																																																								
1.12.1	EG	15at	Mo, 27.07.26	Fr, 14.08.26																																																																																								
1.12.2	OG	12at	Mo, 17.08.26	Di, 01.09.26																																																																																								
1.13	EST Estricharbeiten	31at	Mo, 17.08.26	Mo, 28.09.26																																																																																								
1.13.1	Dämmung EG	7at	Mo, 17.08.26	Di, 25.08.26																																																																																								
1.13.2	Dämmung 1. OG	7at	Mi, 02.09.26	Do, 10.09.26																																																																																								
1.13.3	Estrich EG	7at	Mi, 02.09.26	Do, 10.09.26																																																																																								
1.13.4	Estrich 1. OG	7at	Fr, 18.09.26	Mo, 28.09.26																																																																																								
1.14	RTB Rüttelboden	10at	Mi, 02.09.26	Di, 15.09.26																																																																																								
1.14.1	Rüttelboden Fahrzeughalle	10at	Mi, 02.09.26	Di, 15.09.26																																																																																								
1.15	TGA - FBH Fußbodenheizung	17at	Mi, 26.08.26	Do, 17.09.26																																																																																								
1.15.1	FBH EG	5at	Mi, 26.08.26	Di, 01.09.26																																																																																								
1.15.2	FBH 1. OG	5at	Fr, 11.09.26	Do, 17.09.26																																																																																								
1.16	FLN Fliesen/Natursteinarbeiten	36at	Do, 17.09.26	Do, 05.11.26																																																																																								
1.16.1	EG Wände	10at	Do, 17.09.26	Mi, 30.09.26																																																																																								
1.16.2	EG Böden	13at	Mo, 28.09.26	Mi, 14.10.26																																																																																								
1.16.3	1. OG Wände	8at	Do, 15.10.26	Mo, 26.10.26																																																																																								
1.16.4	1. OG Böden	8at	Di, 27.10.26	Do, 05.11.26																																																																																								
1.17	Mobile Trennwand	63at	Mo, 21.09.26	Mi, 16.12.26																																																																																								
1.17.1	Tragschienen	2at	Mo, 21.09.26	Di, 22.09.26																																																																																								
1.17.2	Behänge	2at	Mi, 16.12.26	Mi, 16.12.26																																																																																								
1.18	SLB Schlosserarbeiten	31at	Mi, 14.10.26	Mi, 25.11.26																																																																																								
1.18.1	Geländer Innentreppe	2at	Di, 24.11.26	Mi, 25.11.26																																																																																								
1.18.2	Schachteldeckungen	1at	Mi, 14.10.26	Mi, 14.10.26																																																																																								
1.19	MAL Malerarbeiten	39at	Do, 15.10.26	Di, 08.12.26																																																																																								
1.19.1	EG	14at	Do, 15.10.26	Di, 03.11.26																																																																																								
1.19.2	1. OG	14at	Fr, 06.11.26	Mi, 25.11.26																																																																																								
1.19.3	Treppenhaus	3at	Do, 26.11.26	Mo, 30.11.26																																																																																								
1.19.4	Außenbauteile	3at	Di, 01.12.26	Do, 03.12.26																																																																																								
1.19.5	Restarbeiten + Finish	3at	Fr, 04.12.26	Di, 08.12.26																																																																																								
1.20	BBG Bodenbeläge	33at	Mi, 04.11.26	Fr, 18.12.26																																																																																								
1.20.1	EG	10at	Mi, 04.11.26	Di, 17.11.26																																																																																								
1.20.2	1. OG	13at	Do, 26.11.26	Mo, 14.12.26																																																																																								
1.20.3	Restarbeiten + Finish	4at	Di, 15.12.26	Fr, 18.12																																																																																								

Projektzeitrahmen von Mo, 26.05.25 bis Mi, 31.03.27
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 25.02.2026 07:01

 Heute

Bearbeiter: Nadja Flek
