

2. S-Bahn-Stammstrecke München
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz


DB Streng Vertraulich



Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
1521 2142		Bauausführung	14.10.22	22.07.29				
1717 4315		Bauausführung Hauptbauleistungen (VE7301b, VE7302)	12.01.26	22.07.29				
1718 3868		Bauphase 0	12.01.26	10.06.26				
1719 3869		Baufeldfreimachung und Vegetationsarbeiten	12.01.26	13.02.26				
1720 4889		Herstellung Baustraßen, BE-, Lagerflächen	26.01.26	16.04.26				
1721 3870		Herstellung Hauptzuwegung Herrschinger Bahnweg	26.01.26	17.02.26				
1722 6388		Aufbau Verkehrssicherung Baustraßen (begleitend)	27.01.26	31.03.26				
1723 4888		Baustraße KrBW (bis Rampe) (ENT)	18.02.26	10.03.26				
1724 4890		Rampe mit Baustraße (KrBW-2gl.EÜ) (ENT)	11.03.26	31.03.26				
1725 4887		Baustraße Herstellung 3-gl. EÜ (ENT)	11.03.26	31.03.26				
1726 4886		Baustraße Herstellung 1-gl. EÜ (ENT)	11.03.26	31.03.26				
1727 6386		Baufelder, BE-, Lagerflächen herrichten und Baustelle einrichten	18.02.26	16.04.26				
1728 6387		BE + Aufbau Verkehrssicherung abgeschlossen	16.04.26	16.04.26				
1729 6384		Umweltmaßnahmen (anteilig durch AN HBL)	17.04.26	10.06.26				
1730 3797		Biotopschutzzäune (Bautabuzonen/ Bauzaun) (Anteil DBN)	17.04.26	23.04.26				
1731 3798		Biotopschutzzäune (Bautabuzonen/ Bauzaun) (Anteil LHM)	17.04.26	23.04.26				
1732 3801		Staubschutzzäune (Anteil DBN)	17.04.26	23.04.26				
1733 3799		Bodenschutzmaßnahmen (Anteil DBN)	24.04.26	10.06.26				
1734 3800		Bodenschutzmaßnahmen (Anteil LHM)	24.04.26	10.06.26				
1735 6400		Kabelarbeiten	23.02.26	18.03.26				
1736 3872		TK; Kabelvormessungen	23.02.26	25.02.26				
1737 6401		KaMiSo (begleitend)	23.02.26	26.02.26				
1738 3874		TK-Kabel F4641 und F4640	05.03.26	10.03.26				
1739 3876		Neuverlegung u. Vorbereitung der neuen Teillängen	05.03.26	06.03.26				
1740 3877		neue Teillängen einspleißen	07.03.26	10.03.26				
1741 3878		TK-Kabel F4196	26.02.26	18.03.26				
1742 3879		Trasse vorbereiten (Kabeltrog aufdecken, Rohrtrasse reinigen u. Auffangkanäle herstellen)	26.02.26	28.02.26				
1743 3880		Kabel verlegen u. Verbindungsmuffen der neuen Teillänge vorbereiten	11.03.26	16.03.26				
1744 3881		neue Teillänge einspleißen	16.03.26	18.03.26				
1745 3882		Ingenieurbauwerke	23.02.26	03.12.27				
1746 3883		3-gl. EÜ 5504 und 5541 GRi	23.02.26	18.05.27				
1747 5458		Kabel im Baufeld sichern, bei Bedarf umverlegen, 5504 GRi	23.02.26	11.03.26				
1748 5649		Kabelbrücke herstellen und prov. Gründen	12.03.26	18.03.26				
1749 5650		Kabelbrücke an Endbereiche der Spundwand befestigen (Bauzustand)	05.06.26	05.06.26				
1750 5648		Verlegen Kabel in Kabelbrücke	06.06.26	06.06.26				
1751 6107		Verbauten	01.06.26	04.06.26				
1752 6108		OLA abschalten	01.06.26	01.06.26				
1753 5641		Einbringen Gleislängsverbau (östl. GRi) - gestaffelt zur Str. 5540	02.06.26	04.06.26				
1754 5465		Bohrpfahlwand südlich Stazione	04.05.26	10.06.26				
1755 5467		Bohrebene herstellen (ENT)	04.05.26	09.05.26				
1756 5468		Bohrschablone herstellen	09.05.26	15.05.26				
1757 5469		Bohrpfähle herstellen	16.05.26	10.06.26				
1758 5470		EÜ in Seitenlage (evtl. Verschiebung Herstelllage Richtung Osten)	05.06.26	07.05.27				
1759 5812		Arbeiten in SPP	05.06.26	15.06.26				
1760 5471		Aushub für erste Ankerlage (östl. 5504) (ENT)	05.06.26	06.06.26				
1761 5472		Einbau erste Ankerlage	06.06.26	08.06.26				
1762 5473		Aushub für zweite Ankerlage (ENT)	08.06.26	11.06.26				
1763 5474		Einbau zweite Ankerlage	11.06.26	15.06.26				
1764 5475		Aushub bis Endtiefe incl. Sohle verdichten (ENT)	16.06.26	19.06.26				
1765 5476		Aufbau Verschiebbahn in Herstelllage	19.06.26	25.06.26				
1766 5477		Sauberkeitsschicht aufbringen	26.06.26	29.06.26				
1767 5478		Fundament Süd schalen, bewehren, betonieren	29.06.26	18.07.26				
1768 5479		Fundament Nord schalen, bewehren, betonieren	18.07.26	07.08.26				
1769 5480		Rahmenwand Süd schalen, bewehren, betonieren	07.08.26	08.09.26				
1770 5481		Rahmenwand Nord schalen, bewehren, betonieren	08.09.26	09.10.26				
1771 5482		Aushärtezeit Beton Rahmenwände	10.10.26	06.11.26				
1772 5483		Schwarzanstrich erdberührter Flächen (Austrocknungszeit 21 KT)	31.10.26	07.11.26				
1773 5485		Rechtwinkliger Gleisabschluss schalen, betonieren	09.11.26	30.11.26				
1774 5486		Sockel für Grundrohr schalen, betonieren	30.11.26	07.12.26				

2. S-Bahn-Stammstrecke München
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz

DB Streng Vertraulich

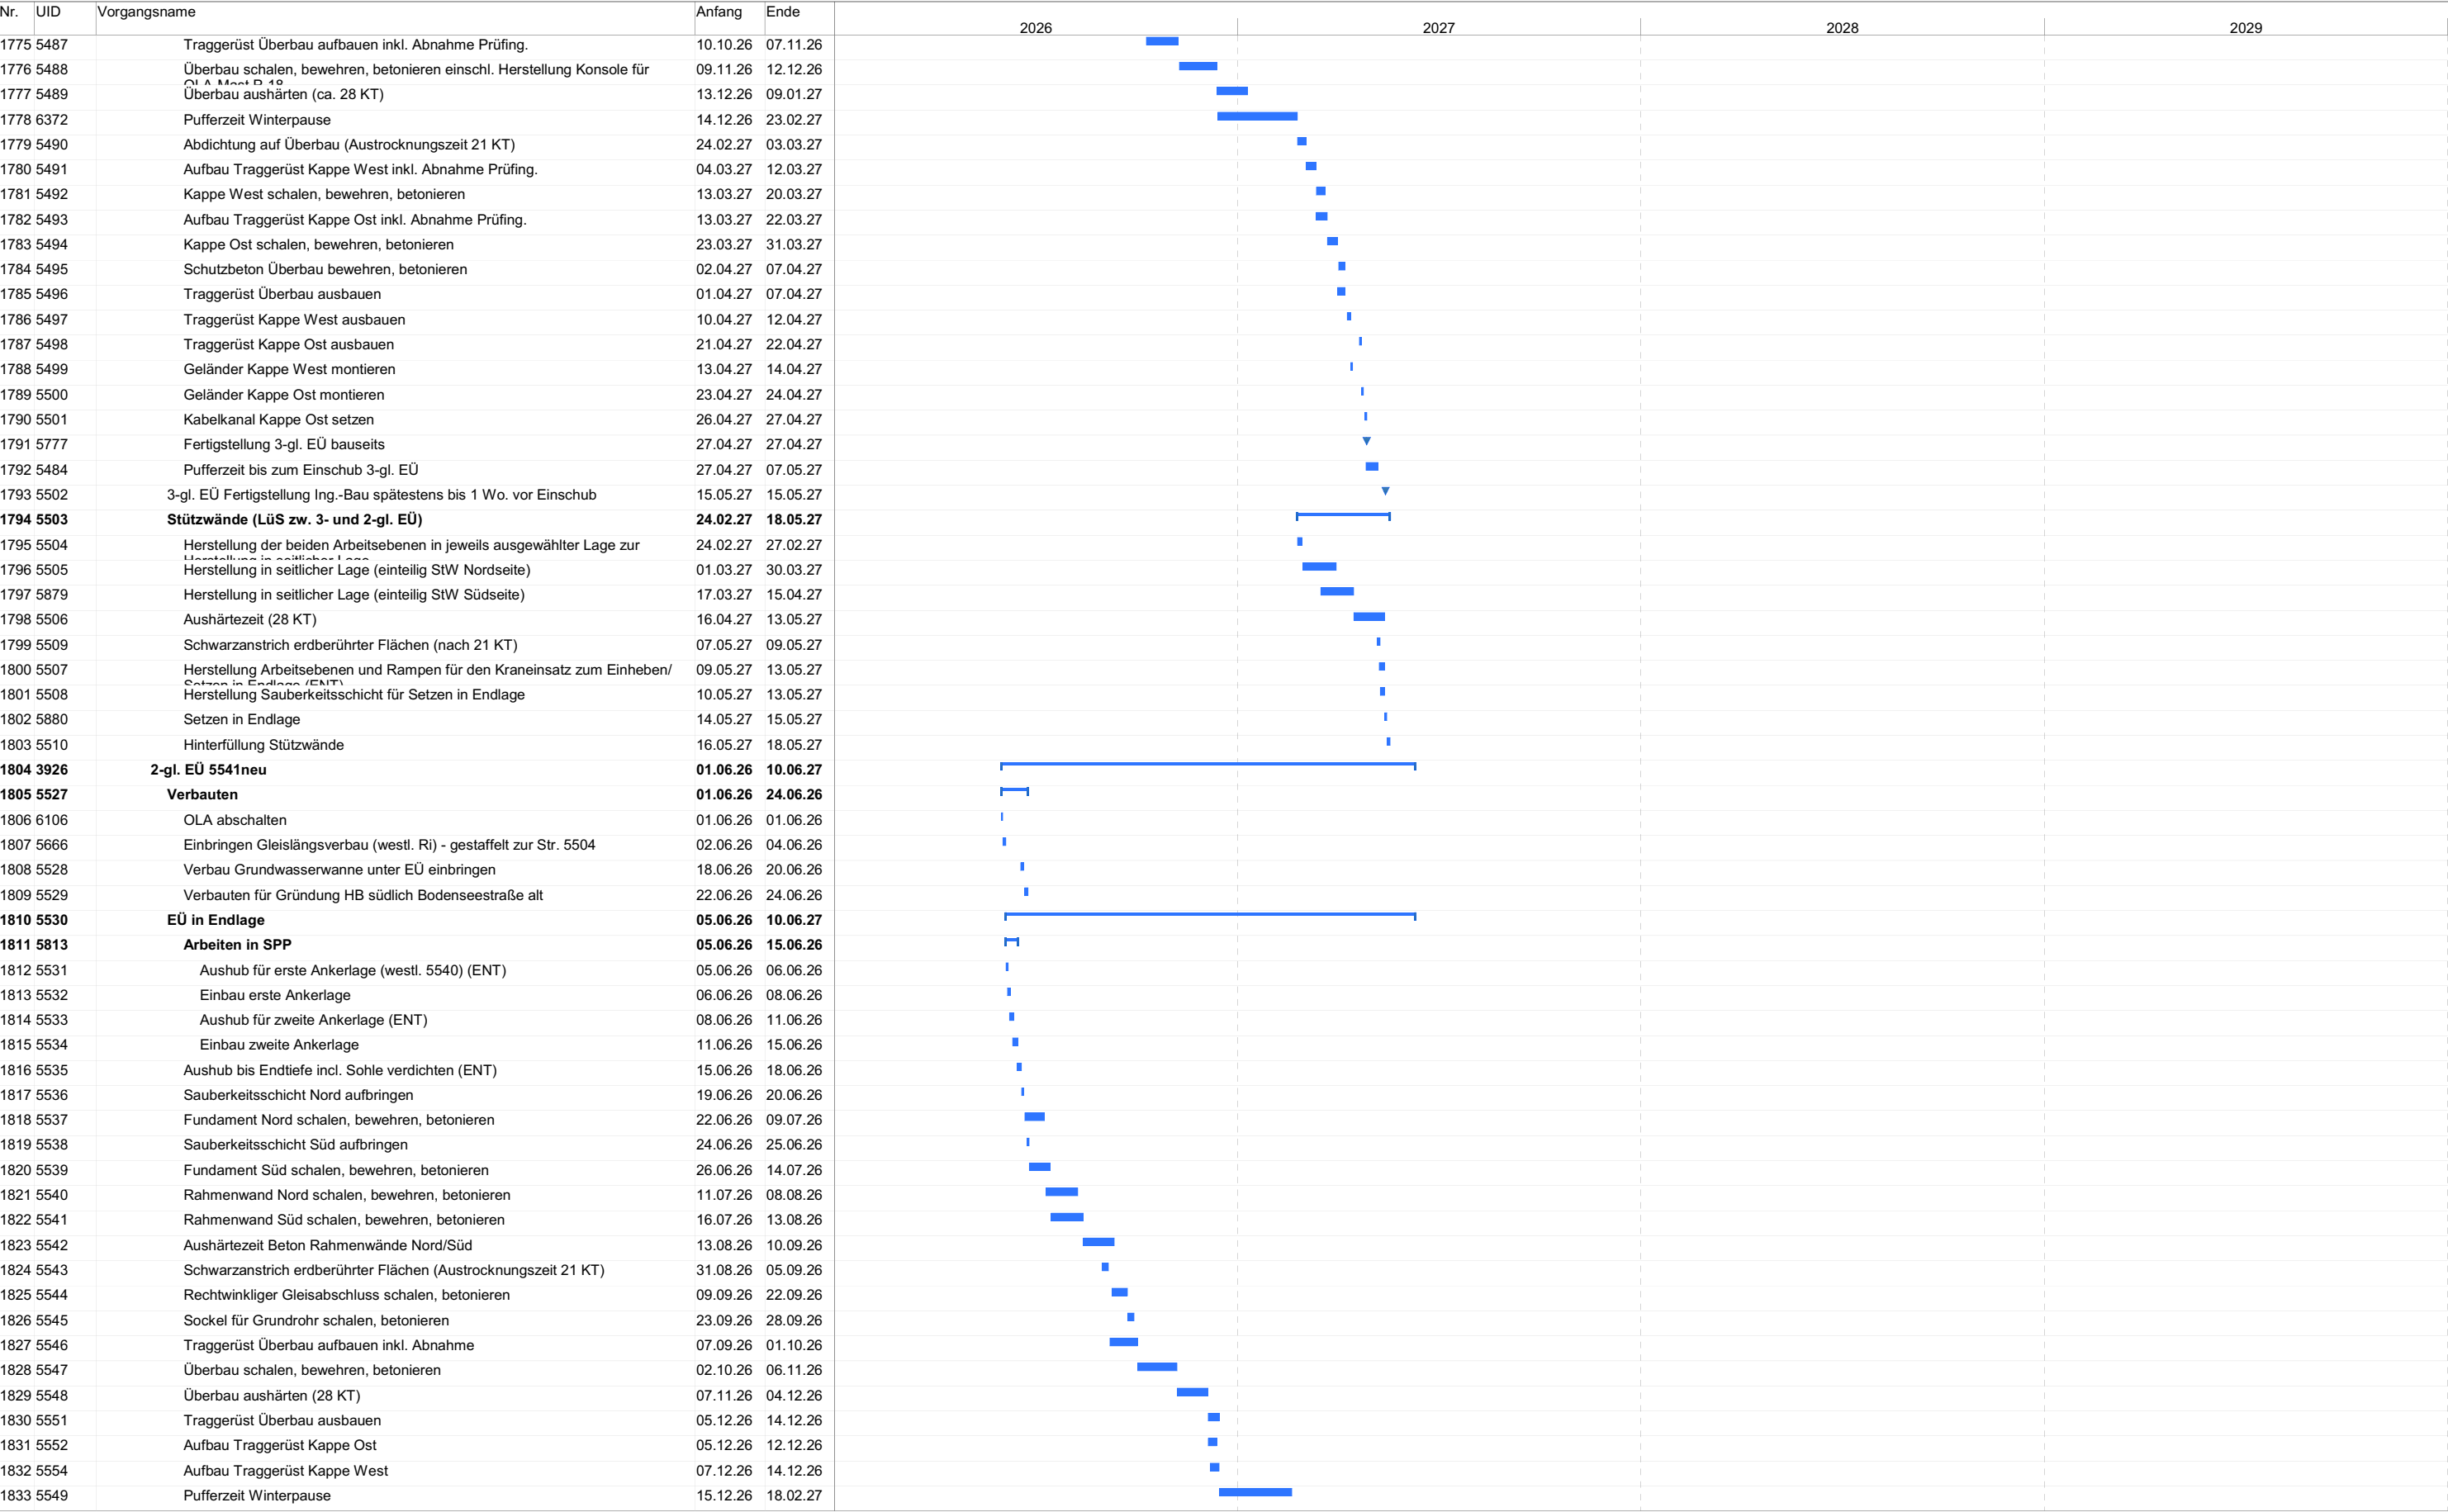

2. S-Bahn-Stammstrecke München
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz

DB Streng Vertraulich



Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
1834	5553	Kappe Ost schalen, bewehren, betonieren	19.02.27	01.03.27				
1835	5555	Kappe West schalen, bewehren, betonieren	20.02.27	02.03.27				
1836	5557	Traggerüste Kappen Ost ausbauen	12.03.27	17.03.27				
1837	5558	Traggerüste Kappen West ausbauen	13.03.27	18.03.27				
1838	5550	Abdichtung auf Überbau (Austrocknungszeit ca. 21 KT)	24.03.27	06.04.27				
1839	5556	Schutzbeton Überbau bewehren, betonieren + aushärten	07.04.27	20.04.27				
1840	5559	Geländer Kappe Ost montieren	21.04.27	23.04.27				
1841	5560	Geländer Kappe West montieren	24.04.27	27.04.27				
1842	5561	Kabelkanal Kappe Ost setzen	28.04.27	28.04.27				
1843	5562	Kabelkanal Kappe West setzen	29.04.27	29.04.27				
1844	5563	Herstellung Entwässerung 2-gl. EÜ, Filterwand beidseitig	30.04.27	15.05.27				
1845	6397	Hinterfüllung lagenweise, beidseitig, Fertigstellung Anschlussbereiche zu StW/ 2-gl. EÜ	18.05.27	20.05.27				
1846	5564	Hinterfüllung lagenweise, beidseitig, incl Dammschüttung bis Auflager HB (ENT)	21.05.27	10.06.27				
1847	5565	2-gl. EÜ Fertigstellung Ing.-Bau (zur IBN 5541 am 06.09.2027)	10.06.27	10.06.27				
1848	5566	Stützwände zw. 2- und 1-gl. EÜ (zweigeteilt, westl. der 2-gl. EÜ)	12.02.27	03.06.27				
1849	6411	Herstellung Arbeitsebenen (Nord-/ Südseite) evtl. im Schutz bauzeitl. Entwässerung	12.02.27	13.02.27				
1850	6412	Herstellung Sauberkeitsschicht (Nord-/ Südseite)	15.02.27	16.02.27				
1851	6413	Herstellung StW in Endlage (zweiteilig, Nordseite) (Anschluss an 2-gl. EÜ, StW Nord)	17.02.27	23.03.27				
1852	6414	Herstellung StW in Endlage (zweiteilig, Südseite) (Anschluss an 2-gl. EÜ, StW Süd)	12.03.27	17.04.27				
1853	6415	Aushärtezeit (ca. 28 KT)	18.04.27	15.05.27				
1854	6416	Schwarzanstrich erdberührter Flächen (Austrocknungszeit ca. 21 KT)	14.05.27	15.05.27				
1855	5569	Hinterfüllung lagenweise, beidseitig incl. Filterwand	18.05.27	03.06.27				
1856	3970	1-gl. EÜ 5540 Ri	23.02.26	03.12.27				
1857	5815	Kabel im Baufeld sichern, 5541 Ri	23.02.26	27.02.26				
1858	5816	ENT_Rückbau Bebauung Schindele Herstellbaugrube 1-gl. EÜ (ENT)	23.02.26	27.02.26				
1859	6111	Verbauten 5541	01.06.26	04.06.26				
1860	6112	OLA abschalten 5541	01.06.26	01.06.26				
1861	5684	Einbringen Gleislängsverbau (Ostseite)	02.06.26	04.06.26				
1862	5678	Einbringen Gleislängsverbau (Westseite)	02.06.26	04.06.26				
1863	5822	EÜ in Seitenlage	05.06.26	15.09.27				
1864	5861	Arbeiten in SPP	05.06.26	15.06.26				
1865	5823	Aushub für erste Ankerlage (westl. + östl. 5541 alt) (ENT)	05.06.26	06.06.26				
1866	5824	Einbau erste Ankerlage	06.06.26	08.06.26				
1867	5825	Aushub für zweite Ankerlage (westl. + östl. 5541 alt) (ENT)	08.06.26	11.06.26				
1868	5826	Einbau zweite Ankerlage	11.06.26	15.06.26				
1869	5885	Sicherung westl. Baugrube bis Baubeginn 1-gl. EÜ	16.06.26	09.03.27				
1870	5827	Aushub bis Endtiefe incl. Sohle verdichten (ENT)	10.03.27	12.03.27				
1871	5828	Aufbau Verschubbahn in Herstelllage	13.03.27	19.03.27				
1872	5829	Sauberkeitsschicht aufbringen	20.03.27	24.03.27				
1873	5830	Fundament Süd schalen, bewehren, betonieren	25.03.27	07.04.27				
1874	5831	Fundament Nord schalen, bewehren, betonieren	07.04.27	17.04.27				
1875	5832	Rahmenwand Süd schalen, bewehren, betonieren	17.04.27	10.05.27				
1876	5833	Rahmenwand Nord schalen, bewehren, betonieren	10.05.27	01.06.27				
1877	5834	Schwarzanstrich erdberührter Flächen	26.06.27	03.07.27				
1878	5835	Rechtwinkliger Gleisabschluss schalen, betonieren	07.07.27	16.07.27				
1879	5836	Sockel für Grundrohr schalen, betonieren	16.07.27	21.07.27				
1880	5837	Traggerüst Überbau aufbauen	12.05.27	03.06.27				
1881	5838	Überbau schalen, bewehren, betonieren	03.06.27	25.06.27				
1882	5839	Überbau aushärten (28 KT)	26.06.27	23.07.27				
1883	5841	Traggerüst Überbau ausbauen	24.07.27	28.07.27				
1884	5842	Aufbau Traggerüst Kappe West	19.07.27	23.07.27				
1885	5843	Kappe West schalen, bewehren, betonieren	24.07.27	30.07.27				
1886	5844	Aufbau Traggerüst Kappe Ost	24.07.27	29.07.27				
1887	5845	Kappe Ost schalen, bewehren, betonieren	31.07.27	06.08.27				
1888	5850	Traggerüste Kappe West ausbauen	19.08.27	21.08.27				
1889	5851	Traggerüste Kappe Ost ausbauen	26.08.27	28.08.27				
1890	5840	Abdichtung auf Überbau (Austrocknungszeit ca. 21 KT)	01.09.27	08.09.27				
1891	5846	Schutzbeton Überbau bewehren, betonieren	09.09.27	11.09.27				
1892	5847	Geländer Kappe West montieren	13.09.27	14.09.27				

2. S-Bahn-Stammstrecke München
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz

DB Streng Vertraulich



Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
1893	5848	Geländer Kappe Ost montieren	14.09.27	15.09.27				
1894	5849	Kabelkanal Kappe West setzen	15.09.27	15.09.27				
1895	5852	1-gl. EÜ Fertigstellung Ing.-Bau	15.09.27	15.09.27				
1896	5853	Zieltermin Fertigstellung 1 Woche vor Einschub 1-gl. EÜ	12.09.27	12.09.27				
1897	5854	Stützwände (zw. 2- und 1-gl. EÜ; zweigeteilt, Teil östl. der 1-gl. EÜ)	18.05.27	19.09.27				
1898	6402	Herstellung Arbeitsebenen (Nord-/ Südseite) evtl. im Schutz bauzeitl.	18.05.27	19.05.27				
1899	6403	Herstellung Sauberkeitsschicht (Nord-/ Südseite)	20.05.27	21.05.27				
1900	6404	Herstellung StW in Endlage (zweitellig, Nordseite) (Anschluss an 1-gl. EÜ, StW	22.05.27	24.06.27				
1901	6405	Herstellung StW in Endlage (zweitellig, Südseite) (Anschluss an 1-gl. EÜ, StW	14.06.27	15.07.27				
1902	6406	Aushärtezeit (ca. 28 KT)	16.07.27	12.08.27				
1903	6407	Schwarzanstrich erdberührter Flächen (Austrocknungszeit ca. 21 KT)	13.08.27	14.08.27				
1904	6408	Restarbeiten Hinterfüllung evtl. einschl. ziehen bauzeitl. Spundwände	16.08.27	20.08.27				
1905	6409	Geländer montieren (Nord-/ Südseite)	21.08.27	23.08.27				
1906	6410	Voraussetzungen für Einschub 1-gl. EÜ (19.09.27) erfüllt	19.09.27	19.09.27				
1907	5899	Stützwände Randeinfassung Bodenseestr. (westl. 1-gl. EÜ)	21.09.27	03.12.27				
1908	5900	Herstellung Arbeitsebenen (Nord-/ Südseite) evtl. im Schutz bauzeitl.	21.09.27	23.09.27				
1909	5906	Herstellung Sauberkeitsschicht (Nord-/ Südseite)	22.09.27	24.09.27				
1910	5901	Herstellung StW in Endlage (zweitellig, Nordseite) (Anschluss an 1-gl. EÜ, StW	24.09.27	21.10.27				
1911	5902	Herstellung StW in Endlage (zweitellig, Südseite) (Anschluss an 1-gl. EÜ, StW	09.10.27	06.11.27				
1912	5903	Aushärtezeit (ca. 22 KT)	06.11.27	28.11.27				
1913	5904	Schwarzanstrich erdberührter Flächen (Austrocknungszeit ca. 21 KT)	29.11.27	30.11.27				
1914	5907	Geländer montieren (Nord-/ Südseite)	29.11.27	30.11.27				
1915	5908	Restarbeiten Hinterfüllung evtl. einschl. ziehen bauzeitl. Spundwände	01.12.27	03.12.27				
1916	4009	Kreuzungsbauwerk inkl. Trog+Stützwände	26.05.26	06.09.27				
1917	5573	Kreuzungsbauwerk	26.05.26	08.07.27				
1918	5632	Voraussetzungen für Herstellung der Baugrube gegeben	26.05.26	26.05.26				
1919	5868	Herstellung SW-Verbauwand am GRI 5541 (L-förmige Spundwand)	27.05.26	01.06.26				
1920	5575	Aushub bis Endtiefe incl. Sohle verdichten (ENT)	02.06.26	15.06.26				
1921	5576	Sauberkeitsschicht aufbringen, abschnittsweise	16.06.26	20.06.26				
1922	5577	Fundamentplatte schalen, bewehren, betonieren (modular 5x 13 AT)	19.06.26	03.09.26				
1923	5578	Rahmenwand Süd schalen, bewehren, betonieren (modular 5x 15 AT)	03.07.26	29.09.26				
1924	5873	Aushärtezeit Beton Rahmenwände Süd	29.09.26	27.10.26				
1925	5579	Schwarzanstrich Rahmenwand Süd (modular; Austrocknungszeit 21 KT)	28.08.26	20.10.26				
1926	5580	Rechtwinkliger Gleisabschluss Süd schalen, betonieren	23.10.26	31.10.26				
1927	5581	Rahmenwand Nord schalen, bewehren, betonieren (modular 5x 15 AT)	07.07.26	02.10.26				
1928	5874	Aushärtezeit Beton Rahmenwände Nord	02.10.26	30.10.26				
1929	5582	Schwarzanstrich Rahmenwand Nord (modular; Austrocknungszeit 21 KT)	01.09.26	23.10.26				
1930	5583	Rechtwinkliger Gleisabschluss Nord schalen, betonieren	27.10.26	04.11.26				
1931	5584	Traggerüst Rahmendecke Module 1-5 einschl. Endabnahme	24.10.26	21.11.26				
1932	5872	Rahmendecke incl. Gesimse schalen, bewehren, betonieren (Modul 3+5, je ca.	07.11.26	23.12.26				
1933	5875	Aushärtezeit Rahmendecke Modul 3+5 (28 KT)	24.12.26	20.01.27				
1934	5871	Puffer Winterpause	24.12.26	24.02.27				
1935	5585	Rahmendecke incl. Gesimse schalen, bewehren, betonieren (Module 1+4+2, je	25.02.27	10.05.27				
1936	5586	Aushärtezeit Rahmendecke Module 1+4+2 (28 KT nach Betonage Modul 2)	10.05.27	07.06.27				
1937	5587	Traggerüst Rahmendecke ausbauen (modular, Module 1-5)	08.06.27	12.06.27				
1938	5588	Abdichtung auf Rahmendecke (Austrocknungszeit 21 KT) (modular, Module	01.06.27	07.06.27				
1939	5589	Schutzbeton Rahmendecke bewehren, betonieren (modular, Module 1-5)	04.06.27	10.06.27				
1940	5590	Entwässerungsrinnen Rahmendecke montieren	08.06.27	12.06.27				
1941	5592	Geländer auf Gesims montieren	08.06.27	12.06.27				
1942	5591	Ziehen SW-Spundwand; Hinterfüllung lagenweise, beidseitig (ENT)	14.06.27	08.07.27				
1943	5593	Trog und Stützwände Süd	10.10.26	08.07.27				
1944	5594	Aushub bis Endtiefe incl. Sohle verdichten (ENT)	10.10.26	14.10.26				
1945	5595	Sauberkeitsschicht aufbringen	15.10.26	16.10.26				
1946	5596	Sohle Trog schalen, bewehren, betonieren	17.10.26	26.10.26				
1947	5597	Trogwand Ost schalen, bewehren, betonieren	26.10.26	07.11.26				
1948	5598	Trogwand West schalen, bewehren, betonieren	09.11.26	21.11.26				
1949	5600	Sohle Stützwand Ost schalen, bewehren, betonieren	02.11.26	12.11.26				
1950	5601	Stützwand Ost schalen, bewehren, betonieren	12.11.26	30.11.26				
1951	5876	Aushärtezeit Beton Trog+Stützwände Süd	30.11.26	28.12.26				

Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz



Statusdatum: Fre 09.05.25 Vorgang Soll V14  Meilenstein Soll V14  Vorgang Prognose  Meilenstein Prognose  Sammelvorgang Prognose  Vorgangsfortschritt  Meilenstein abgeschlossen 

Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz



Statusdatum: Fre 09.05.25
 Druckdatum: Don 22.05.25

Vorgang Soll V14 Meilenstein Soll V14 ▼

Vorgang Prognose Meilenstein Prognose ▼

Sammelvorgang Prognose

Vorgangsfortschritt Meilenstein abgeschlossen ▼

Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz



Statusdatum: Fre 09.05.25 Vorgang Soll V14 Meilenstein Soll V14 Vorgang Prognose Meilenstein Prognose Sammelvorgang Prognose Vorgangsfortschritt Meilenstein abgeschlossen

2. S-Bahn-Stammstrecke München
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz

DB Streng Vertraulich



Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
2132	4164	OLA; Pfahlköpfe herstellen	17.06.27	03.07.27				
2133	4165	OLA; Maste aufstellen, erden, RSA montieren	02.07.27	06.07.27				
2134	5951	110kV	11.06.27	03.07.27				
2135	5952	110kV; Pfähle rammen/bohren, betonieren, 16 Kombimaste: P54(438N), P55(438N), P56(438N), P57(437N), P58(434N), P59(435N), P60(432N),	11.06.27	16.06.27				
2136	5953	OLA; Pfahlköpfe herstellen	17.06.27	03.07.27				
2137	5407	Hilfsbrücken	07.06.27	09.07.27				
2138	4166	HB; Gründung für 5541neu nördlich Bodenseestraße alt	07.06.27	10.06.27				
2139	4167	HB; Hinterfüllung Verbauten	11.06.27	28.06.27				
2140	4168	HB; Anlieferung und Zusammenbau (2 Stk)	29.06.27	09.07.27				
2141	4169	Bauphasen 2d+2e / Fertigstellung 5541	01.08.27	06.09.27				
2142	6114	Gleisüberfahrten zurückgebaut	01.08.27	01.08.27				
2143	4170	Bauphase 2d	02.08.27	07.08.27				
2144	4173	OLA; Abschaltung u. Rückbau KW, 5541 bis km 2,0 (ENT)	02.08.27	03.08.27				
2145	4174	OLA; Rückbau Anschwenkung GRi 5541 an W378 (ENT)	02.08.27	03.08.27				
2146	4175	OLA; Maste P3-12 (ENT)	04.08.27	04.08.27				
2147	4176	Vollsperrung Bodenseestraße	05.08.27	07.08.27				
2148	4177	HB; Einbau 5541neu, 2 Stück (Ausführung ohne SPP)	05.08.27	07.08.27				
2149	4178	Bauphase 2e-1	04.08.27	04.09.27				
2150	4180	KaMiSo, Suchschachtungen	04.08.27	05.08.27				
2151	4181	KTB; Herstellung für 5540/5541mit Querungen	06.08.27	15.08.27				
2152	4182	LST; Rückbau Anlagen (ENT)	06.08.27	06.08.27				
2153	4183	LST; 2 Signalfundamente rammen (70G/70GG)	07.08.27	07.08.27				
2154	5402	110 kV	04.08.27	04.09.27				
2155	4184	110 kV; Rückbau Mast 444 (ENT)	04.08.27	04.08.27				
2156	4185	110 kV; Gründung Kombimast 440N + 444N inkl. Aushärtezeit	05.08.27	08.08.27				
2157	5957	110 kV; Gründung Kombimast 440N, 444N (schnellabbindender Beton!), tags	08.08.27	08.08.27				
2158	4186	110 kV; Aufbau der Maste 444N – 450N	27.08.27	29.08.27				
2159	5959	110 kV; Aufbau und IBN 110kV-Leitung neu	30.08.27	02.09.27				
2160	4188	110 kV; Abbau der Abspann-, Trag- und Auflastprovisorien (ENT) @	01.09.27	04.09.27				
2161	4187	110 kV; IBN Leitung neu	02.09.27	02.09.27				
2162	5405	Oberbau W379	06.08.27	17.08.27				
2163	4190	Gleisrückbau (5541) ca. km 1,6-2,4 (ENT)	06.08.27	09.08.27				
2164	4191	Rückbau W379 (ENT)	06.08.27	06.08.27				
2165	4193	Erdbau Anschlussbereiche inkl. W379	08.08.27	15.08.27				
2166	4194	Neubau W379	09.08.27	10.08.27				
2167	4195	Gleisbau Anschlussbereiche inkl. W379	11.08.27	17.08.27				
2168	4196	LST; Montage Signale (gleisgebunden)	17.08.27	18.08.27				
2169	4197	LST; Montage Weichen	18.08.27	18.08.27				
2170	4198	LST; Abnahme (nur 1 ESTW betroffen; kein SWW)	19.08.27	19.08.27				
2171	5403	OLA	05.08.27	01.09.27				
2172	4189	OLA; Mastgründungen zw. W378 und 5541 neu (ENT)	05.08.27	07.08.27				
2173	4192	Rückbau Maste und Gründungen 5541 alt	06.08.27	20.08.27				
2174	4893	ENT_Rückbau Maste und Gründungen 110kV alt (ENT) @	06.08.27	20.08.27				
2175	4199	OLA; Maste aufstellen, erden, RSA u. MGI, Radspanner montieren	18.08.27	25.08.27				
2176	4200	OLA; Aufbau KW 5541neu	24.08.27	25.08.27				
2177	4201	OLA; Aufbau, Umbau Kettenwerke 5541	26.08.27	01.09.27				
2178	4202	TK-Kabel F4640, F4641, F4642 u. F7128, Neuverlegung	10.08.27	17.08.27				
2179	4203	Trasse vorbereiten (Kabeltrog aufdecken, Rohrtrasse reinigen u. auffrischen herstellen)	10.08.27	12.08.27				
2180	4204	Kabel verlegen u. Verbindungsmuffen vorbereiten	13.08.27	15.08.27				
2181	4205	neue Teillängen einspleißen	16.08.27	17.08.27				
2182	4206	Bauphase 2e-2, TSP 5540 / 5541	04.09.27	06.09.27				
2183	4209	OLA; Aufstellen Maste P3,P6; KW-Anpassung GRi 5540 (ENT)	04.09.27	05.09.27				
2184	4210	OLA; Aufbau, Kettenwerke Anschluss W378+W379	04.09.27	06.09.27				
2185	4211	Stopfarbeiten	06.09.27	06.09.27				
2186	4212	OLA; Abnahme 5541neu / Teilabnahme BSA	06.09.27	06.09.27				
2187	4213	IBN W379 neu (Adaption im ESTW entfällt, SWW nicht erf.)	06.09.27	06.09.27				
2188	4214	IBN Strecke 5541 neu	06.09.27	06.09.27				
2189	4215	Bauphasen 2f+3	25.08.27	29.10.27				
2190	4216	Baustellenzufahrt Brachvogelplatz	25.08.27	31.08.27				

2. S-Bahn-Stammstrecke München					DB			
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz								
DB Streng Vertraulich								
Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
2191	5406	Hilfsbrücke für 5540Ri	31.08.27	09.10.27				
2192	4217	HB; Herstellung nördl.+südl. Auflagerbereich	31.08.27	04.09.27				
2193	4218	HB; Verankerung/Aussteifung nördl.+südl. Auflagerbereich	04.09.27	09.09.27				
2194	4219	HB; Hinterfüllung nördl.+südl. Auflagerbereich	09.09.27	16.09.27				
2195	5888	HB; Herstellung Stahlbetonbalken nördl.+südl. Auflagerbereich einschl. Ausbaggerzeit	16.09.27	06.10.27				
2196	4220	HB; Anlieferung und Zusammenbau, 1 Stk	29.09.27	05.10.27				
2197	4221	Rückbau Überbau EÜ 5541 Bestand	30.09.27	06.10.27				
2198	4222	HB; Einbau 5540 Ri (über EÜ km 1,8+61)	07.10.27	09.10.27				
2199	4223	Vollsperrung Bodenseestraße	30.09.27	09.10.27				
2200	4224	Erdaushub einschl. Rückbau Gleislängsverbau (ENT)	11.09.27	16.09.27				
2201	4225	Einbau wasserdichter Spundwandverbau (GWW)	14.09.27	16.09.27				
2202	4226	Einbau Verschiebbahn	16.09.27	19.09.27				
2203	4227	Einschub 1-gleisige EÜ	19.09.27	20.09.27				
2204	5889	Bauwerksentwässerung beidseitig inkl. Filterwand und Zuleitungen	20.09.27	29.09.27				
2205	5909	Restarbeiten Entwässerung (Sickerschacht etc.) + Herstellung Sickergraben	24.09.27	29.09.27				
2206	4228	Hinterfüllung lagenweise, inkl. Dammschüttung bis Auflager HB (ENT)	29.09.27	09.10.27				
2207	5890	Erdbau 5540 Ri nördl./südl. Anschlussbereich 1-gl. EÜ	09.10.27	12.10.27				
2208	4229	Erdbau 5540 Ri (Anschlussbereich südl. KrB)	01.09.27	12.10.27				
2209	4230	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	05.10.27	14.10.27				
2210	4231	Gleisbau 5540 Ri	12.10.27	23.10.27				
2211	4232	SSW; Gründung Pfosten, Ri 5540 (von km 9,082 bis HB) (einschl. 14KT Ausbaggerzeit) (ENT)	20.09.27	19.10.27				
2212	4233	SSW; Stellen Pfosten, Einbau Elemente, erden, Ri 5540 (von km 9,082 bis HB)	09.10.27	29.10.27				
2214	4234	Bauphase 4a / Ende GWB	30.10.27	08.11.27				
2215	4235	Rückbau Bauweiche 35BW1	30.10.27	08.11.27				
2216	4237	LST; Rückbau Anlagen (ENT)	30.10.27	02.11.27				
2217	4238	LST; 2 Signalfundamente rammen	03.11.27	05.11.27				
2218	4239	Ausbau 35BW1 nördlich Paosostraße	30.10.27	31.10.27				
2219	4247	Anpassung ESHA W10 (Entfall 35BW1)	30.10.27	30.10.27				
2220	4240	Oberbauarbeiten Anschluss 5540 Ri an Bestand Süd	30.10.27	02.11.27				
2221	4241	OLA; Rückbau KW 35BW1 (ENT)	30.10.27	01.11.27				
2222	4242	OLA; Anschluss KW 5540 Ri an angrenzende Bereiche	31.10.27	03.11.27				
2223	4243	OLA; KW regulieren 5540 Ri, OLA-Abnahme	03.11.27	04.11.27				
2224	4244	LST; Montage Signale (gleisgebunden)	02.11.27	03.11.27				
2225	4245	LST; Abnahme	04.11.27	05.11.27				
2226	4246	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	03.11.27	05.11.27				
2227	4249	OLA; Anpassung KW im Bereich W379, Aufbau kreuzender Speiseleitung	04.11.27	06.11.27				
2228	5891	Stopfarbeiten und evtl. Probefahrten	06.11.27	08.11.27				
2229	4250	SWW ESTW-ZU M-Pa-Süd, Aufheb. GWB (6 Std)	08.11.27	08.11.27				
2230	4251	SWW ESTW-A Gauting (ESTW-UZ M Südwest), Aufheb. GWB, Rückbau 35BW1 (6 Std)	08.11.27	08.11.27				
2231	4252	SWW BZ München, Steuerbezirk 3 (2 Std)	08.11.27	08.11.27				
2232	4253	IBN NeM13, Ende GWB Strecke 5540 (08.11.2027, 04:40)	08.11.27	08.11.27				
2233	4254	Vorschlag Baumaßnahmen LHM	01.06.27	11.04.29				
2234	5892	Pufferzeit Baubeginn LHM	01.06.27	07.07.27				
2235	5894	BPh 1 - Pumpstation, Versickerbecken	08.07.27	16.08.27				
2236	5895	BPh 2	16.08.27	27.05.28				
2237	5911	BPh 2b - Pumpstation, Versickerbecken	16.08.27	20.11.27				
2238	5912	Puffer Winterzeit	20.11.27	18.02.28				
2239	5910	BPh 2a - GWW (einschl. UW-Beton) + StW	18.02.28	27.05.28				
2240	5896	BPh 3 - Bodenseestr.	27.05.28	11.10.28				
2241	5897	BPh 4 - Bodenseestr.	11.10.28	16.11.28				
2242	4256	Verkehrsfreigabe Bodenseestraße neu	16.11.28	16.11.28				
2243	4257	Puffer Verkehrsfreigabe Bodenseestraße (Trennung vertragl. Schnittstellen)	16.11.28	11.04.29				
2245	5988	SPP 2029	25.05.29	22.07.29				
2246	6424	5540/5541, Fr 25.05.29, 22:40 - Sa 26.05.29, 04:40, 6 Std (Einbau Bau-Iso)	25.05.29	25.05.29				
2247	5913	TSP 5504, Sa 26.05.29 04:40 Uhr - Mo 04.06.29 00:40 Uhr	26.05.29	04.06.29				
2248	5990	ESP 5540 GRi, Sa 26.05.29 04:40 Uhr - Mo 04.06.29 00:40 Uhr	26.05.29	04.06.29				
2249	5989	TSP 5541, Sa 26.05.29 04:40 Uhr - Mo 04.06.29 00:40 Uhr	26.05.29	04.06.29				
2250	6425	5540/5541, Mo 04.06.29, 00:40 - Mo 04.06.29, 04:40, 4 Std (Ausbau Bau-Iso)	04.06.29	04.06.29				
2251	5992	ESP 5504, Mo 04.06.28 22:40 Uhr - Mi 20.06.28 04:40 Uhr, schichtweise nachts	04.06.29	20.06.29				
Statusdatum: Fre 09.05.25 Druckdatum: Don 22.05.25		Vorgang Soll V14	Meilenstein Soll V14	Vorgang Prognose	Meilenstein Prognose	Sammelvorgang Prognose	Vorgangsfortschritt	Meilenstein abgeschlossen
RZ2.SBSS<70-13_STP_NEM13_Westkreuz>					Seite 9 / 10			

2. S-Bahn-Stammstrecke München								
Projekt 70-13_STP_NEM13_Westkreuz								
DB Streng Vertraulich								
Nr.	UID	Vorgangsname	Anfang	Ende	2026	2027	2028	2029
2252	5993	ESP 5540, Mo 04.06.28 22:40 Uhr - Mi 20.06.28 04:40 Uhr, schichtweise nachts	04.06.29	20.06.29				
2253	5994	ESP 5541, Mo 04.06.28 22:40 Uhr - Mi 20.06.28 04:40 Uhr, schichtweise nachts	04.06.29	20.06.29				
2254	6426	5540, Fr 15.06.29, 22:40 - Sa 16.06.29, 04:40, 6 Std (Einbau Bau-Iso)	15.06.29	15.06.29				
2255	5991	ESP 5540, Fr 15.06.29 22:40 Uhr - Mo 18.06.29 04:40 Uhr	15.06.29	18.06.29				
2256	6427	5540, Mo 18.06.29, 00:40 - Mo 18.06.29, 04:40, 4 Std (Ausbau Bau-Iso)	18.06.29	18.06.29				
2257	6389	5504/5540/5541, Belastungsstopfgang	21.07.29	22.07.29				
2258	4258	Bauphase 4b / Rückbau Bestands-EÜ bzw. Hilfsbrücken	11.04.29	18.06.29				
2259	6033	Erneute Baustelleneinrichtung für Aufnahme Restarbeiten	11.04.29	20.04.29				
2260	4259	Rückbau Straßenoberbau einschl. Leitungen/Kabel Bodenseestraße (innerhalb neuer DB-Grenze)	20.04.29	28.04.29				
2261	4260	4-gl. EÜ 5504/5540	25.05.29	04.06.29				
2262	4263	OLA; Einbau Bautrenner in GRi 5540 (Abschaltung SG11, Sperrung GRi 5541)	25.05.29	25.05.29				
2263	4264	Kabelsicherung	25.05.29	25.05.29				
2264	4265	Rückbau Überbau u. Teilrückbau Unterbauten bis SO -1,70 m (ENT)	25.05.29	27.05.29				
2265	4266	Dammschüttung 5504 und GRi 5540, dreigleisig	27.05.29	31.05.29				
2266	4268	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	01.06.29	02.06.29				
2267	4267	Oberbauarbeiten 5504 und GRi 5540, dreigleisig, evtl. Stopfarbeiten	31.05.29	02.06.29				
2268	4270	OLA; Fahrdrahttausch in Ri 5540 inkl. Abnahme OLA	02.06.29	04.06.29				
2269	4269	OLA; Ausbau Bau-Iso in Gri 5540 (Sperrung GRi 5541und Abschaltung SG11)	04.06.29	04.06.29				
2270	4271	IBN Erdbauwerk 5504, GRi 5540 (gemeinsame Fertigstellung mit 5541)	04.06.29	04.06.29				
2271	4272	Hilfsbrücken 5541	25.05.29	04.06.29				
2272	4274	OLA; Einbau Bautrennern (Abschaltung SG11)	25.05.29	25.05.29				
2273	4275	Kabelsichericherung	25.05.29	25.05.29				
2274	4276	2xHB; Ausbau, Ziehen beidseitige Auflagerbereiche und entf. StB-Balken (ENT)	27.05.29	29.05.29				
2275	5915	Rückbau Straßenoberbau etc. ist erfolgt (zsmn mit Bereich 4-gl-EÜ alt)	29.05.29	29.05.29				
2276	4278	Dammschüttung 5541, zweigleisig (parallel zum Bereich 4-gl. EÜ)	29.05.29	01.06.29				
2277	4280	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	02.06.29	03.06.29				
2278	4279	Oberbauarbeiten 5541, zweigleisig	01.06.29	03.06.29				
2279	4281	OLA; Ausbau Bautrenner (Abschaltung SG11)	04.06.29	04.06.29				
2280	4282	IBN Erdbauwerk 5541 (gemeinsame Fertigstellung mit 5504/5540)	04.06.29	04.06.29				
2281	4283	Hilfsbrücke 5540 Ri	25.05.29	04.06.29				
2282	4286	OLA; Einbau Bautrenner (Abschaltung SG22, Sperrung Ri 5541)	25.05.29	25.05.29				
2283	4287	Kabelsicherung	25.05.29	25.05.29				
2284	4288	HB; Ausbau, Ziehen beidseitige Auflagerbereiche und entf. StB-Balken	25.05.29	26.05.29				
2285	5917	Teilrückbau Unterbauten bis SO -1,70 m (ENT)	26.05.29	28.05.29				
2286	5916	Rückbau Straßenoberbau etc. ist erfolgt (zsmn mit Bereich 4-gl-EÜ alt)	29.05.29	30.05.29				
2287	4289	Dammschüttung 5540 Ri, eingleisig	01.06.29	03.06.29				
2288	4292	Kabeltiefbau und Kabelverlegung	02.06.29	03.06.29				
2289	4290	Oberbauarbeiten 5540 Ri, eingleisig	03.06.29	04.06.29				
2290	4291	SSW; Rammrohre gründen, Ausbilden StB-Köpfe, ca. 40 m (Bereich alte Bodenseestraße)	02.06.29	04.06.29				
2291	4294	OLA; Ausbau Bautrennern (Abschaltung SG22, Sperrung Ri 5541 ??)	04.06.29	04.06.29				
2292	4295	IBN Erdbauwerk RiG5540 Bodenseestr.	04.06.29	04.06.29				
2293	5919	Fertigstellung Schallschutzwand	04.06.29	18.06.29				
2294	5920	Aushärtezeit StB-Köpfe SSW-Gründungen	04.06.29	15.06.29				
2295	5918	SSW; Pfosten setzten, Elemente einbauen, erden, ca. 40 m (Bereich alte Bodenseestraße)	15.06.29	18.06.29				
2296	4296	TK-Kabel	02.06.29	03.06.29				
2297	4297	Kabelabschlussmessungen (gesamthaft)	02.06.29	03.06.29				
2299	4299	Bauphase 5 / Restarbeiten (nach Bedarf)	04.06.29	22.07.29				
2300	5995	Restliche SSW-Elemente setzen (bei Bedarf)	19.06.29	20.06.29				
2301	4301	Rückbau verbliebene Maste	04.06.29	11.06.29				
2302	4302	Rückbau Gründungskörper	09.06.29	20.06.29				
2303	4303	Gleisweise FD-Tausch in OL-Abschaltungen (8 Std.) (??)	13.06.29	20.06.29				
2304	6428	Belastungsstopfgang, Strecken 5504/5540/5541	21.07.29	22.07.29				
2305	4748	Abschluss der Bauarbeiten / Baustelle geräumt	20.06.29	20.06.29				
2306	4305	Inbetriebnahmen	10.07.25	20.06.29				
2307	6226	Reserve IBN Fahrplanwechsel	09.11.27	06.12.27				
2308	4314	IBN NeM13 (Herstellung Niveaufreiheit vor Baubeginn LHM)	06.12.27	06.12.27				
2309	4749	IBN baulicher Endzustand	20.06.29	20.06.29				
Statusdatum: Fre 09.05.25 Druckdatum: Don 22.05.25					Vorgang Soll V14 Meilenstein Soll V14 Vorgang Prognose Meilenstein Prognose Sammelvorgang Prognose Vorgangsfortschritt Meilenstein abgeschlossen			
RZ2.SBSS<70-13_STP_NEM13_Westkreuz>					Seite 10 / 10			
