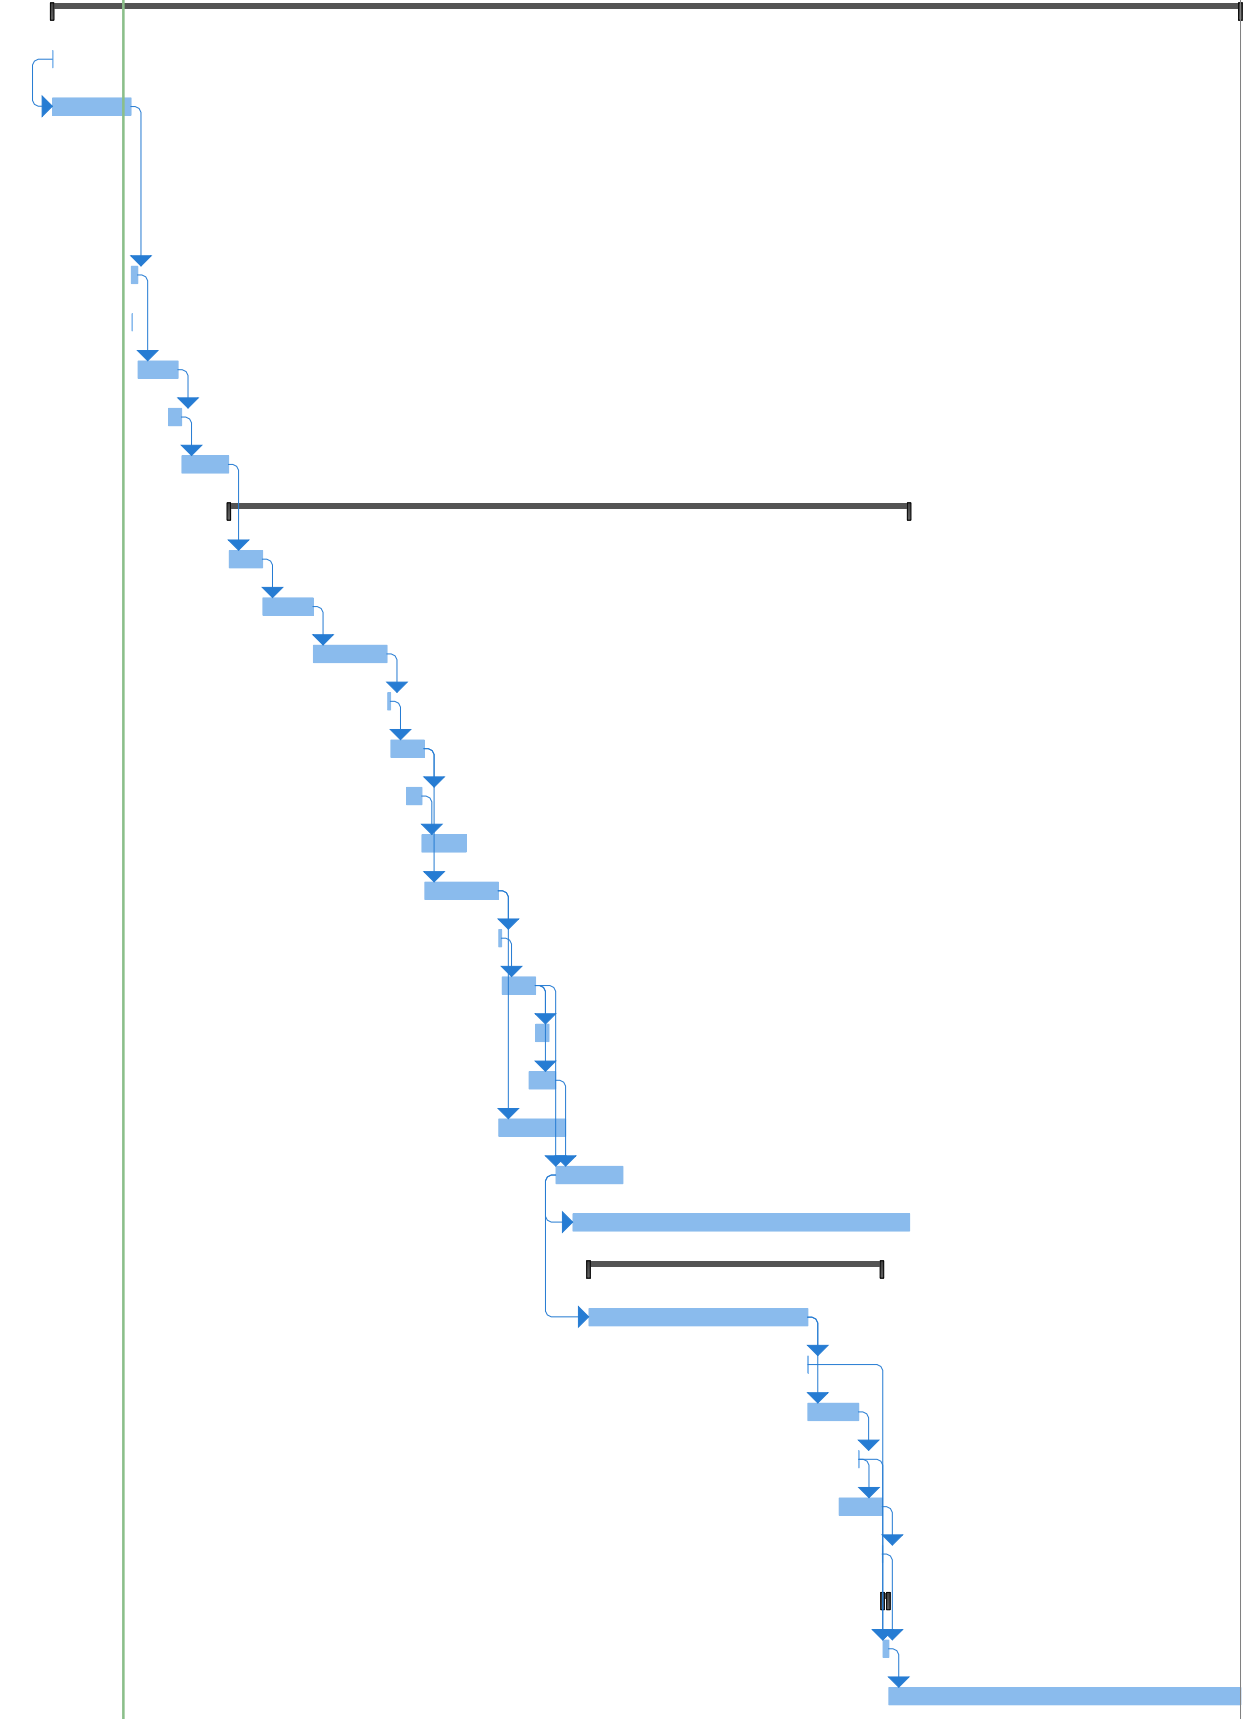


Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3																											
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1			BLB_UDE_Sanierung Folkwangflügel R 12 R	3527 Tage	Die 07.05.24	Mit 11.11.37																												
2			Kick-Off BLB/UDE/FP	1 Tag	Die 07.05.24	Die 07.05.24																												
3			Zusammenstellung Unterlagen für Nutzer-Soll-Vereinbarung (NSV) (Prüfung der Bedarfsplanung/Wertung/Kosten/Termine etc.) einschl. Präsentation	234 Tage	Die 07.05.24	Fre 28.03.25																												
4			Nutzer-Soll-Vereinbarung (NSV)	20 Tage	Mon 31.03.25	Fre 25.04.25																												
5			PA-Z Termin	1 Tag	Mit 02.04.25	Mit 02.04.25																												
6			Freigabe seitens des Ministeriums	120 Tage	Mon 28.04.25	Fre 10.10.25																												
7			Genehmigung Planungsantrag (BLB intern)	2 Monate	Mon 01.09.25	Fre 24.10.25																												
8			FBT_Ausschreibungsverfahren (EU-Vergabe)	140 Tage	Mon 27.10.25	Fre 08.05.26																												
9			Planungsphase	2020 Tage	Mon 11.05.26	Fre 03.02.34																												
10			LPH1: Grundlagenermittlung / Bestandsaufnahme	100 Tage	Mon 11.05.26	Fre 25.09.26																												
11			LPH2: Vorplanung	150 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.04.27																												
12			LPH3: Entwurfsplanung	220 Tage	Mon 26.04.27	Fre 25.02.28																												
13			Freigabe UDE LPH 3	10 Tage	Mon 28.02.28	Fre 10.03.28																												
14			Plan-Soll-Vereinbarung (PSV) nach LpH 3	100 Tage	Mon 13.03.28	Fre 28.07.28																												
15			LPH4: Genehmigungsplanung	45 Tage	Mit 17.05.28	Die 18.07.28																												
16			Erteilung Baurecht	132 Tage	Mit 19.07.28	Don 18.01.29																												
17			LPH5: Ausführungsplanung	220 Tage	Mon 31.07.28	Fre 01.06.29																												
18			Freigabe UDE LPH 5	10 Tage	Mon 04.06.29	Fre 15.06.29																												
19			Bau-Soll-Vereinbarung (BSV) nach Beendigung LPH 5	100 Tage	Mon 18.06.29	Fre 02.11.29																												
20			Einzelvereinbarung unter Gremienvorbehalt	40 Tage	Mon 05.11.29	Fre 28.12.29																												
21			Durchführungsantrag VR	80 Tage	Mon 08.10.29	Fre 25.01.30																												
22			LPH6: Vorbereitung der Vergabe	200 Tage	Mon 04.06.29	Fre 08.03.30																												
23			LPH7: Mitwirkung bei der Vergabe	200 Tage	Mon 28.01.30	Fre 01.11.30																												
24			LPH8: Objektüberwachung	1000 Tage	Mon 08.04.30	Fre 03.02.34																												
25			Baudurchführung	871 Tage	Fre 14.06.30	Fre 14.10.33																												
26			1. Bauabschnitt: Ausbau Hauptgebäude	649 Tage	Fre 14.06.30	Mit 08.12.32																												
27			Fertigstellung 1. BA	1 Tag	Don 09.12.32	Don 09.12.32																												
28			2. Bauabschnitt: Rückbau R13 V und R12 R Werkstatt	151 Tage	Don 09.12.32	Don 07.07.33																												
29			Fertigstellung 2. BA	1 Tag	Fre 08.07.33	Fre 08.07.33																												
30			3. Bauabschnitt: Aussenanlagen	129 Tage	Mon 18.04.33	Don 13.10.33																												
31			Fertigstellung 3. BA	1 Tag	Fre 14.10.33	Fre 14.10.33																												
32			Gesamtfertigstellung	18 Tage	Mon 17.10.33	Mit 09.11.33																												
33			Abnahmen/Inbetriebnahmen/Mängelbeseitigung/Nachbegehung	18 Tage	Mon 17.10.33	Mit 09.11.33																												
34			LPH9 Gewährleistung 4 Jahre	1045 Tage	Don 10.11.33	Mit 11.11.37																												

Projekt: BLB_UDE_Folkwangflüg

Datum: Mit 26.02.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 1
