


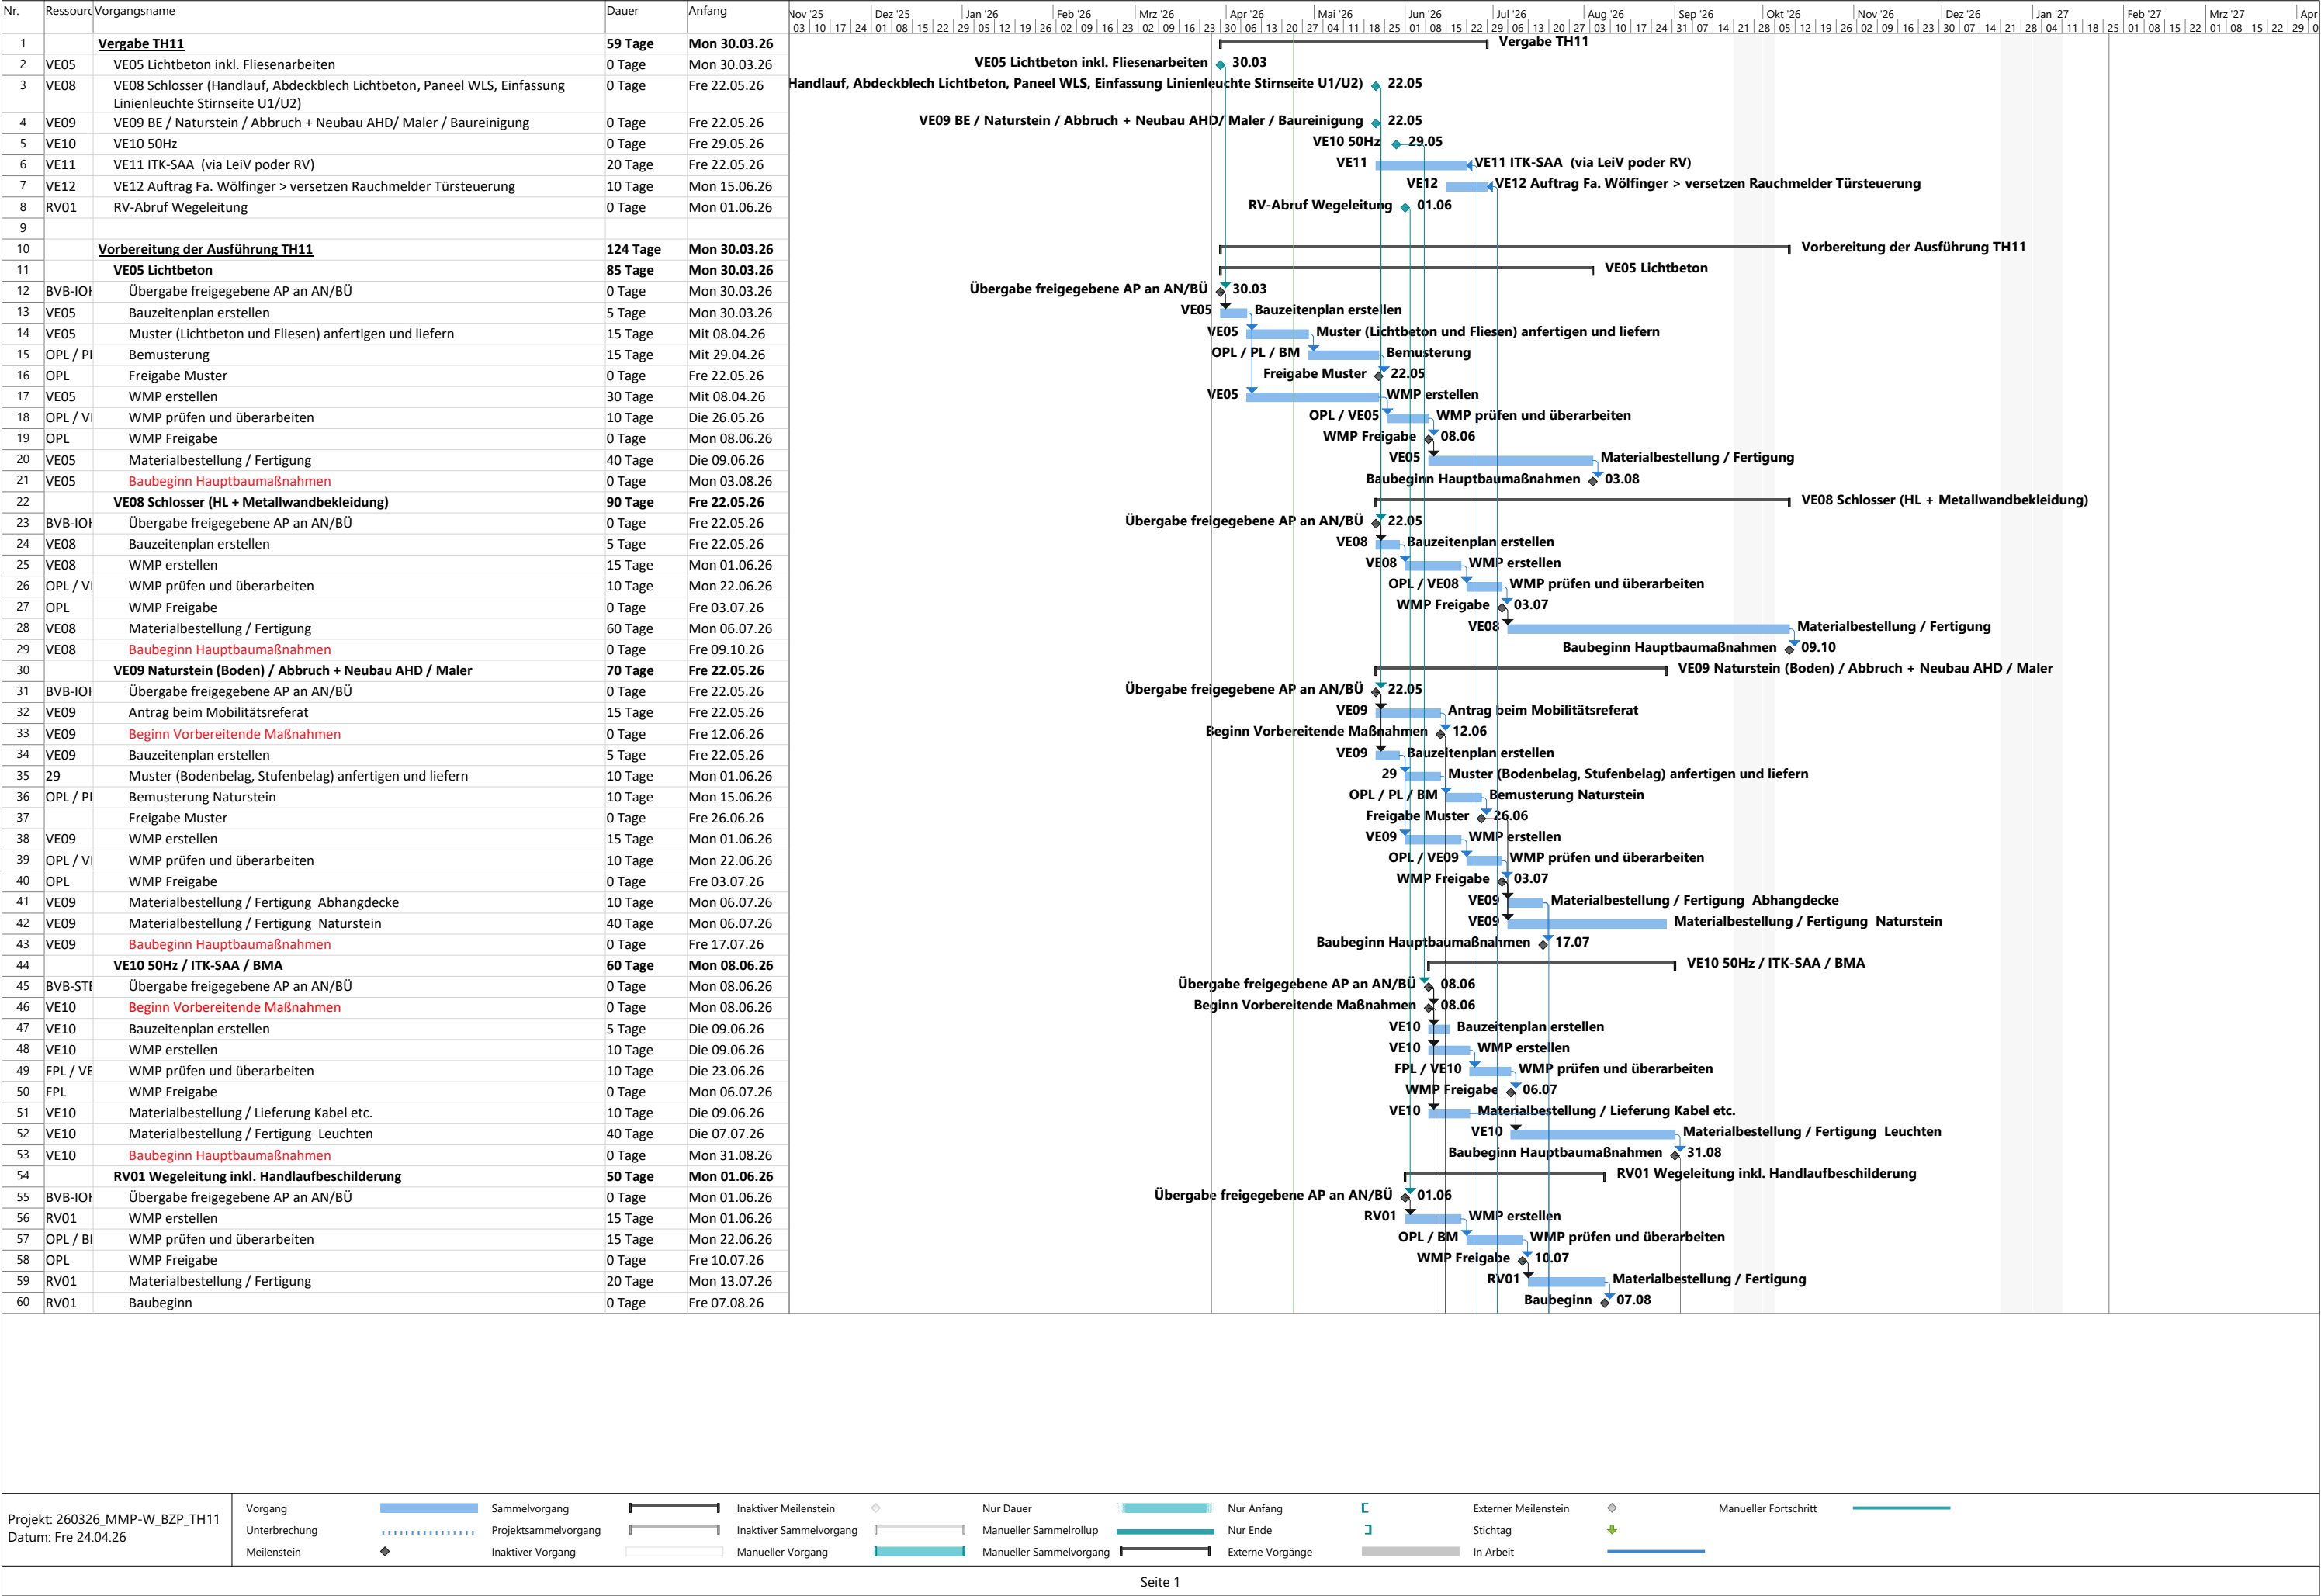

Nr.	Ressource	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Nov '25	Dez '25	Jan '26	Feb '26	Mrz '26	Apr '26	Mai '26	Jun '26	Jul '26	Aug '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27	Apr
61		Bauausführung TH11	137 Tage	Fre 12.06.26	Bauausführung TH11																	
62		Ausführung Vorbereitende Maßnahmen	25 Tage	Fre 12.06.26	Ausführung Vorbereitende Maßnahmen																	
63		physischer Baubeginn	0 Tage	Fre 12.06.26	physischer Baubeginn																	
64	VE09	Reisendeninformation über aktuelle Sperrung und bauzeitliche Wegeleitung an TH10 und TH11 (U1/U2) anbringen	5 Tage	Mon 15.06.26	VE09 Reisendeninformation über aktuelle Sperrung und bauzeitliche Wegeleitung an TH10 und TH11 (U1/U2) anbringen																	
65	VE09	Baustelleneinrichtung in der Kaufingerstraße und teilw. in VTE West herstellen	5 Tage	Mon 22.06.26	VE09 Baustelleneinrichtung in der Kaufingerstraße und teilw. in VTE West herstellen																	
66	VE10	Baustromverteiler aufstellen und anschließen	5 Tage	Mon 29.06.26	VE10 Baustromverteiler aufstellen und anschließen																	
67	VE09	Schutzmaßnahmen (VerglasungTH11, Bodenbeläge)	5 Tage	Mon 29.06.26	VE09 Schutzmaßnahmen (VerglasungTH11, Bodenbeläge)																	
68	VE10	bauzeitliche Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung installieren	10 Tage	Mon 06.07.26	VE10 bauzeitliche Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung installieren																	
69	VE11	bestehende Lautsprecher aus den Nischen versetzen	5 Tage	Mon 06.07.26	VE11 bestehende Lautsprecher aus den Nischen versetzen																	
70	VE09	Deckennischen öffnen und Trockenbaubekleidung Stirnseite abbrehen	5 Tage	Mon 06.07.26	VE09 Deckennischen öffnen und Trockenbaubekleidung Stirnseite abbrehen																	
71	VE09	F90-Abhangdecke demontieren	5 Tage	Mon 13.07.26	VE09 F90-Abhangdecke demontieren																	
72																						
73		Ausführung der Hauptbaumaßnahmen	102 Tage	Mon 20.07.26	Ausführung der Hauptbaumaßnahme																	
74		physischer Baubeginn	0 Tage	Mon 31.08.26	physischer Baubeginn																	
75	VE10	Kernbohrungen für Kabelführung herstellen	2 Tage	Mon 20.07.26	VE10 Kernbohrungen für Kabelführung herstellen																	
76	VE10	Kabelzugarbeiten 50Hz (Handlaufbeleuchtung, Lichtbeton) in TH11	3 Tage	Mit 22.07.26	VE10 Kabelzugarbeiten 50Hz (Handlaufbeleuchtung, Lichtbeton) in TH11																	
77	VE11	Kabelzugarbeiten ITK (Lautsprecher SAA) in TH11	5 Tage	Mon 27.07.26	VE11 Kabelzugarbeiten ITK (Lautsprecher SAA) in TH11																	
78	VE09	bestehende Transitzkabel in TH11 in EI90-Kanal abschotten	10 Tage	Mon 20.07.26	VE09 bestehende Transitzkabel in TH11 in EI90-Kanal abschotten																	
79	VE09	Unterkostruktion neue Abhangdecke montieren (einschließlich Deckennischen)	5 Tage	Mon 03.08.26	VE09 Unterkostruktion neue Abhangdecke montieren (einschließlich Deckennischen)																	
80	VE09	Abhangdecke schließen (einschließlich Deckennischen) und Reviklappen einbau	5 Tage	Mon 03.08.26	VE09 Abhangdecke schließen (einschließlich Deckennischen) und Reviklappen einbauen																	
81	VE09	Abhangdecke verspachteln, Fugen schleifen (Q3)	5 Tage	Mon 10.08.26	VE09 Abhangdecke verspachteln, Fugen schleifen (Q3)																	
82	VE09	Rohbaudecke verputzen	5 Tage	Mon 10.08.26	VE09 Rohbaudecke verputzen																	
83	VE09	Malerarbeiten Abhangdecke und Rohbaudecke	5 Tage	Mon 17.08.26	VE09 Malerarbeiten Abhangdecke und Rohbaudecke																	
84	VE10	Deckenleuchten und Deckenlautsprecher montieren	10 Tage	Mon 24.08.26	VE10 Deckenleuchten und Deckenlautsprecher montieren																	
85																						
86	VE09	Abbruch Bodenbelag Zwischenpodest inkl. 6 Stück Treppenstufenbeläge	3 Tage	Mon 07.09.26	VE09 Abbruch Bodenbelag Zwischenpodest inkl. 6 Stück Treppenstufenbeläge																	
87	VE09	provisorische Stufenbeläge herstellen	1 Tag	Mit 09.09.26	VE09 provisorische Stufenbeläge herstellen																	
88	VE09	Neubau Bodenbelag Zwischenpodest inkl. Bodenindikatoren	2 Tage	Don 10.09.26	VE09 Neubau Bodenbelag Zwischenpodest inkl. Bodenindikatoren																	
89	VE09	neue Stufenbeläge sukzessive herstellen	10 Tage	Mon 14.09.26	VE09 neue Stufenbeläge sukzessive herstellen																	
90	VE05	Fliesenarbeiten im Bereich der Kehrrine	10 Tage	Mon 14.09.26	VE05 Fliesenarbeiten im Bereich der Kehrrine																	
91																						
92	VE05	Vermesserarbeiten	2 Tage	Mon 14.09.26	VE05 Vermesserarbeiten																	
93	VE05	Bohrarbeiten für UK Lichtbeton	5 Tage	Mit 16.09.26	VE05 Bohrarbeiten für UK Lichtbeton																	
94	VE05	Unterkonstruktion Lichtbeton montieren	5 Tage	Mit 07.10.26	VE05 Unterkonstruktion Lichtbeton montieren																	
95	VE08	Unterkonstruktion Handläufe montieren	5 Tage	Mit 07.10.26	VE08 Unterkonstruktion Handläufe montieren																	
96	VE05	Lichtbetonplatten montieren	15 Tage	Mit 14.10.26	VE05 Lichtbetonplatten montieren																	
97	VE08	Handläufe montieren	10 Tage	Mit 21.10.26	VE08 Handläufe montieren																	
98	VE10	Handlaufbeleuchtung montieren und anschließen	10 Tage	Mit 04.11.26	VE10 Handlaufbeleuchtung montieren und anschließen																	
99	VE08	Unterkonstruktion Metallbekleidung (U1/U2-Ebene) montieren	5 Tage	Mit 04.11.26	VE08 Unterkonstruktion Metallbekleidung (U1/U2-Ebene) montieren																	
100	VE08	Metallbekleidung montieren (U1/U2-Ebene)	5 Tage	Mit 11.11.26	VE08 Metallbekleidung montieren (U1/U2-Ebene)																	
101	VE10	Abnahmen 50Hz	10 Tage	Mit 18.11.26	VE10 Abnahmen 50Hz																	
102	VE10	Abnahmen ITK/SAA	10 Tage	Mit 18.11.26	VE10 Abnahmen ITK/SAA																	
103	VE09	Technikraumtür lackieren	5 Tage	Mit 02.12.26	VE09 Technikraumtür lackieren																	
104	RV01	WLS Folieren	5 Tage	Mit 09.12.26	RV01 WLS Folieren																	
105	RV01	Handlaufschilder montieren	5 Tage	Mit 16.12.26	RV01 Handlaufschilder montieren																	
106																						
107		Ausführung Nachlaufende Maßnahmen	10 Tage	Mit 13.01.27	Ausführung Nachlaufende Maß																	
108	VE10	Rückbau des Baustromversorgung	5 Tage	Mit 13.01.27	VE10 Rückbau des Baustromversorgung																	
109	VE09	Rückbau der Baustelleneinrichtungflächen	5 Tage	Mit 13.01.27	VE09 Rückbau der Baustelleneinrichtung																	
110	VE09	Bauendreinigung	5 Tage	Mit 20.01.27	VE09 Bauendreinigung																	

Projekt: 260326_MMP-W_BZP_TH11

Datum: Fre 24.04.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

.....

◆

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

↓

Manueller Fortschritt

Seite 2
