

LEGENDE

- Abbruch Bestandsgebäude
- Baugrube
- Schleppkurven Sattelzug
- Entladezone
- EIn- und Ausfahrten mit Tor
- ZUGANG FUSSGÄNGER
- Container mit Zugang
- Gerüst
- Bauzaun mobil
- Bauzaun fest
- Stromanschluss
- Wasseranschluss
- zeitweise Schall- und Staubschutzwand
- Baumschutz
- Abfallcontainer
- Verbau
- Kran

BAUSTELLENBETRIEB

Fahrbewegungen:
 Bei Abbruch / Erdbau
 ca. 50 - 60 Stck / Tag
 5 Achser 40 to

Bei Rohbau:
 ca. 20 - 30 Stck / Tag
 5 Achser 40 to

Bei Ausbau:
 ca. 15 - 20 Stck / Tag
 2-3 Achser 16 - 24 to

Fahrzeiten:
 6:45 Uhr bis 17:30 Uhr,
 an Betoniertagen auch länger,
 Ggf. Unterbrechung zu Schulbeginn
 und Schullende.

Kranstandort 1:
 möglicher Standort
 60-70 m Obendreher

Kranstandort 2:
 möglicher Standort
 20 m Untendreher

Container Firmen:
 ca. 20 - 40 Container
 2-3 geschossig

Einrichtung des Brandschutzes gem. aktuellem Feuerwerplan

- Sammelplatz (Brandfall)
- Hydrant H300
- BMZ Brandmeldezentrale
- FSK Schlüsselkasten
- Schlüsselrohr
- Feuerwehrzufahrt


DATUM	INDEX	ÄNDERUNG

ZEICHNUNG **Baulogistik | 1. BA** MASSSTAB DATUM GEZEICHNET
Phase 3 - Rohbauarbeiten 1:500 11.04.2024

LPH **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

PLANNUMMER **AA LAG 012 LAGEPLAN GSB** INDEX **9**

PROJEKT **18.158**
 NEUBAU SCHULZENTRUM AM SALLERNER BERG IN REGENSBURG
 1.BA GRUNDSCHULE UND HORT

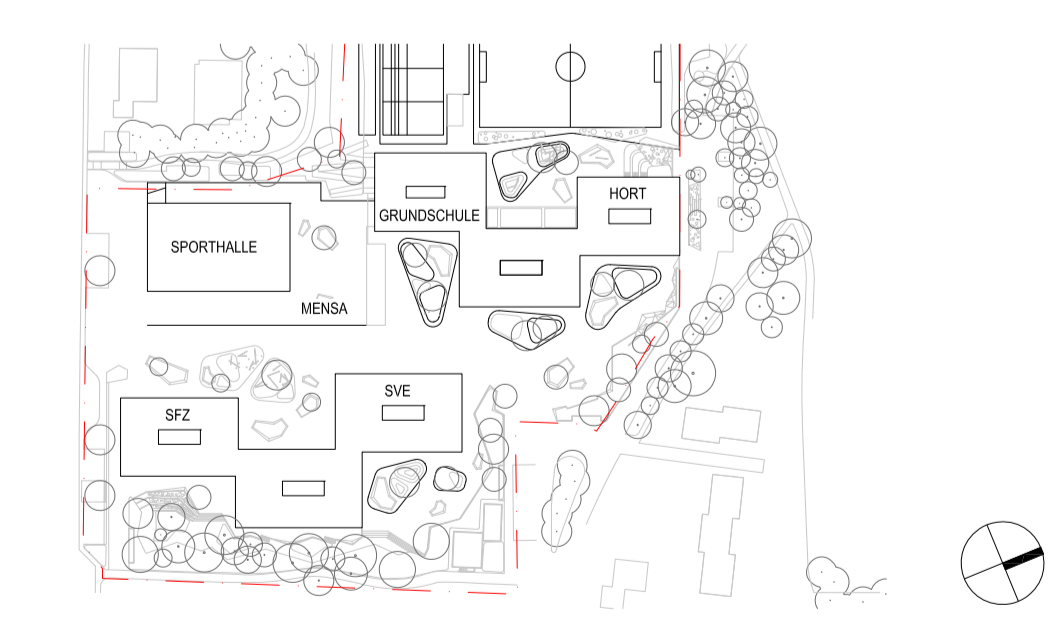

BAUHERR

STADT REGENSBURG
 REFERAT FÜR BILDUNG, SPORT UND FREIZEIT
 (Schule und Kinderhort)
 DOMPLATZ 3
 93047 REGENSBURG
 T 0941 507-015 REFERAT.FUER.BILDUNG@REGENSBURG.DE DATUM UNTERSCHRIFT

REFERAT **PLANUNGS- UND BAUREFERAT**
 D.-MARTIN-LUTHER-STRASSE 1
 93047 REGENSBURG
 T 0941 507-662 F 0941 507-4609
 AMT_FUER_HOCHBAU@REGENSBURG.DE DATUM UNTERSCHRIFT

PLANUNG

GRUNDSTÜCKS- **LIEGENSCHAFTSAMT (AMT 23)**
 EIGENTUMER D.-MARTIN-LUTHER-STRASSE 3
 93047 REGENSBURG
 T 0941 507-1232 F 0941 507-4239 DATUM UNTERSCHRIFT
