


E 8809 - Vorläufige Zeitplanung Straßenbau & Medien

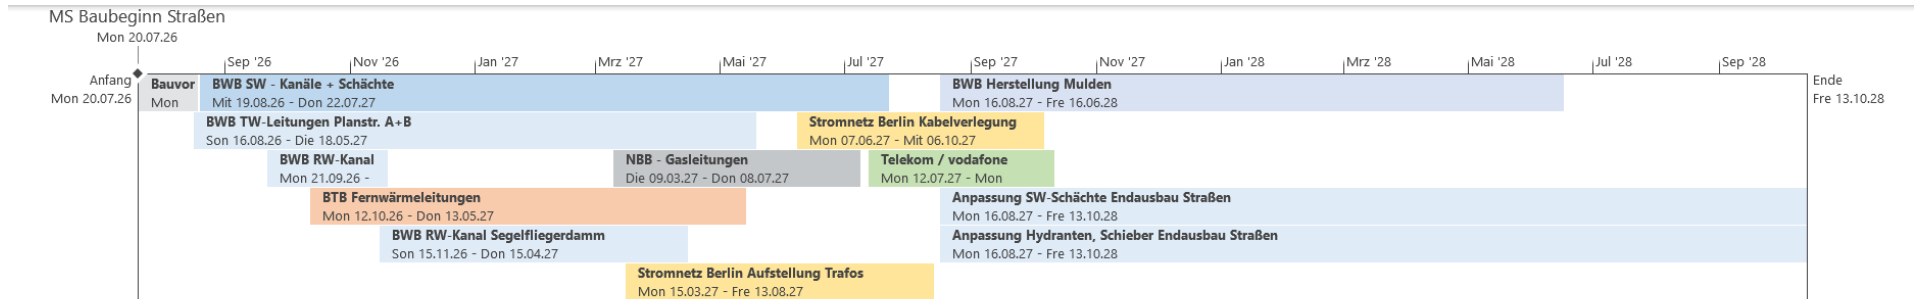

	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Halbte 2, 2026												Halbte 1, 2027												Halbte 2, 2027												Halbte 1, 2028												Halbte 2, 2028											
					M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																												
1	MS Baubeginn Straßen	0 Tage	Mon 20.07.26	Mon 20.07.26	◆ 20.07																																																											
2	Straßenbau	117 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 13.10.28																																																												
3	Bauvorbereitende Maßnahmen / Herstellung Baustraße	1 Monat	Mon 20.07.26	Die 18.08.26																																																												
4	Fertigstellung Verkehrsfläche entlang Segelfliegerdamm	5 Monate	Mon 20.07.26	Fre 18.12.26																																																												
5	Fertigstellung Planstraße A zwischen Segelfliegerdamm-Planstraße B, weiter bis Planstr. C	13,95 Monate	Mon 20.07.26	Die 21.09.27																																																												
6	BWB SW - Kanäle + Schächte	11 Monate	Mit 19.08.26	Don 22.07.27																																																												
7	BWB RW-Kanal Segelfliegerdamm	5 Monate	Son 15.11.26	Don 15.04.27																																																												
8	BWB RW-Kanal Sedlmayr Str.	2 Monate	Mon 21.09.26	Don 19.11.26																																																												
9	BWB TW-Leitung Planstr. C+Stellplatzanlagen (Bau ohne Inbetriebnahme)	2 Monate	Mon 03.08.26	Don 01.10.26																																																												
10	BWB TW-Leitung Planstr. D (Bau ohne Inbetriebnahme)	3 Monate	Mon 28.09.26	Mon 28.12.26																																																												
11	BWB TW-Leitungen Planstr. A+B	9 Monate	Son 16.08.26	Die 18.05.27																																																												
12	BTB Fernwärmeleitungen	7 Monate	Mon 12.10.26	Don 13.05.27																																																												
13	NBB - Gasleitungen	4 Monate	Die 09.03.27	Don 08.07.27																																																												
14	Stromnetz Berlin Aufstellung Trafos	5 Monate	Mon 15.03.27	Fre 13.08.27																																																												
15	Stromnetz Berlin Kabelverlegung	4 Monate	Mon 07.06.27	Mit 06.10.27																																																												
16	Telekom / vodafone	3 Monate	Mon 12.07.27	Mon 11.10.27																																																												
17	BWB Herstellung Mulden	10 Monate	Mon 16.08.27	Fre 16.06.28																																																												
18	Anpassung SW-Schächte Endausbau Straßen	13,86 Monate	Mon 16.08.27	Fre 13.10.28																																																												
19	Anpassung Hydranten, Schieber Endausbau Straßen	13,86 Monate	Mon 16.08.27	Fre 13.10.28																																																												
