







Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT



Z 274-58

Z 274-60



HE1.31LT



AUFBAU

Phase 1 / 8



VZ-Montage

- ↳ Abstände der VWT untereinander und zur FAT herstellen
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Montage und einschalten Kleiner Blinkpfeil am vorgesehenen Standort „0“
- ↳ Weiterfahrt zum Standort „1“ und Standort „2“,
- ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „1“ und Standort „2“, dabei VWT am Standort „1“ und „2“ belassen
- ↳ Weiterfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

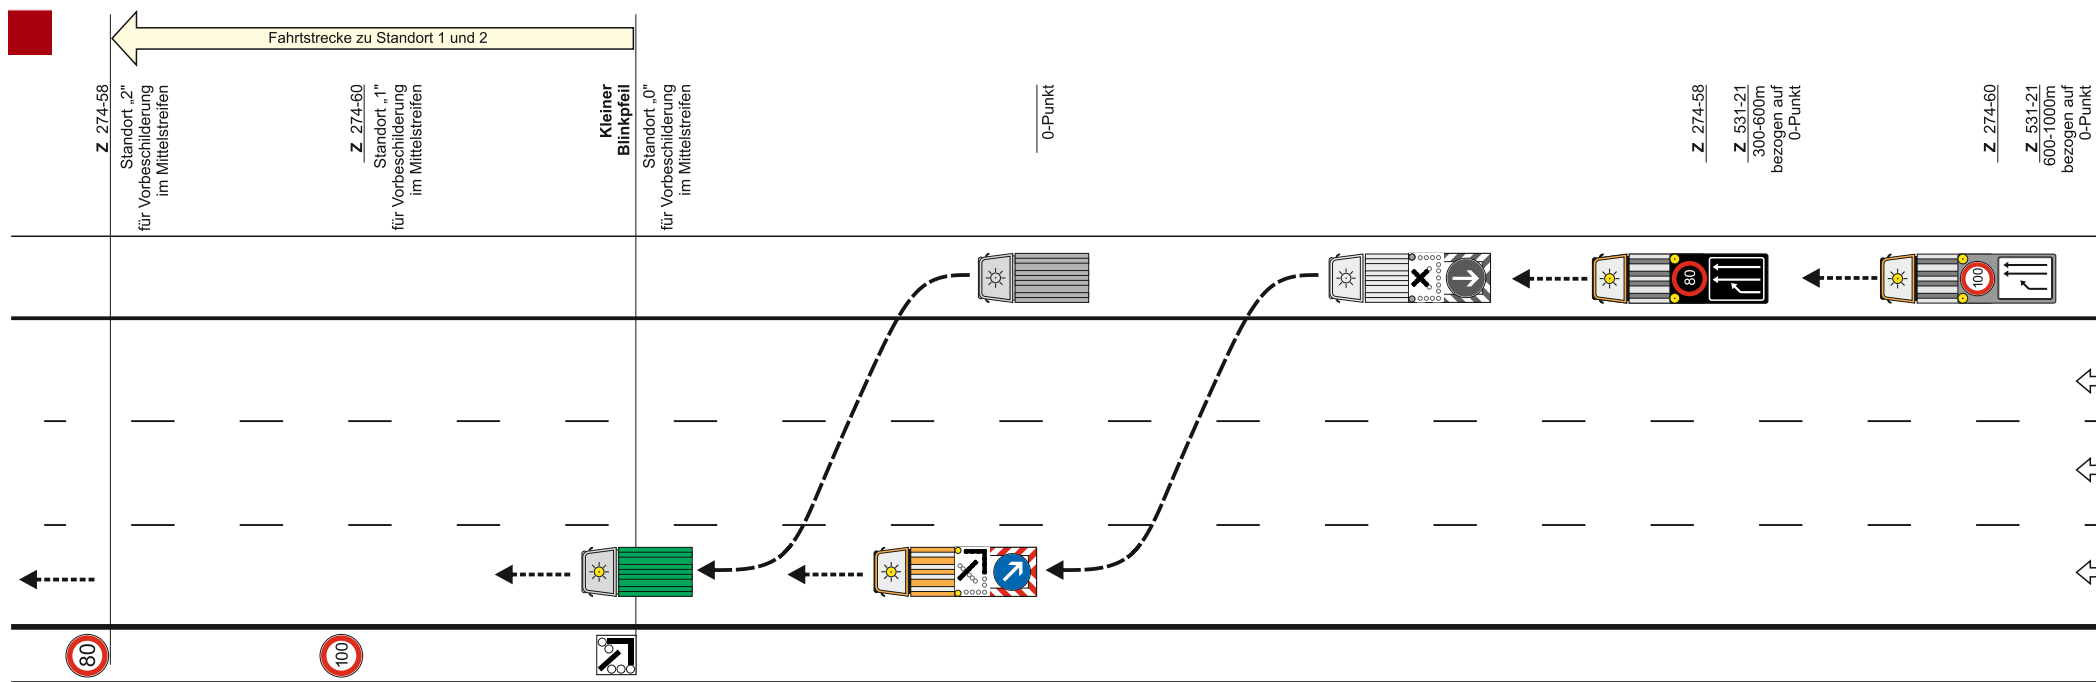

HE1.31LT

AUFBAU

Phase 2 / 8




- Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches
↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m


0-Punkt

Z 274-58
Z 531-21
300-600m
bezogen auf
0-Punkt

Z 274-60
Z 531-21
600-1000m
bezogen auf
0-Punkt

Kleiner
Blinkpfeil
1000-1400m
bezogen auf
0-Punkt

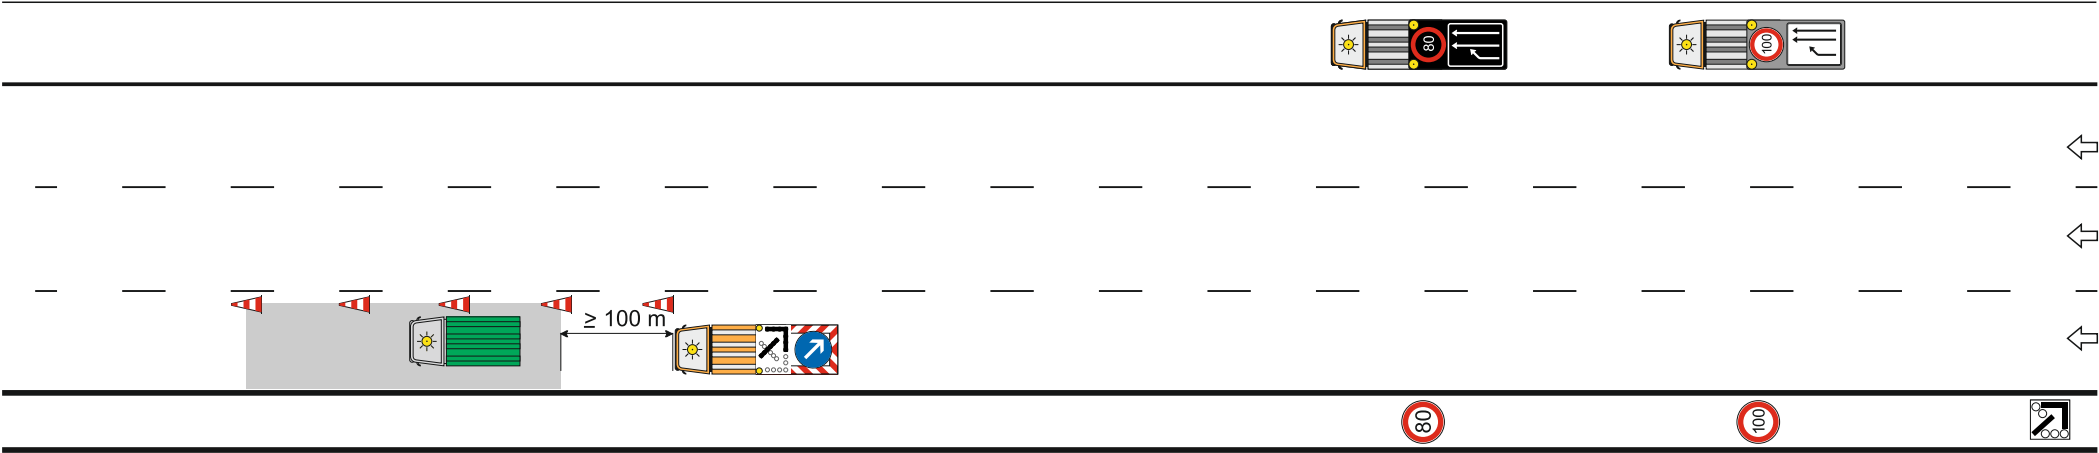




HE1.31LT

ARBEITSSTELLE

Phase 3 / 8



- Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches
- ↳ Abbau der Leitkegel
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)
 - ↳ Information an Personal der VWT zum Ausfahren und nachfolgendem Einholen der VZ im Mittelstreifen
 - ggf. Anforderung der Zugfahrzeuge an VWT



0-Punkt

Z 274-58

Z 531-21

300-600m
bezogen auf
0-Punkt



Z 274-60

Z 531-21

600-1000m
bezogen auf
0-Punkt

Kleiner
Blinkpfeil

1000-1400m
bezogen auf
0-Punkt



HE1.31LT

ABBAU


Phase 4 / 8



Vorwarneinrichtungen außer Betrieb setzen

↳ VWT außer Betrieb setzen



↳ Ausfahren der VWT bis zur nächsten Wendemöglichkeit
(s. Skizze)



Z 274-58

Z 274-60

Kleiner
Blinkpfeil

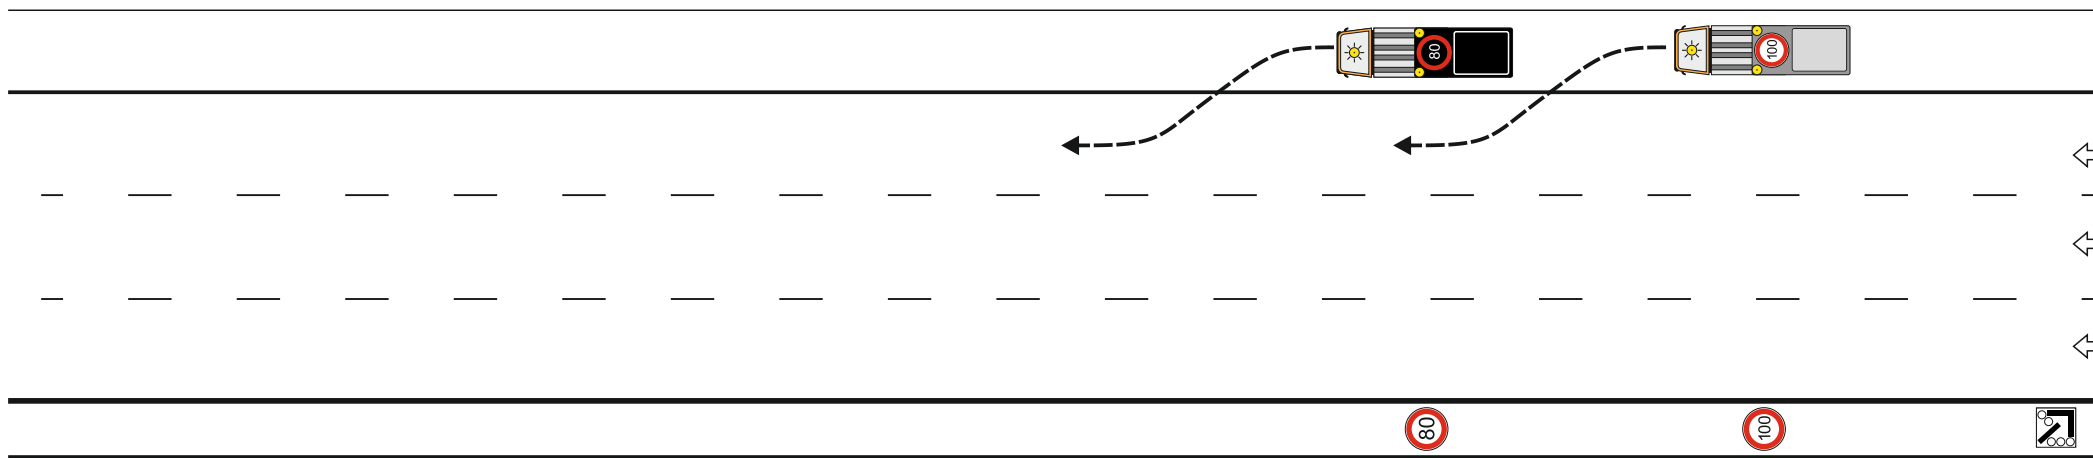

HE1.31LT

ABBAU

Phase 5 / 8



Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Standstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT





Z 274-58

Z 274-60

Kleiner
Blinkpfeil

Z 274-58

Z 274-60

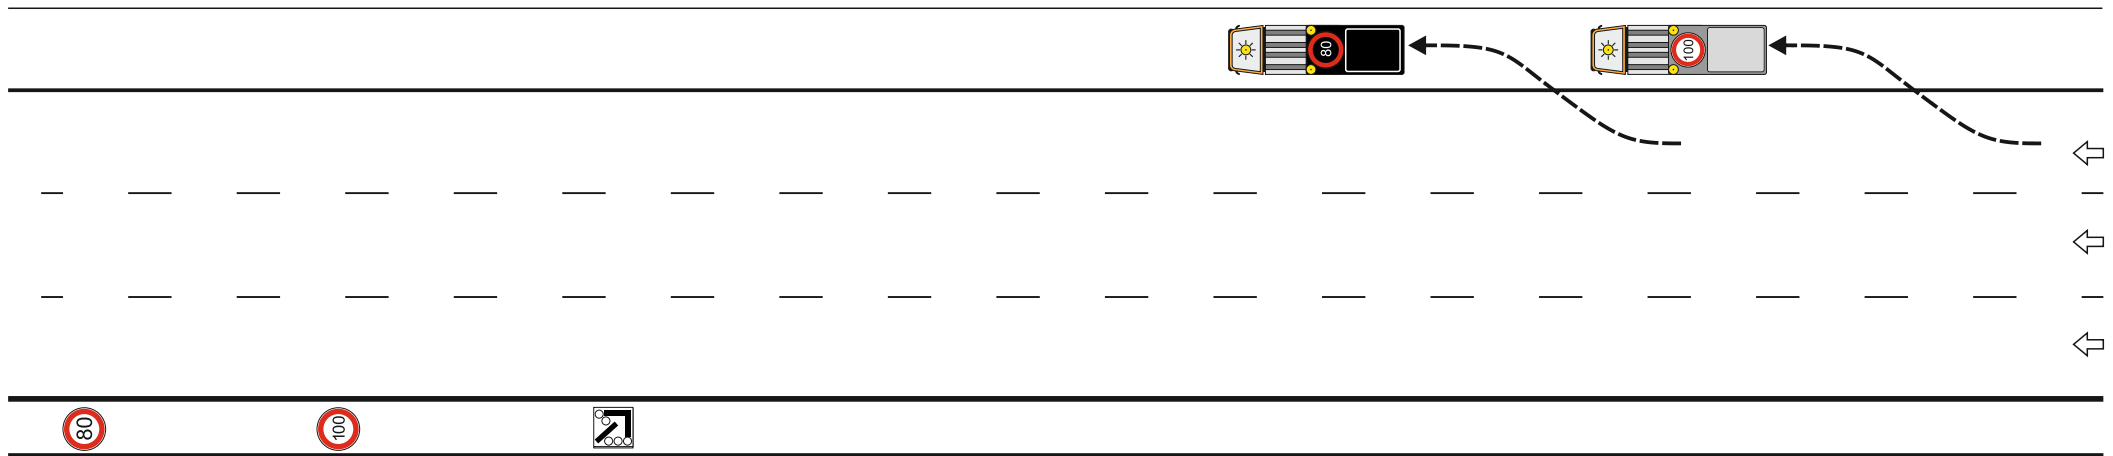

HE1.31LT



ABBAU

Phase 6 / 8



- 

-

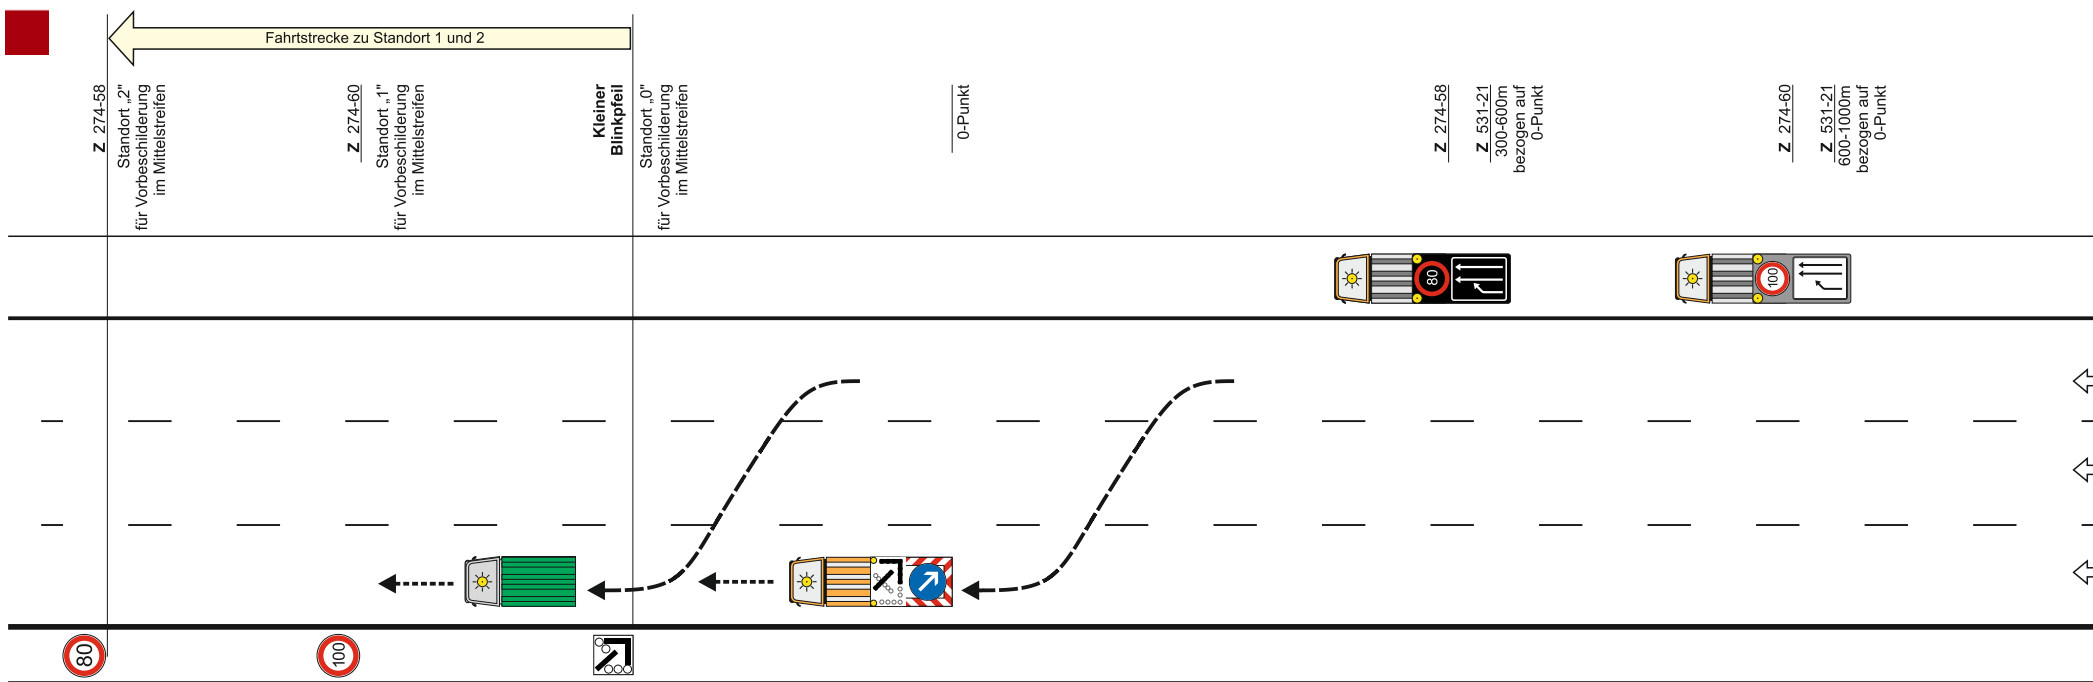

ABBAU

Phase 7 / 8



Vorwarneinrichtungen außer Betrieb setzen

↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs



↳ VWT außer Betrieb setzen

↳ Ausfahren der VWT



Z 274-58

Z 274-60

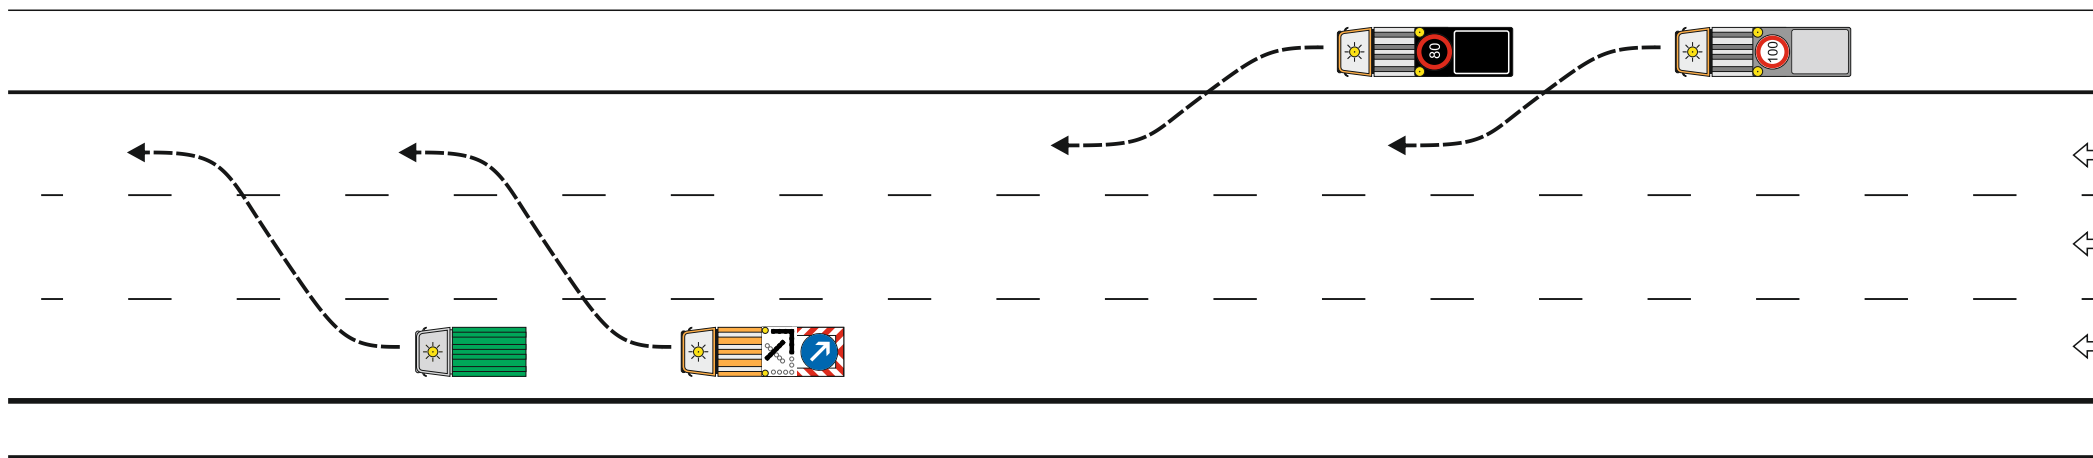

HE1.31LT

ABBAU

Phase 8 / 8
