





Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen

- ↳ Aktivierung der SBA für Sperrung anfordern
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf den Seitenstreifen

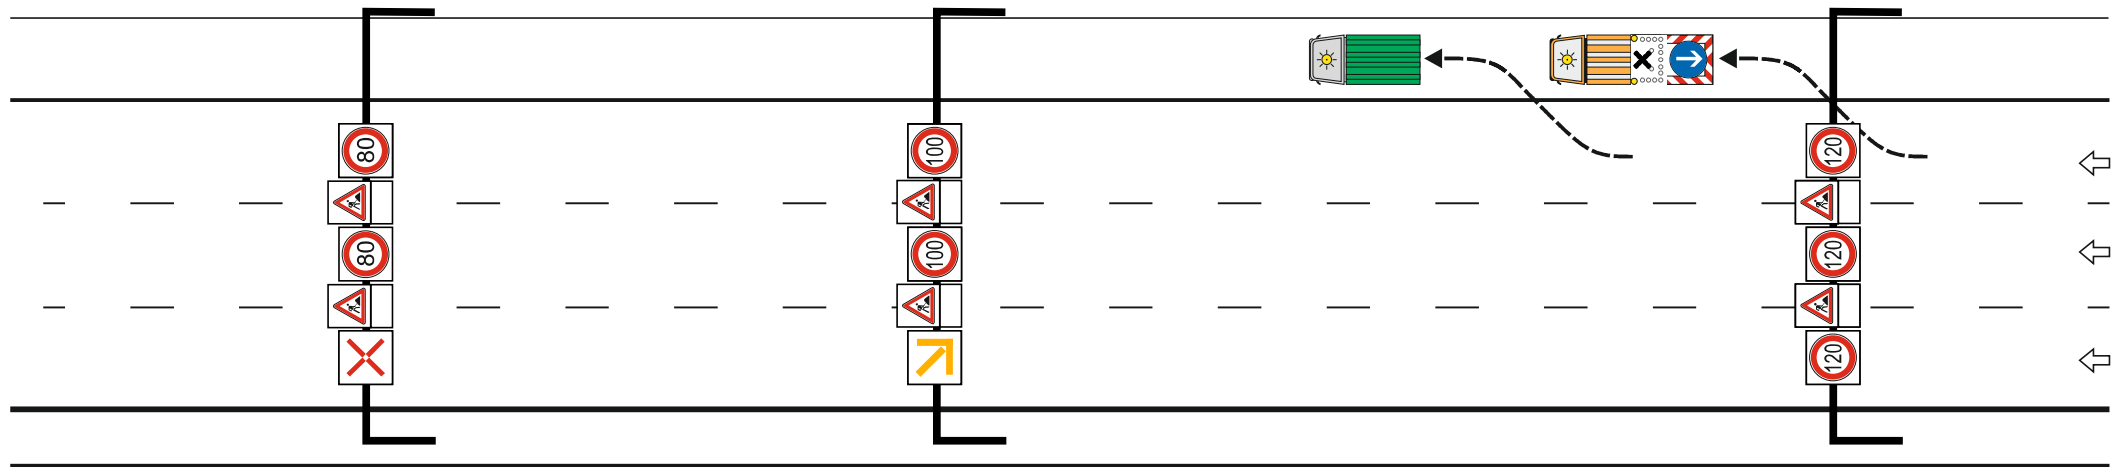

HE1.34LTS



AUFBAU

Phase 1 / 4



Vorbereitung der FAT

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Vorfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

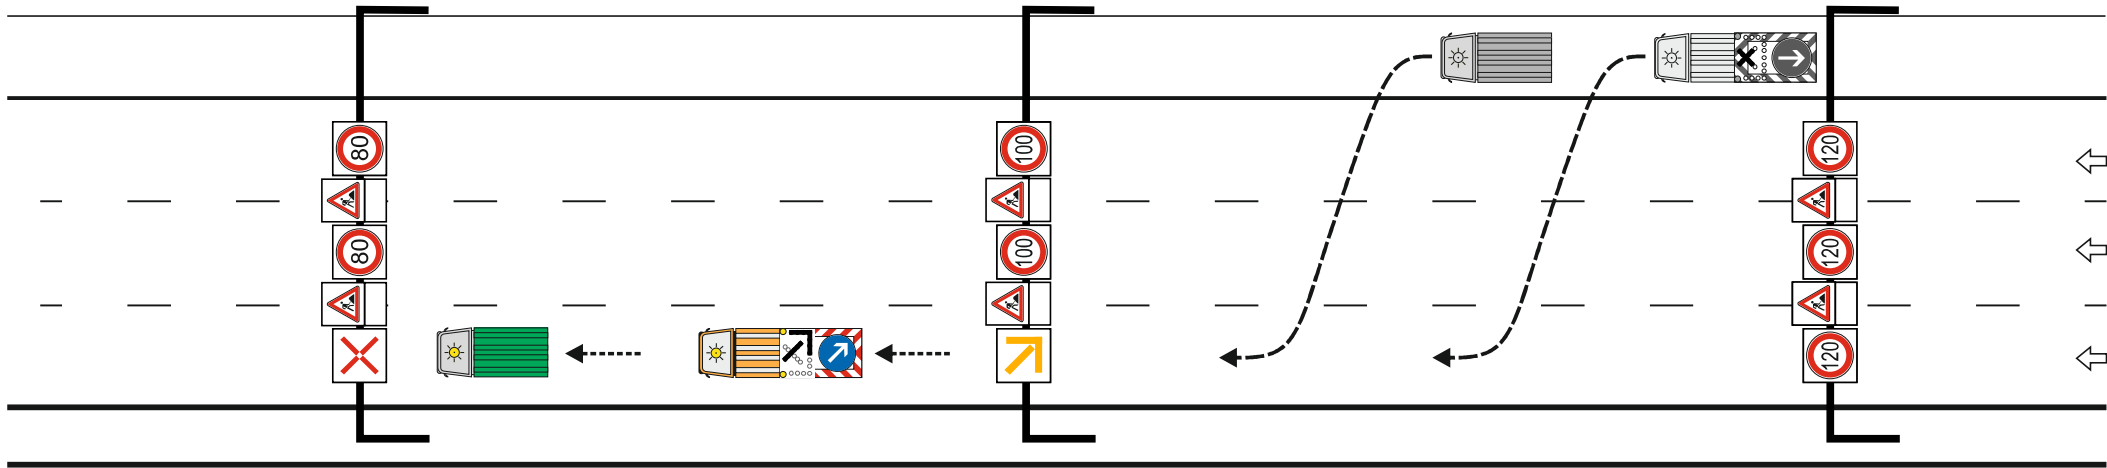

HE1.34LTS



AUFBAU

Phase 2 / 4



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
- ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

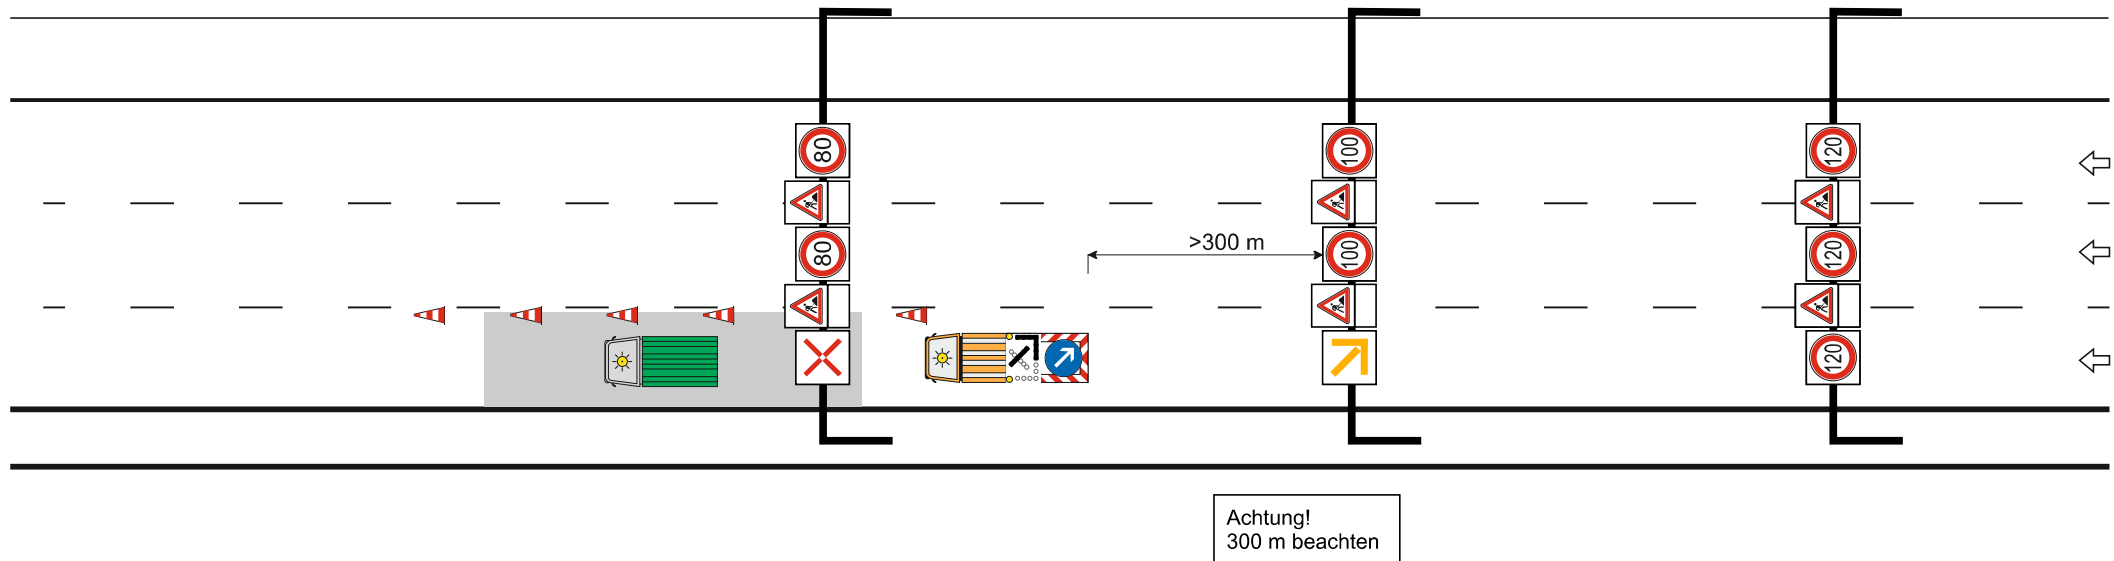



HE1.34LTS

ARBEITSSTELLE

Phase 3 / 4



- Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches
- ↳ Abbau Leitkegel
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs
 - ↳ Deaktivierung der SBA für Freigabe anfordern

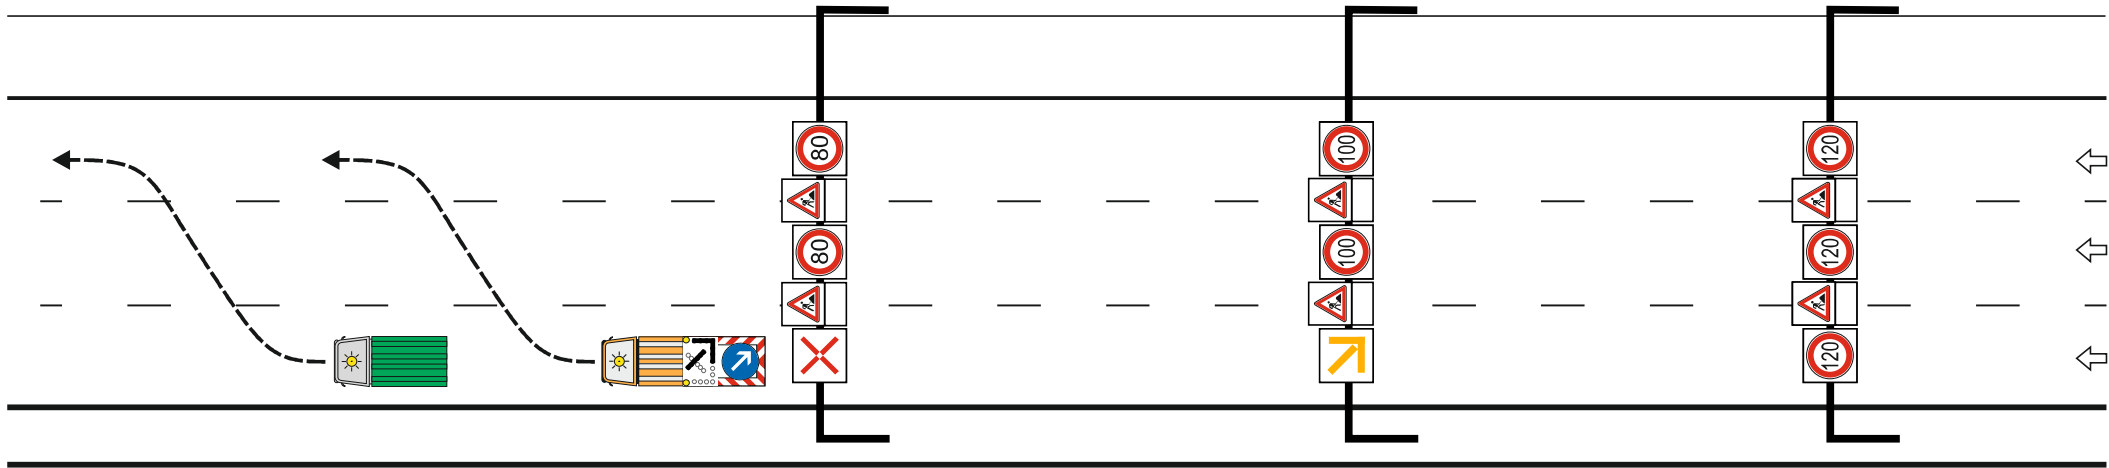

HE1.34LTS

ABBAU

Phase 4 / 4
