

Süßen (TSD), Weiche 21 und Weiche 22 | Weichenerneuerung (WE)**Hauptarbeiten zur Weichenerneuerung:**

Sperrung Süßen (TSD), Weiche 21 und Weiche 22 von Sig "71P2" - Sig "Ra12 71W30" und Gleis 101 von GEA km 49,950 bis GEA km 50,849:

- Fr. 28.08.26, 21:00 Uhr - Mo. 31.08.26, 05:00 Uhr, durchgehend (Sp dg Hgl: 56h) | Aussch. OL: "3rot(TSD)", "7blau(TSD)", "17gelb(TSD)", "401grün(TSD)"

Sperrung Süßen (TSD), Gleis 2 von Sig "71A" bis Sig "71P2" für Stopfarbeiten:

- Mo. 31.08.26, 00:45 Uhr - 04:30 Uhr, durchgehend (Sp dg Hgl: 3h 45min) | Aussch. OL: "1rot(TSD)"

Montage-/ demontagearbeiten zur Weichenerneuerung:

Süßen (TSD), Gleis 101C und Gleis 101D von "GS 10/GS 11" bis "Pb (Gl.101C)/Pb (Gl.101D)":

- Mo. 24.08.26, 07:00 Uhr - Mo. 31.08.26, 05:00 Uhr, durchgehend (Sp Ngl: 166h) | Aussch. OL: "17grün(TSD)"

(Weichenmontage auf Gleis 101C, Logistik für Weichenmontage Gleis 101D)

Schutz-La 120 km/h zur Oberbaumaßnahme:

Schutz-La 120/140 km/h | Süßen (TSD), Gleis 4 von km 51,100 - km 49,700:

- Sa. 22.08.26, 03:00 Uhr - Mo. 31.08.26, 05:00 Uhr, durchgehend (La 120 km/h: 218h)

Nachlauf-La 70 km/h nach Oberbaumaßnahme:

Nachlauf-La 70/140 km/h | Süßen (TSD), Weiche 21 und Weiche 22 von km 50,626 - km 51,064:

- Mo. 31.08.26, 05:00 Uhr - Mi. 02.09.26, 05:00 Uhr, durchgehend (La 70 km/h: 48h)

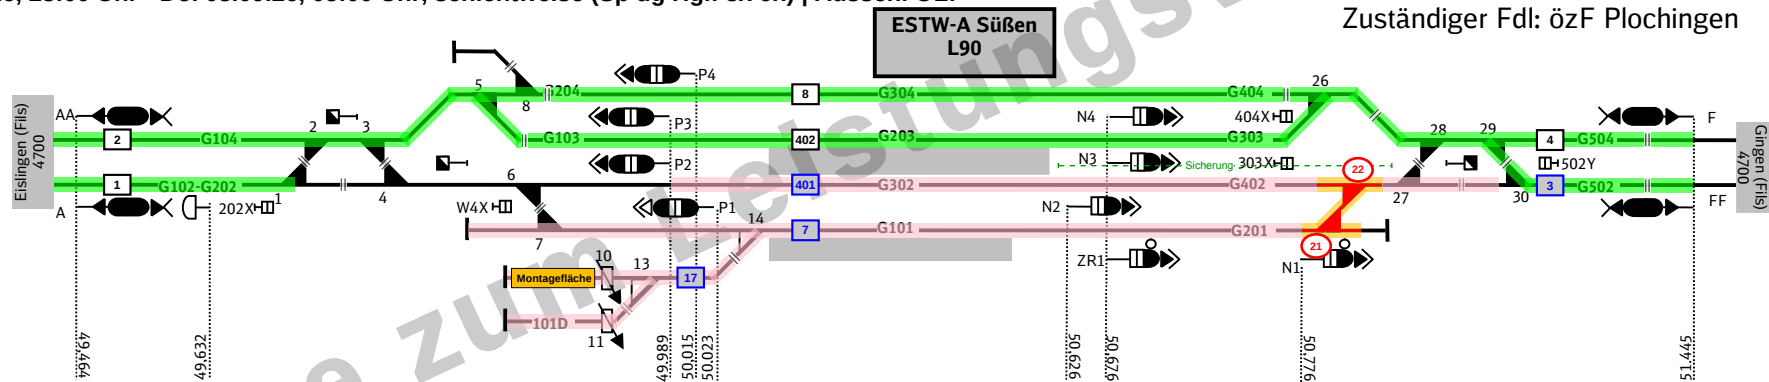
Nacharbeiten (Schweißarbeiten) zur Oberbaumaßnahme:

Sperrung Süßen (TSD), Weiche 21 und 22 von Sig "71P1/71P2" bis Sig "71FF":

- Mo. 31.08.26, 23:00 Uhr - Do. 03.09.26, 05:00 Uhr, schichtweise (Sp dg Hgl: 3x 6h) | Aussch. OL: "----"

Bahnhof Süßen (TSD)**Kennziffer 71**

Zuständiger Fdl: özF Plochingen

**Nacharbeiten (Aufbau Sicherung) zur Oberbaumaßnahme:**

Sperrung Süßen (TSD), Gleis 203 von Sig "71AA" bis Sig "71F":

- Mo. 07.09.26, 00:30 Uhr - 04:30 Uhr, schichtweise (Sp dg Hgl: 4h) | Aussch. OL: "----"

(Aufbau Sicherung an Süßen (TSD), Gleis 203)

Qualitätsstopfgang (DUA) zur Weichenerneuerung:

Sperrung Süßen (TSD), Weiche 21 und 22 von Sig "71P1/71P2" bis Sig "71FF":

- Di. 20.10.26, 23:00 Uhr - Mi. 21.10.26, 05:00 Uhr, durchgehend (Sp dg Hgl: 6h) |

Aussch. OL: "----"

Legende:

- Umbaubereich
- durchgehender Sperrbereich
- Baulogistik- bzw. Übergabegleise
- schichtweiser Sperrbereich
- Betrieb

- 8 Schaltgruppe durchgehend ausgeschaltet
- 2 Schaltgruppe schichtweise ausgeschaltet
- 2 benachbarte Schaltgruppe

Logistikgleise:

Plochingen (TP), Gleis 702 und Gleis 726
Esslingen (TE), Gleis 22 und Gleis 23

(Fr. 21.08.26 - Di. 01.09.26)
(Fr. 21.08.26 - Mi. 02.09.26)

Übergabegleise:

Stuttgart Hafen (TSH), Gleis 806 und Gleis 807

(Fr. 21.08.26 - Mo. 31.08.26)

Bereitstellungsfläche:

Plochingen (TP), Fläche am Gleis 726

(Fr. 21.08.26 - Mo. 24.08.26)

(KKM 2026 | Anmeldung-125278)

Stand: 02.10.2025



SPETTSMANN + KAHR
Rodzinski - Grunwald - Lagemann GmbH & Co. KG
INGENIEURBÜRO
