

Nr.

Vorgangsname

Dauer

Anfang

Ende

Vor

0	Bauzeitenplan_KITA Ebbinghäuser Str.	317 Tage	Mon 16.06.25	Die 01.09.26	
1	Schadstoffsanierung	126 Tage	Fre 27.06.25	Fre 19.12.25	
2	Ausschreibungsphase Schadstoff	31 Tage	Fre 27.06.25	Fre 08.08.25	
3	Sommerferien 2025	32 Tage	Mon 14.07.25	Die 26.08.25	
4	Submission Schadstoff	1 Tag	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25	2
5	Auswertung der Angebote Schadstoff	5 Tage	Die 12.08.25	Mon 18.08.25	4
6	Vergabe Schadstoff	4 Tage	Die 19.08.25	Fre 22.08.25	5
7	Vorlauf Firmen Schadstoff	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	6
8	Baubeginn Schadstoffsanierung	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25	7E
9	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	8E
10	Demontage Entkernung	10 Tage	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	9
11	Decken KMF-Sanierung	5 Tage	Mon 22.09.25	Fre 26.09.25	10
12	Fußbodenausbau	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25	11
13	Herbstferien 2025	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25	
14	Schadstoffsanierung Boden Asbest	10 Tage	Mon 13.10.25	Fre 24.10.25	12
15	Schadstoffsanierung Wände Asbest	30 Tage	Mon 27.10.25	Fre 05.12.25	14
16	Freimessung Asbest	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	15
17	Feuchteschadenssanierung	185 Tage	Mon 23.06.25	Fre 06.03.26	
18	Ausschreibungsphase Feuchte	44 Tage	Mon 23.06.25	Don 21.08.25	
19	Submission Feuchte	1 Tag	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25	18
20	Auswertung der Angebote Feuchte	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25	19
21	Vergabe Feuchte	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	20
22	Vorlauf Firmen Feuchte	5 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.09.25	21
23	Baubeginn Feuchte	0 Tage	Mon 15.09.25	Mon 15.09.25	22
24	Ausschachtungsarbeiten Außenwände	15 Tage	Mon 15.09.25	Fre 03.10.25	22
25	Drainagearbeiten	10 Tage	Mon 06.10.25	Fre 17.10.25	24
26	Abdichtungsarbeiten	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25	25
27	Putzarbeiten Sockelbereich	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25	26
28	Fassadenanstrich	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 06.03.26	38
29	Dachsanierung	152 Tage	Mon 18.08.25	Die 17.03.26	
30	Ausschreibungsphase Dach	49 Tage	Mon 18.08.25	Don 23.10.25	
31	Submission Dach	1 Tag	Fre 24.10.25	Fre 24.10.25	30
32	Auswertung der Angebote Dach	10 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25	31
33	Vergabe Dach	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25	32
34	Vorlauf Firmen Dach	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25	33
35	Baubeginn Dachsanierung	0 Tage	Mon 08.12.25	Mon 08.12.25	34
36	Gerüstarbeiten Dach	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25	35
37	Demontage Dachaufbau	15 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26	36
38	Dacharbeiten	30 Tage	Mon 12.01.26	Fre 20.02.26	37
39	PV Anlage	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26	38
40	Blitzschutzarbeiten	7 Tage	Mon 02.03.26	Die 10.03.26	39
41	Demontage Gerüst	5 Tage	Mit 11.03.26	Die 17.03.26	40
42	Baufreiheit für Außenanlagen	0 Tage	Die 17.03.26	Die 17.03.26	41
43	Außenanlagen	93 Tage	Mit 18.03.26	Fre 24.07.26	42
44	Anbau & Interne Umstrukturierung	307 Tage	Mon 16.06.25	Die 18.08.26	
45	Bauantrag Anbau	30 Tage	Mon 16.06.25	Fre 25.07.25	
46	Genehmigung Anbau	20 Tage	Mon 28.07.25	Fre 22.08.25	45
47	Ausschreibungsphase Anbau & Interne Umstrukturierung	29 Tage	Mon 21.07.25	Don 28.08.25	

16.06

27.06

27.06

14.07

11.08

11.08

12.08

19.08

25.08

01.09

01.09

08.09

22.09

29.09

13.10

13.10

27.10

08.12

23.06

23.06

22.08

25.08

01.09

08.09

15.09

15.09

06.10

20.10

10.11

23.02

18.08

18.08

24.10

27.10

10.11

24.11

08.12

08.12

22.12

12.01

16.02

02.03

11.03

18.03

16.06

16.06

28.07

21.07

Schadstoffsanierung

Ausschreibungsphase Schadstoff

Sommerferien 2025

Submission Schadstoff

Auswertung der Angebote Schadstoff

Vergabe Schadstoff

Vorlauf Firmen Schadstoff

Baubeginn Schadstoffsanierung

Baustelleneinrichtung

Demontage Entkernung

Decken KMF-Sanierung

Fußbodenausbau

Herbstferien 2025

Schadstoffsanierung Boden Asbest

Schadstoffsanierung Wände Asbest

Freimessung Asbest

Feuchteschadenssanierung

Ausschreibungsphase Feuchte

Submission Feuchte

Auswertung der Angebote Feuchte

Vergabe Feuchte

Vorlauf Firmen Feuchte

Baubeginn Feuchte

Ausschachtungsarbeiten Außenwände

Drainagearbeiten

Abdichtungsarbeiten

Putzarbeiten Sockelbereich

Fassadenanstrich

Dachsanierung

Ausschreibungsphase Dach

Submission Dach

Auswertung der Angebote Dach

Vergabe Dach

Vorlauf Firmen Dach


Baubeginn Dachsanierung

Gerüstarbeiten Dach

Demontage Dachaufbau

Dacharbeiten

PV Anlage

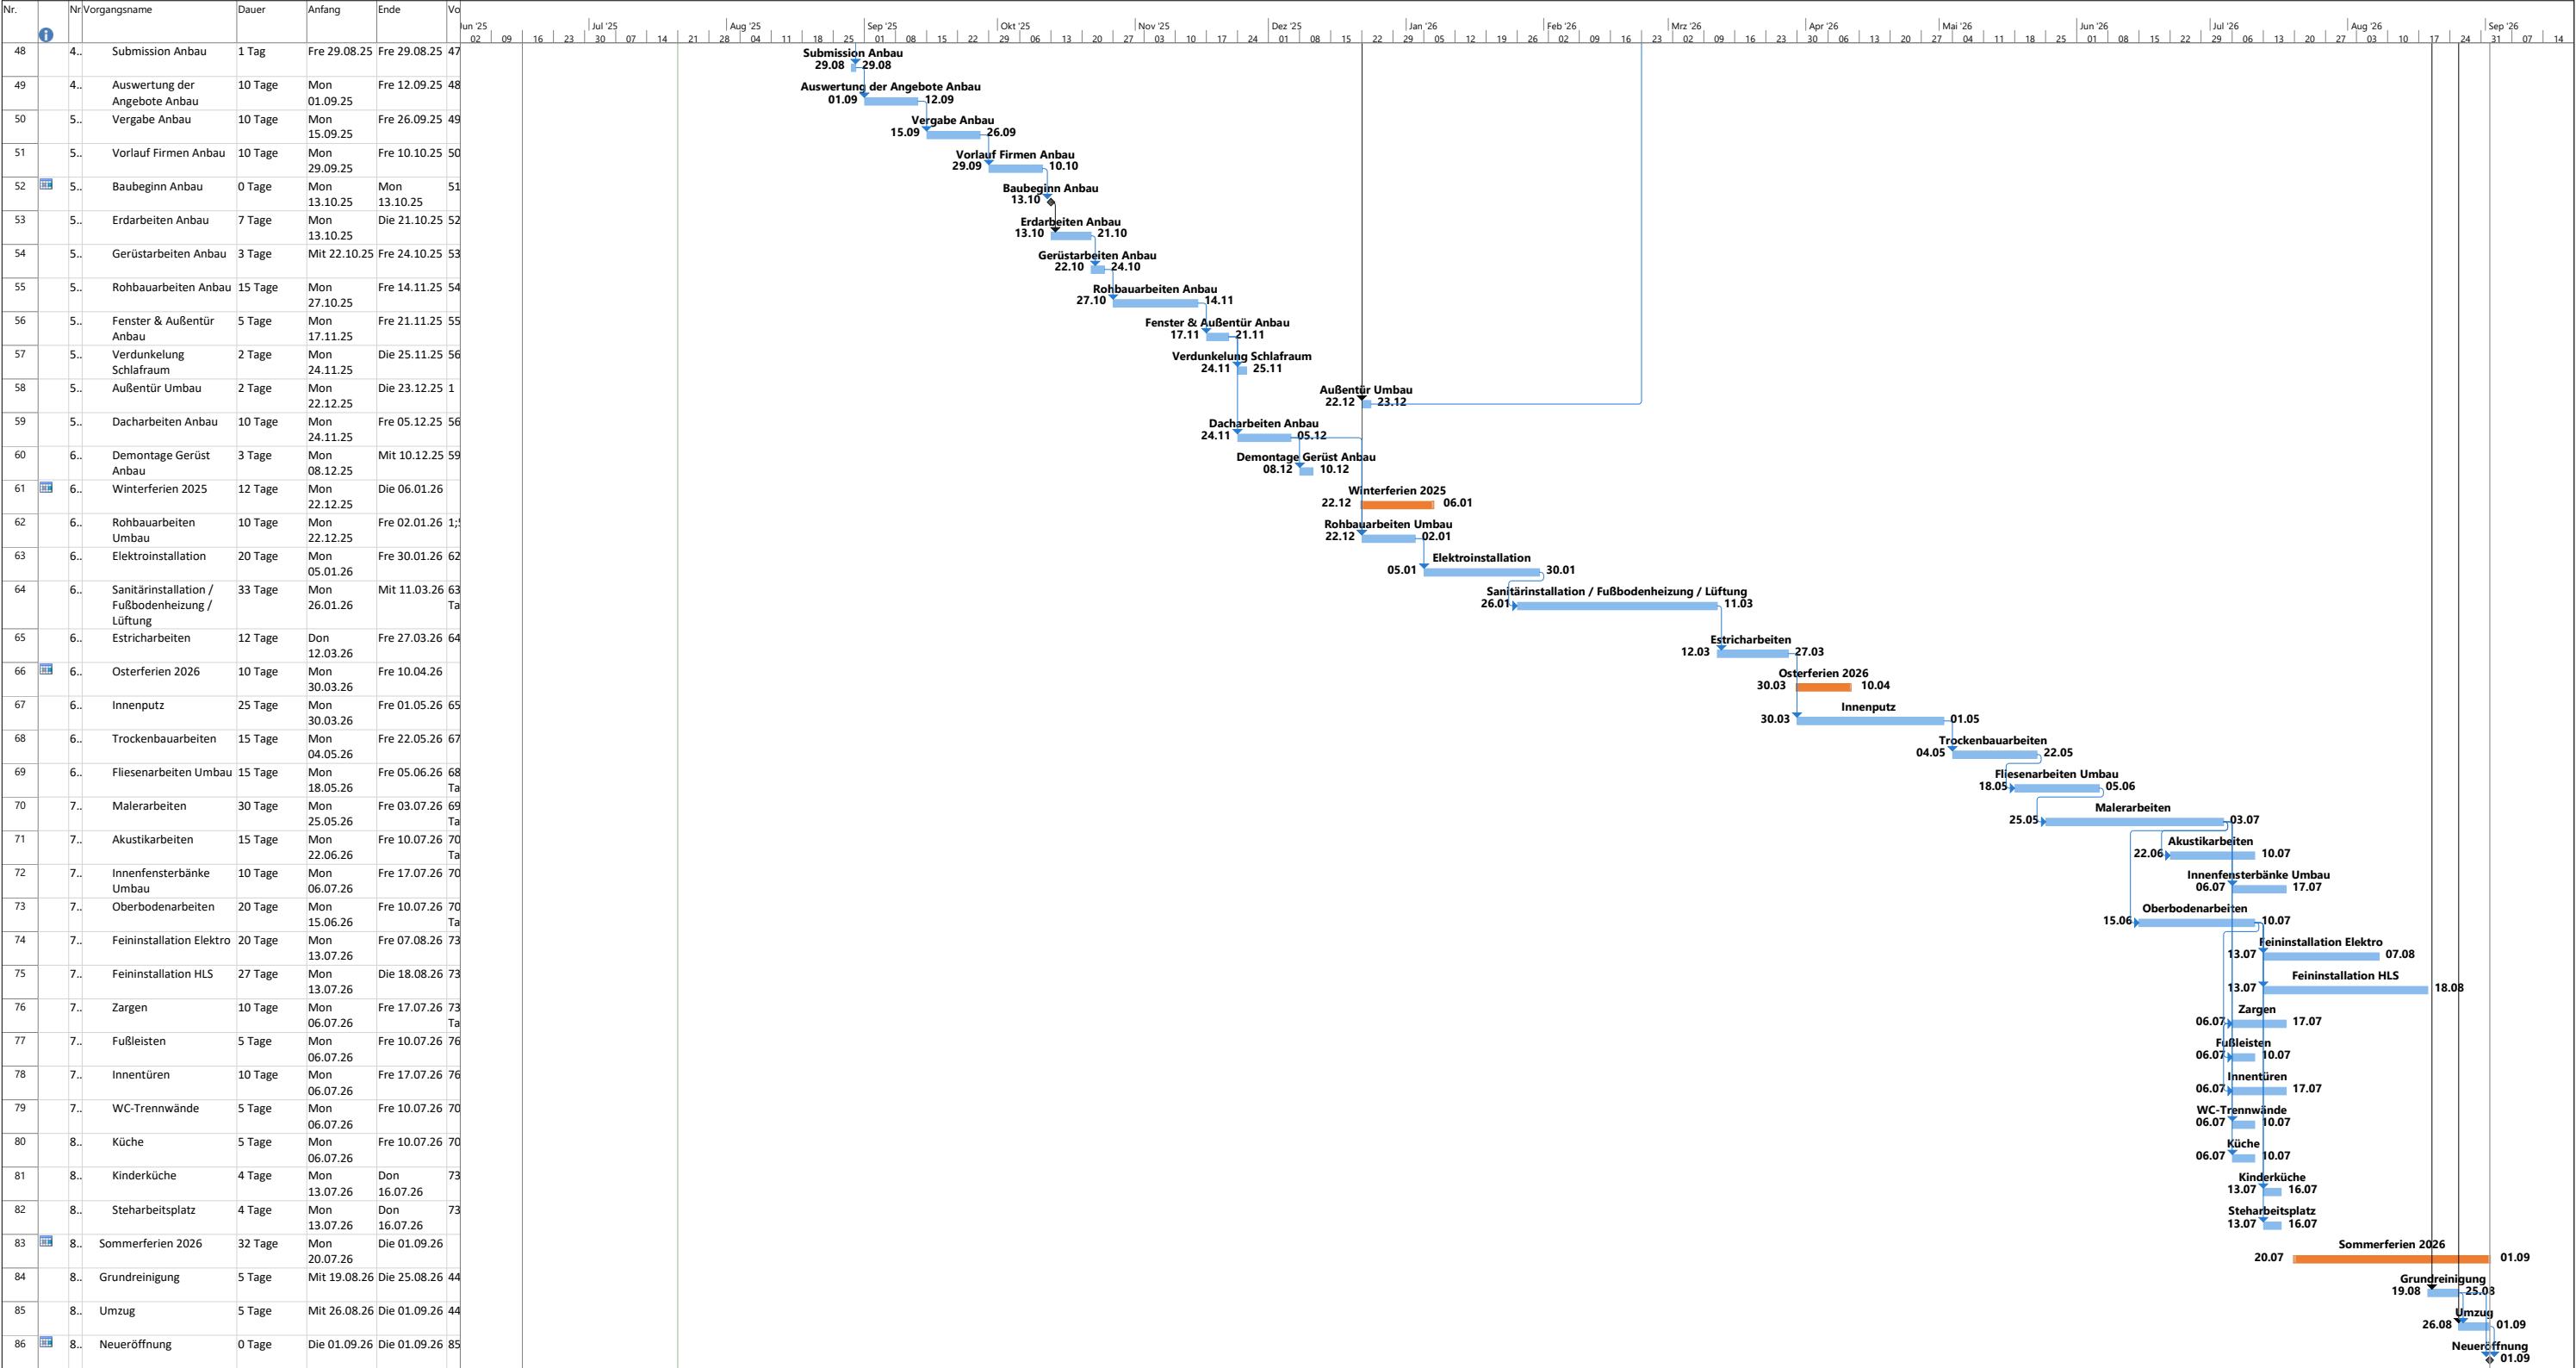

Projekt: Bauzeitenplan_KITA Eb
Datum: Mon 21.07.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Nur Dauer

Manueller Vorgang

Manueller Sammelrolup

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
