


Sperrpause		Dach - Achsen					Einhausung Treppe			Dach - Achsen						
		Ü	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Ü	
nächtl. Sperrung Gleis 2 + 3 (21:00 bis 4:50)	1	Montage Doppelstütze											Montage Doppelstütze			
	2				Montage Doppelstütze						Montage Doppelstütze					
	3						Montage Doppelstütze		Montage Doppelstütze							
	4						Montage Rinne		Montage Rinne							
	5				Montage Rinne						Montage Rinne					
	6	Montage Rinne											Montage Rinne			
	7	Montage Dachelemente Gleis 2											Montage Dachelemente Gleis 2			
	8	Montage Dachelemente Gleis 3											Montage Dachelemente Gleis 3			
	9															
	10															
nächtl. Sperrung Gleis 2 + 3 (21:00 bis 4:50)	11						Montage Dachelemente Gleis 2									
	12						Montage Dachelemente Gleis 3									
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19	Montage Beleuchtung, Lautsprecher, Uhr, DSA, Signale														
	20	Montage Beleuchtung, Lautsprecher, Uhr, DSA, Signale														
	21	Montage Beleuchtung, Lautsprecher, Uhr, DSA, Signale														
	22	Montage Beleuchtung, Lautsprecher, Uhr, DSA, Signale														
	23	Ausstattung (Fallleitungen, Rückhaltesystem, Taubenschutz)														
	24	Ausstattung (Fallleitungen, Rückhaltesystem, Taubenschutz)														
	25	Abnahme der Ausrüstung Gl. 4 + 5 + Restarbeiten (z. Bsp. Beschilderung, Befestigung Blenden für Stützen, Rinnenträger und Dachelemente)														
	26	Abnahme der Ausrüstung Gl. 4 + 5 + Restarbeiten (z. Bsp. Beschilderung, Befestigung Blenden für Stützen, Rinnenträger und Dachelemente)														
	27	Rückbau Provisorium														

Montage Doppelstütze einschl. Riegel	3 h je Doppelstütze (Bauteil mit insgesamt 4 Verbindungen)
Montage Treppenportal einschl. Riegel	5 h je Rahmen (Bauteil mit insgesamt 6 Verbindungen)
Montage Rinnenträger und Rinne	2 h je Feld
Montage Kragarme + Dachelemente (Trägerrost) mit schienengebundenem Hebegerät	3 h je Feld
Herstellung Dacheindeckung einschl. Attikablech und Montage Rückhaltesystem	
Bstg.-Ausrüstung	
Abnahme der Ausrüstung	

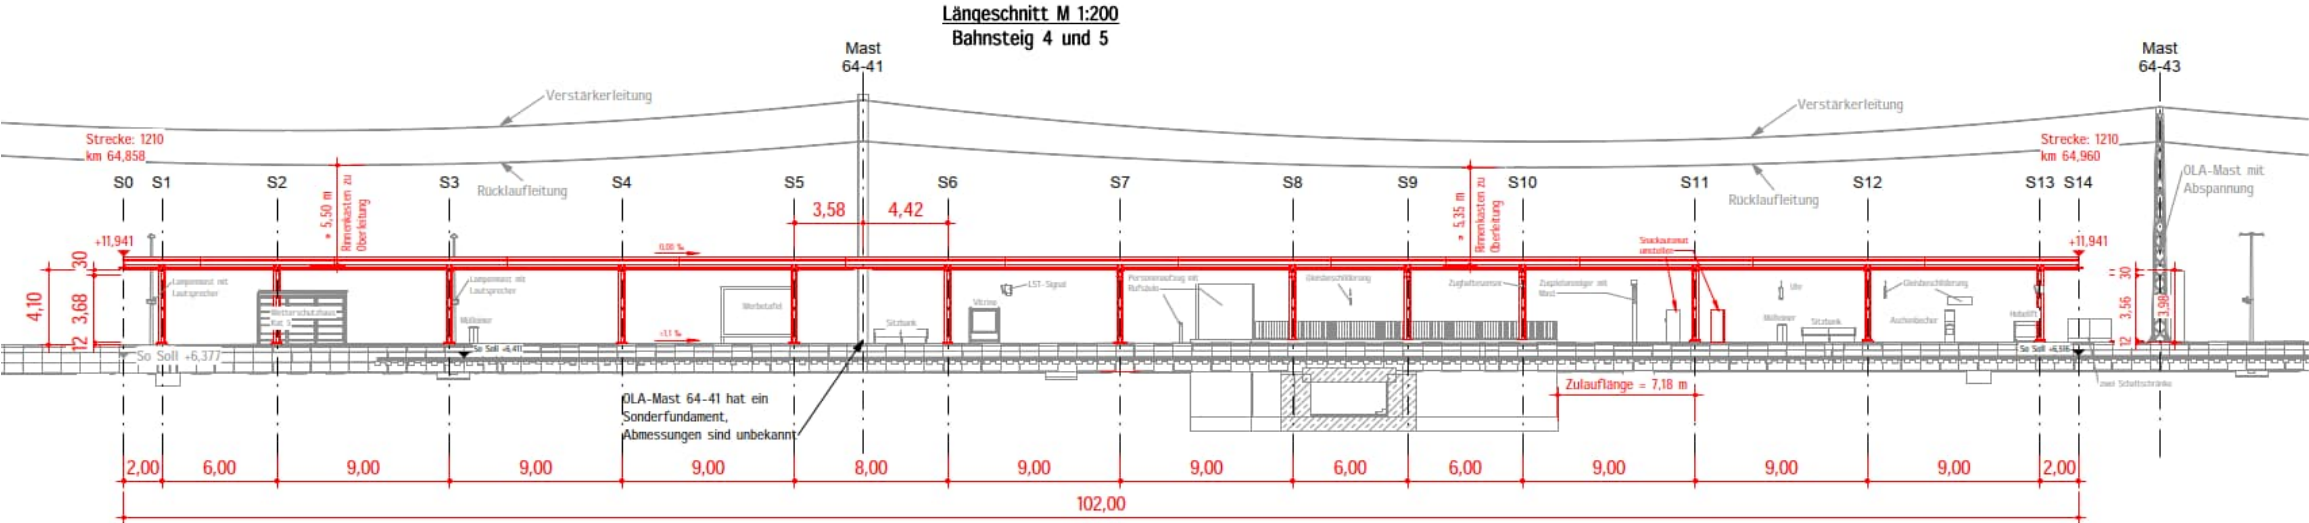

Sperrpause		Dach - Achsen					Einhausung Treppe			Dach - Achsen					
		Ü	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Ü
nächtl. Sperrung Gleis 4 + 5 (21:00 bis 4:50)	1	Montage Doppelstütze										Montage Doppelstütze			
	2				Montage Doppelstütze						Montage Doppelstütze				
	3						Montage Doppelstütze		Montage Doppelstütze						
	4						Montage Rinne		Montage Rinne						
	5				Montage Rinne						Montage Rinne				
	6	Montage Rinne											Montage Rinne		
	7	Montage Dachelemente Gleis 4											Montage Dachelemente Gleis 4		
	8	Montage Dachelemente Gleis 5											Montage Dachelemente Gleis 5		
	9														
	10														
	11						Montage Dachelemente Gleis 4								
	12						Montage Dachelemente Gleis 5								
	13														
nächtl. Sperrung Gleis 4 + 5 (21:00 bis 4:50)	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19	Montage Beleuchtung, Lautsprecher, Uhr, DSA, Signale													
	20														
	21														
	22														
	23														
	24	Ausstattung (Fallleitungen, Rückhaltesystem, Taubenschutz)													
	25														
	26	Abnahme der Ausrüstung Gl. 4 + 5 + Restarbeiten (z. Bsp. Beschilderung, Befestigung Blenden für Stützen, Rinnenträger und Dachelemente)													
	27														
	28	Rückbau Provisorium													
