



Berlin Zoologischer Garten Bauphasenplanung BA 5+6 Sperrpause 2026

Sperrpausenübersicht

Aktueller Sachstand 2026

- Komplettspernung Fernbahn vom **14.06.-12.12.2026**
- Arbeiten: Hallendach Schürzen ggf. Bahnsteigkante
- Rahmenbedingungen:
 - Durchfahrt an einem Gleis ist zu gewährleisten

Aktueller Sachstand 2027

- Fernbahnspernungen eingereicht, angemeldete Sperrpausen
- Arbeiten: Restarbeiten Dach
- KW 1, KW 4, KW 6, KW 9, KW 13, KW 17, KW 20, KW 25, KW 33, KW 37, KW 41, KW 45, KW 48

Aktueller Sachstand 2028 Eingereichte Sachstände

- Gleis 1, Bstg. A: **07.01. – 26.05.2028** ~~01.01. bis 31.05.28~~
u.a. Fassade Hrdbpl., Bahnsteigdach 2/3, Bstg.-Belag & -Tröge, Wegeleitsystem
- Gleis 2, Bstg. A: **26.05. – 21.07.2028** ~~01.06. bis 31.07.28~~
u.a. Bahnsteigdach 1/3, Bstg.-Kante, -Belag & -Tröge, Wegeleitsystem
- Gleis 3, Bstg. B: **21.07. – 15.09.2028** ~~01.08. bis 30.09.28~~
u.a. Bahnsteigdach, Bstg.-Kante, -Belag & -Tröge, Wegeleitsystem
- Gleis 4, Bstg. B: **15.09. – 09.12.2028** ~~01.10. bis 09.12.28~~
u.a. Bahnsteigdach, Bstg.-Kante, -Belag & -Tröge, Wegeleitsystem

~~bis~~ – beantragte Daten


bis – Stand 12.09.2026

Bauphasenplanung BA 5+6

BA 5-6 – BE-Flächen / Kranaufstellung

Baustelleneinrichtungsplan-Plan, LMBG, Stand 06.10.25 / Phase 3 – 14.06.2026 bis 12.12.2026 mit Kennzeichnung BE1-6 & TDK


SPERRPAUSE

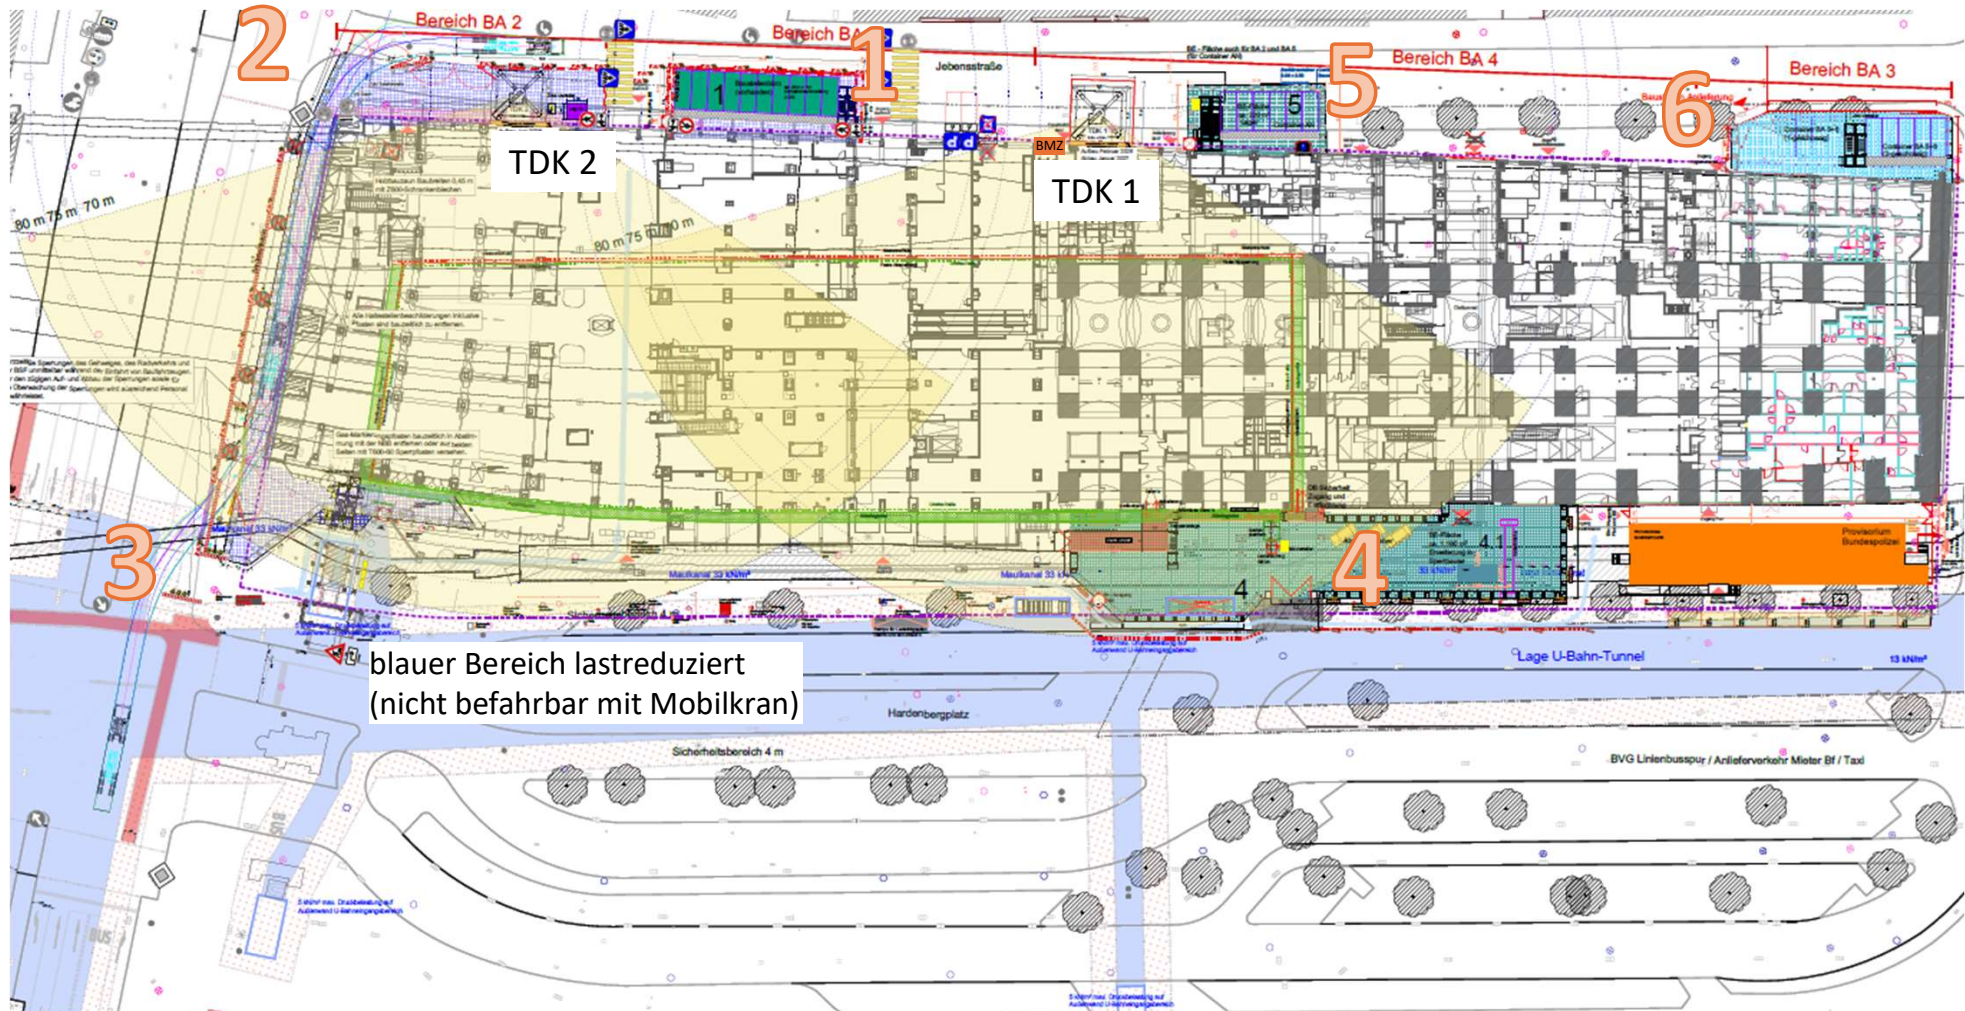

Sperrpause Fokus Gerüstablauf – 24h vor SPP

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

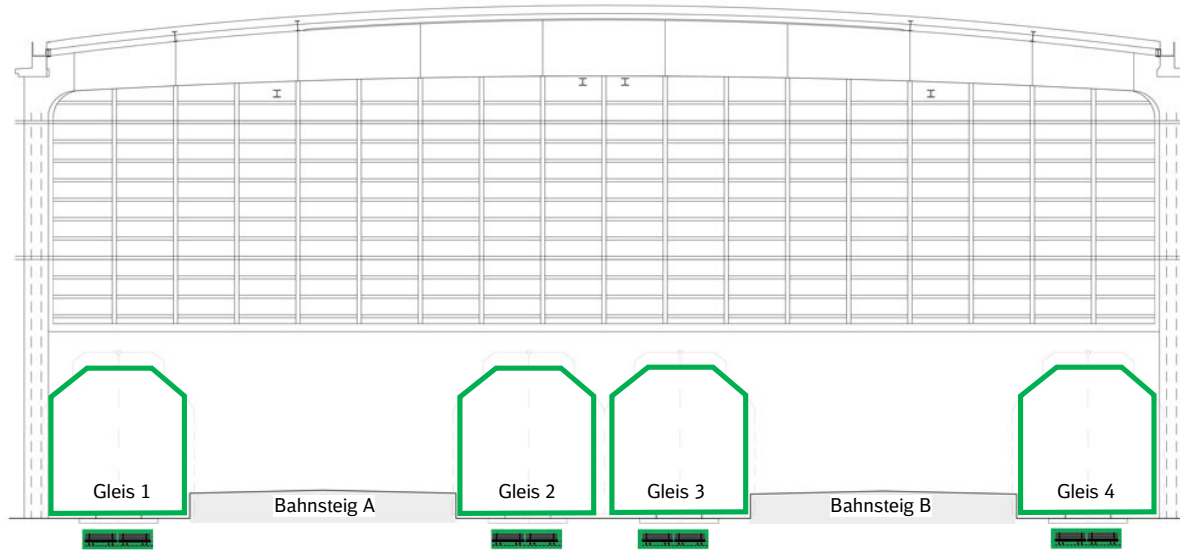

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Logistik:
alle Gleise frei

Voraussetzungen:

- BE-Flächen 3+4 eingerichtet inkl. Gerüsttürm
- BE Umschlagplatz eingerichtet
- Fassadengerüste aufgebaut
- Kräne aufgebaut
- Sperrung der Zugänge für Reisende vorbereitet
- Vorbereitete Gerüsttransporte vom Umschlagplatz
- Aufmaß in BETRAs vorab erfolgt

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt



Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Ost-Schürze:

- Einrichtung Sicherheit (PT1, feste Absperrung) Gleis 4 zu 5
- Einzelfelder Glasdach über Bstg. A entglasen für Durchsteifung Fassaden-Gerüst, falls nicht vor SPP stattgefunden hat

Maßnahmen beide Schürzen:

- Gleis 1: Konsole an-schweißen & Schutzbleche OLA abnehmen, falls nicht vor SPP stattgefunden
- LST-Anlagen staub- und stoßfest ummanteln
- OLA schützen
- Aufbau Schürzengerüst Bstg. A und UK Schürzengerüst Bstg. B
- Aufbau restlicher Gerüste im OLA-Sicherheitsbereich (Anschlusspunkte)
- Sicherung Lautsprecher (Abspannung & Kabel)

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- Gleis 1-3: Sperrung kurzzeitig (*Einbau Gerüst*)
- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

- BE-Flächen 3+4 eingerichtet inkl. Gerüsttürm
- Fassadengerüste aufgebaut
- Kräne aufgebaut
- Sperrung der Zugänge für Reisende abgeschlossen
- vorbereitete Gerüsttransporte vom Umschlagplatz
- Abschaltung OLA


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den Osttunnel und gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

- Logistikfahrt Schürzengerüst am 14.06 auf Gleis 1 o. 2 inkl. entladen durch VE Gerüst.

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

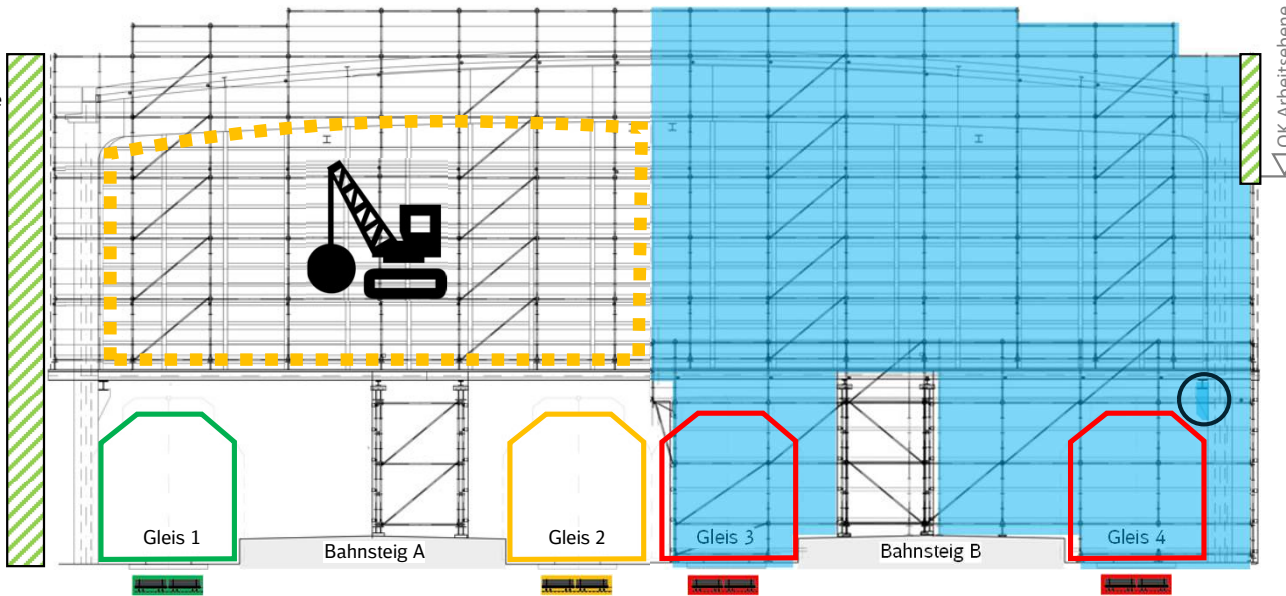

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Ost-Schürze:

- Einzelfelder Glasdachüber Bstg. B entglasen für Durchsteifung Fassaden-Gerüst, falls nicht vor SPP stattgefunden hat

Maßnahmen Schürzen:

- Gleis 4: Konsole anschweißen & Schutzbleche OLA abnehmen, falls nicht vor SPP stattgefunden
- LST-Anlagen staub- und stoßfest ummanteln
- OLA schützen
- Aufbau Schürzengerüst Bstg. B
- Entglasen über Bstg. A
- Sicherung Lautsprecher (Abspannung & Kabel)

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4


- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

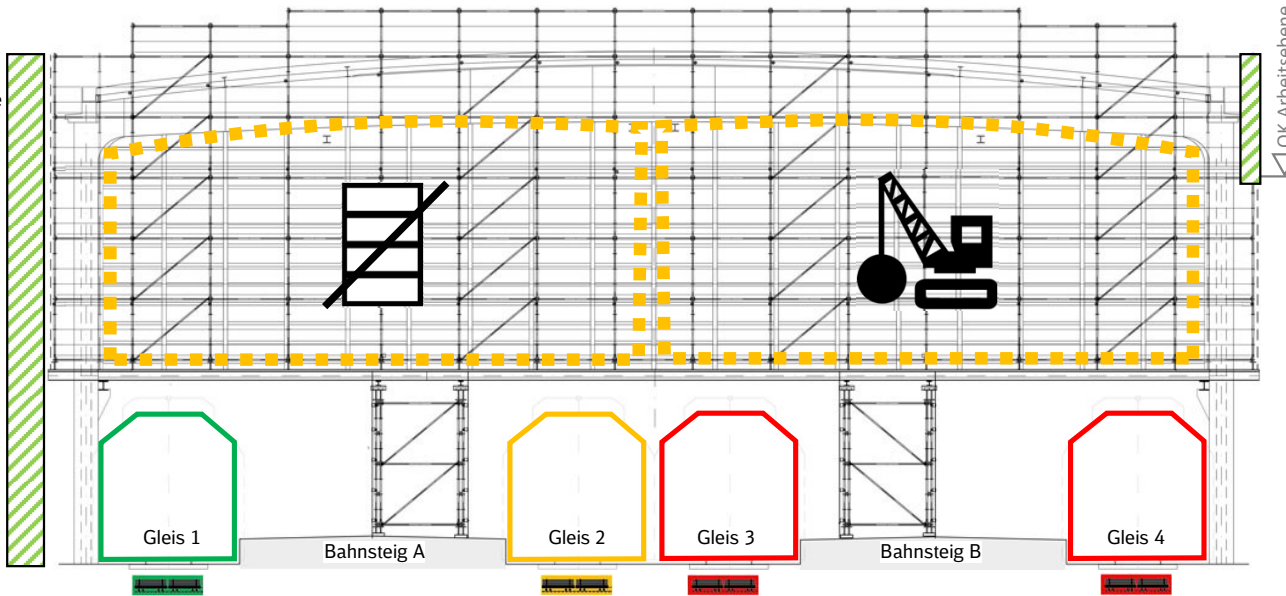

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Entglasen über Bstg. B
- Bestands-Fassadenleitern entnehmen (ggf. zersägen) über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4


- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

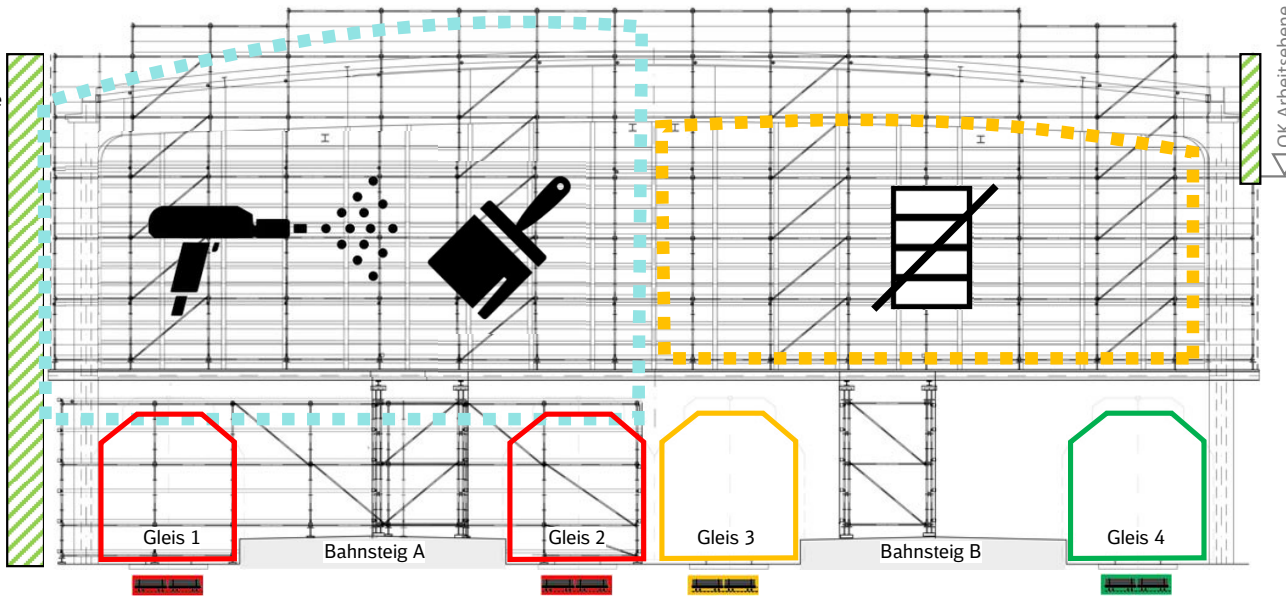

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Bestands-Fassadenelemente entnehmen (ggf. zersägen) über Bstg. B
- Sandstrahlen und beschichten der Fassaden-Pfosten über Bstg. A
- Einrüstung Unterseite Schürze über Gleis 1+2 auf- und abbauen für Sandstrahlen und Beschichten Schürzen-Unterseite

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2


- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

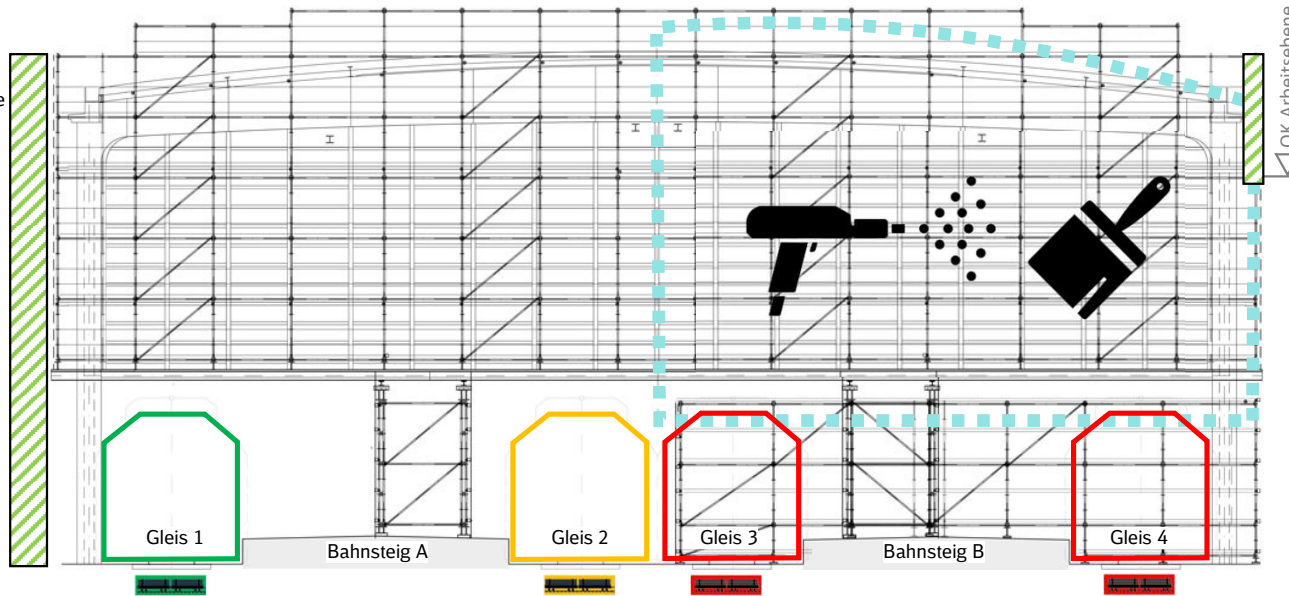

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Sandstrahlen und beschichten der Fassaden-Pfosten über Bstg. B
- Einrüstung Unterseite Schürze über Gleis 3+4 auf- und abbauen für Sandstrahlen und Beschichten Schürzen-Unterseite

Logistik:


- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

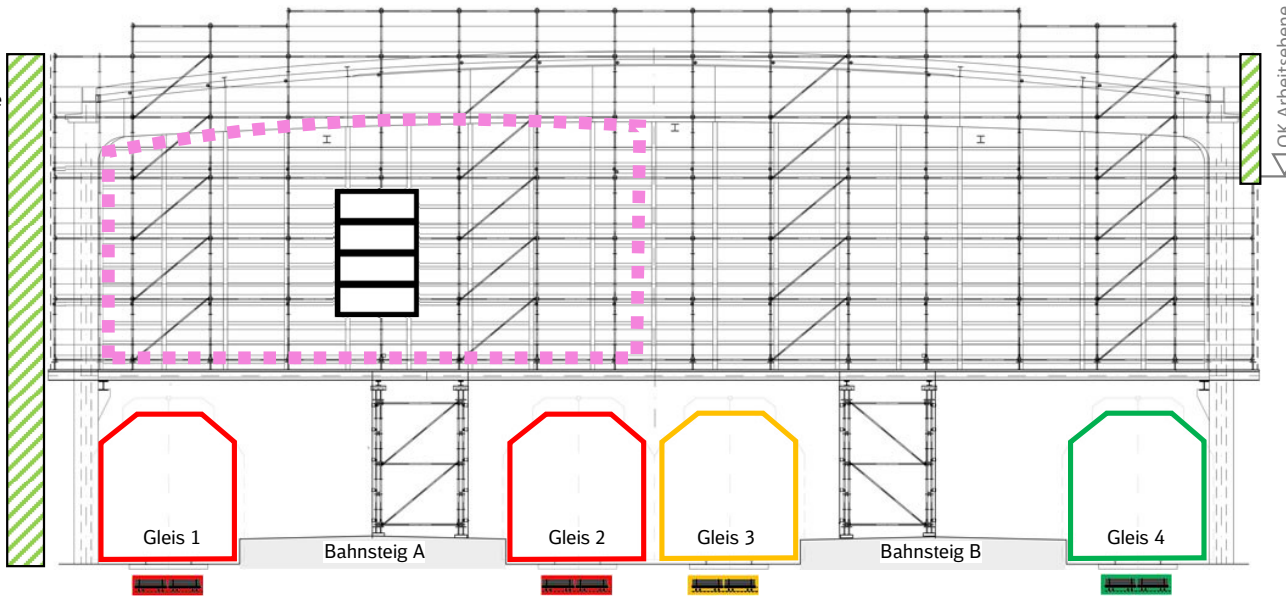

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- teilw. Rückbau Gerüst:
Verringerung Laufbreite
Gerüststege vor Einbringung
Fassaden-Element über
Bstg. A
- Einbringen der neuen
Fassaden-Elemente Bstg. A
- Laufbreite Gerüststege
wiederherstellen nach
Einbringung Fassaden-
Elemente über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2


- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den
gesperrten Bereich Fernbahn-
halle
- Zugang über Fassadengerüst
(BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

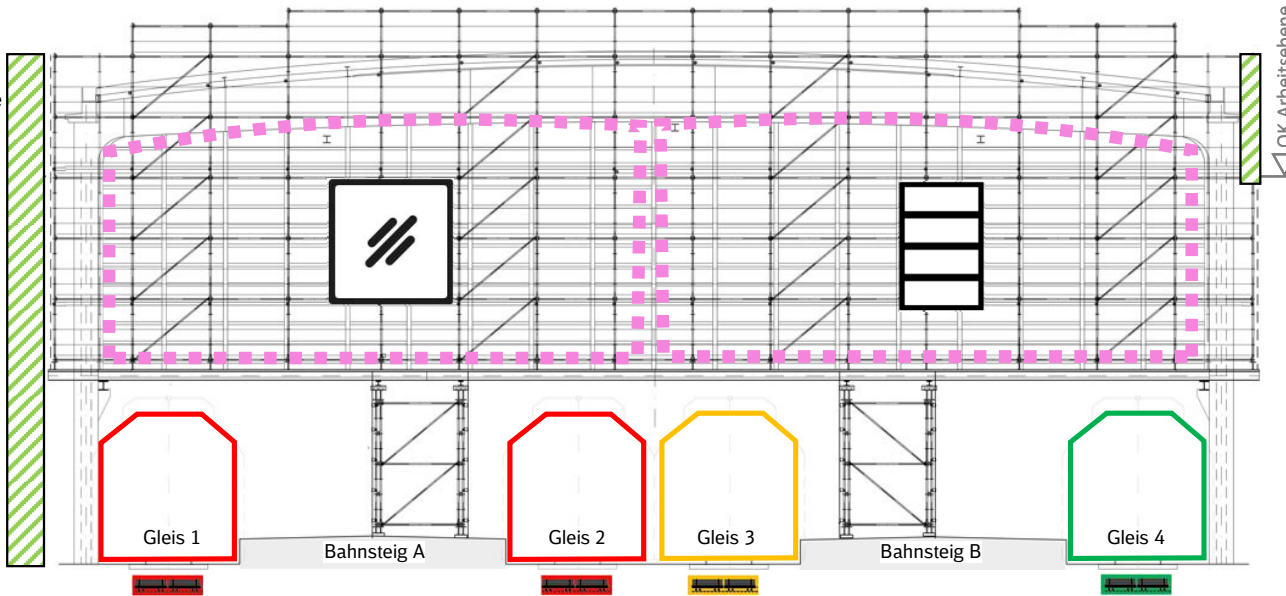

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- teilw. Rückbau Gerüst:
Verringerung Laufbreite
Gerüststege vor Einbringung
Fassaden-Leitern über Bstg. B
- Einbringen der neuen
Fassaden-Leitern Bstg. B
- Laufbreite Gerüststege
wiederherstellen nach
Einbringung Fassaden-Leitern
über Bstg. B
- Verglasen der Schürze über
Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2


- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den
gesperrten Bereich Fernbahn-
halle
- Zugang über Fassadengerüst
(BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

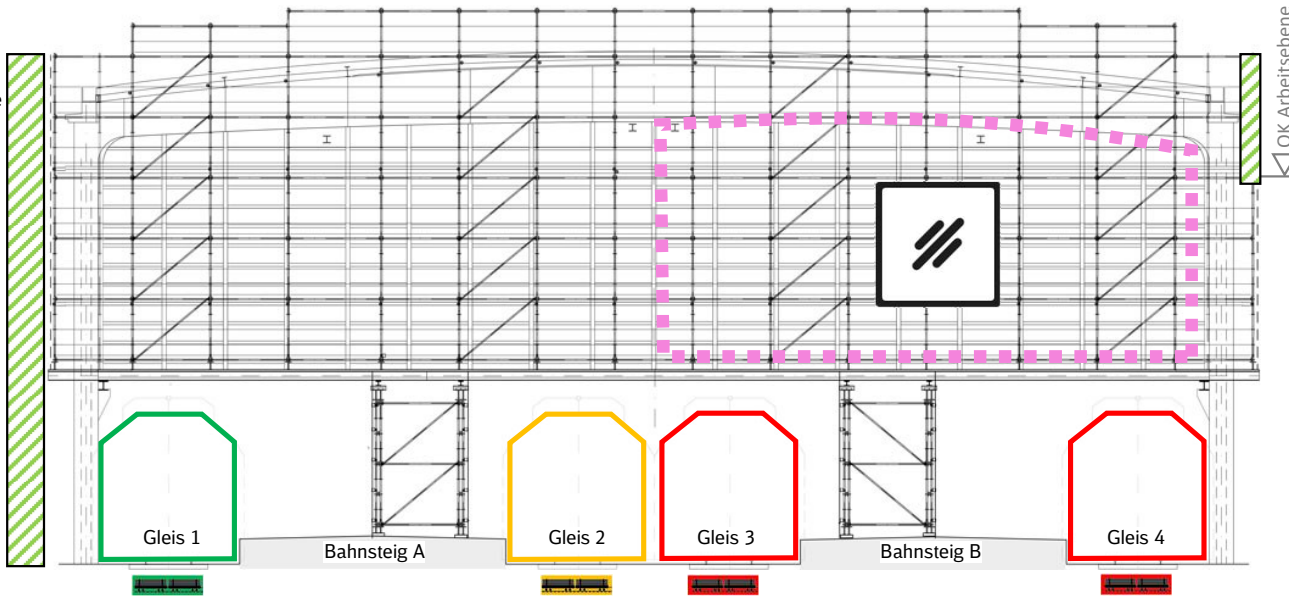

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Verglasen der Schürze über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4


- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

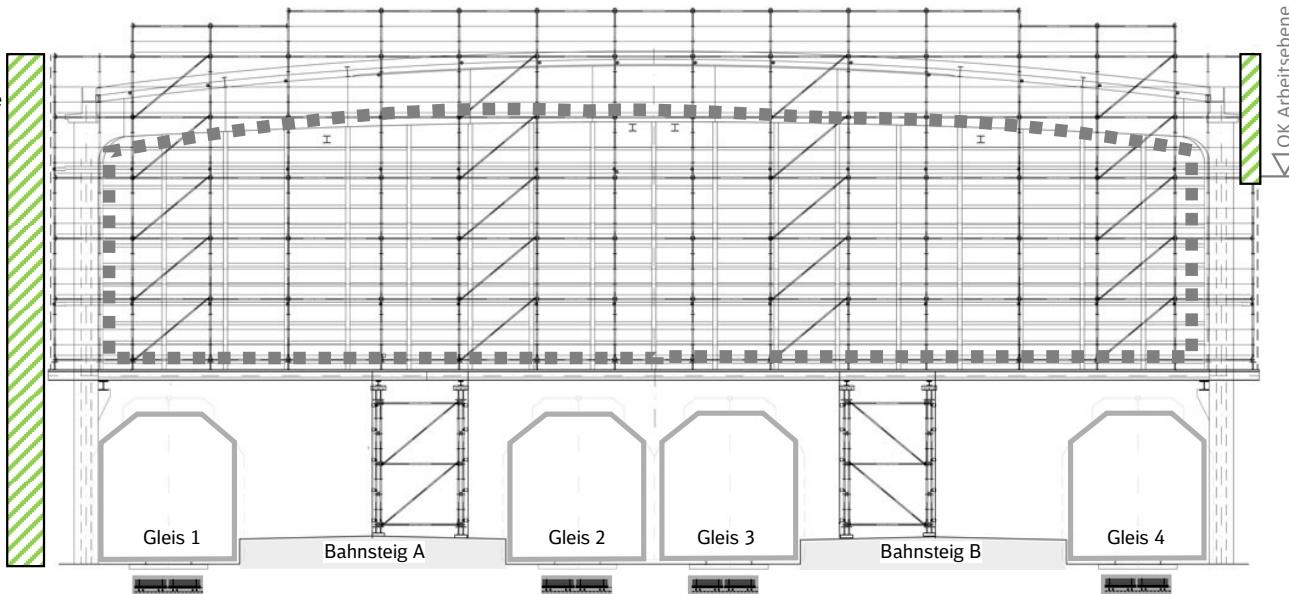

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Bremsrahmen (in Woche 16):

- Sperrung Gl. 2+3 für erschütterungsfreie Spritzbetonarbeiten an Bremsrahmen in BA2+3

Maßnahmen Schürzen:

- Nacharbeiten
- Abnahme Gewerk Schürzenfassade
- Einbringen Kastenleiter (Aufgang zu neuer Deckenbefahranlage) an Innenseite Halle

Logistik:


- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang durch den Osttunnel (ab 28.08.) und gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

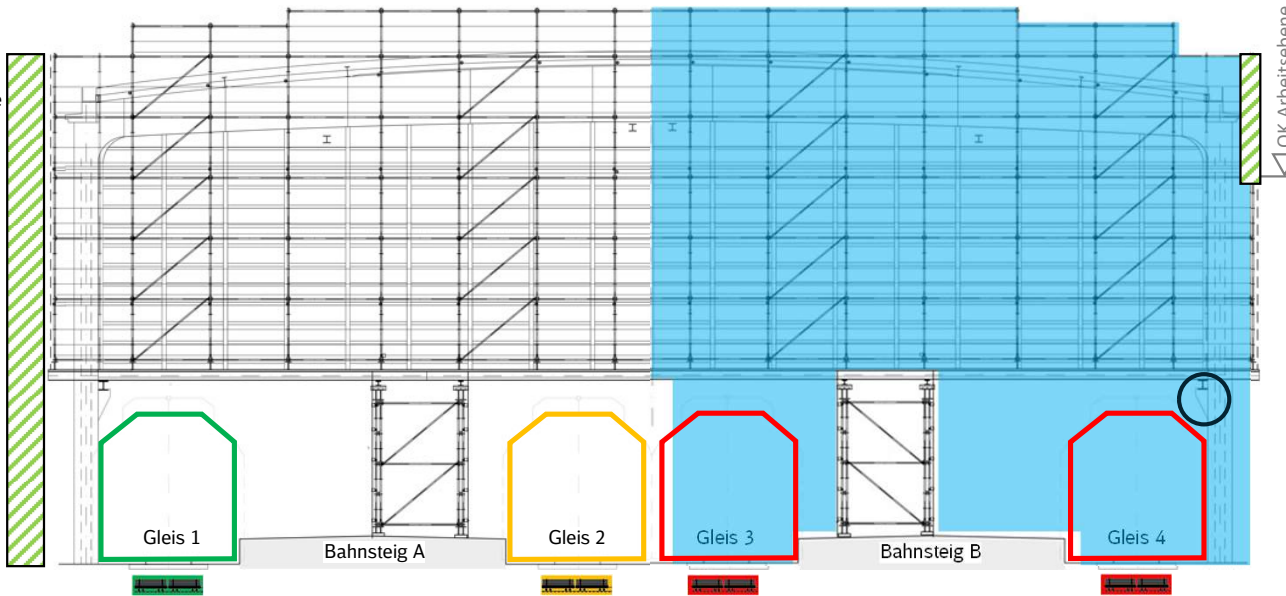

Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Rückbau Schürzengerüst Gleis 3+4
- Ummantelung LST-Anlagen rückbauen, Funktionstüchtigkeit prüfen / wiederherstellen
- Konsole Gleis 4 rückbauen und nacharbeiten
- Schürze Ost: Glas auf Dach Bstg. B wiedereinsetzen

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

- Schürzenarbeiten abgeschlossen

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den Osttunnel und gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  Rückbau Glas
-  Rückbau Fassadenleitern
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Neubau Fassadenelemente
-  Neu Verglasen
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt



Ansicht Ostschürze, o.M.
gilt spiegelbildlich auch für Westschürze
Breite ca. 39m, Höhe üOK Gleis ca. 15m

Maßnahmen Schürzen:

- Rückbau Schürzengerüst Gleis 1+2
- Ummantelung LST-Anlagen rückbauen, Funktionstüchtigkeit prüfen / wiederherstellen
- Konsole Gleis 1 rückbauen und nacharbeiten
- Schürze Ost: Glas auf Dach Bstg. Aiedereinsetzen
- Abfahren Schürzengerüst Bstg. A ab 02.11
- Abfahren Schürzengerüst Bstg. B ab 19.10.
- Einbringen Kastenleiter (Aufgang zu neuer Deckenbefahranlage) an Innenseite Halle

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

- Schürzenarbeiten abgeschlossen

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter durch den Osttunnel und gesperrten Bereich Fernbahnhalle
- Zugang über Fassadengerüst (BE3/4)


Halle

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 0, Regelbetrieb bis Mai 2025

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung

-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

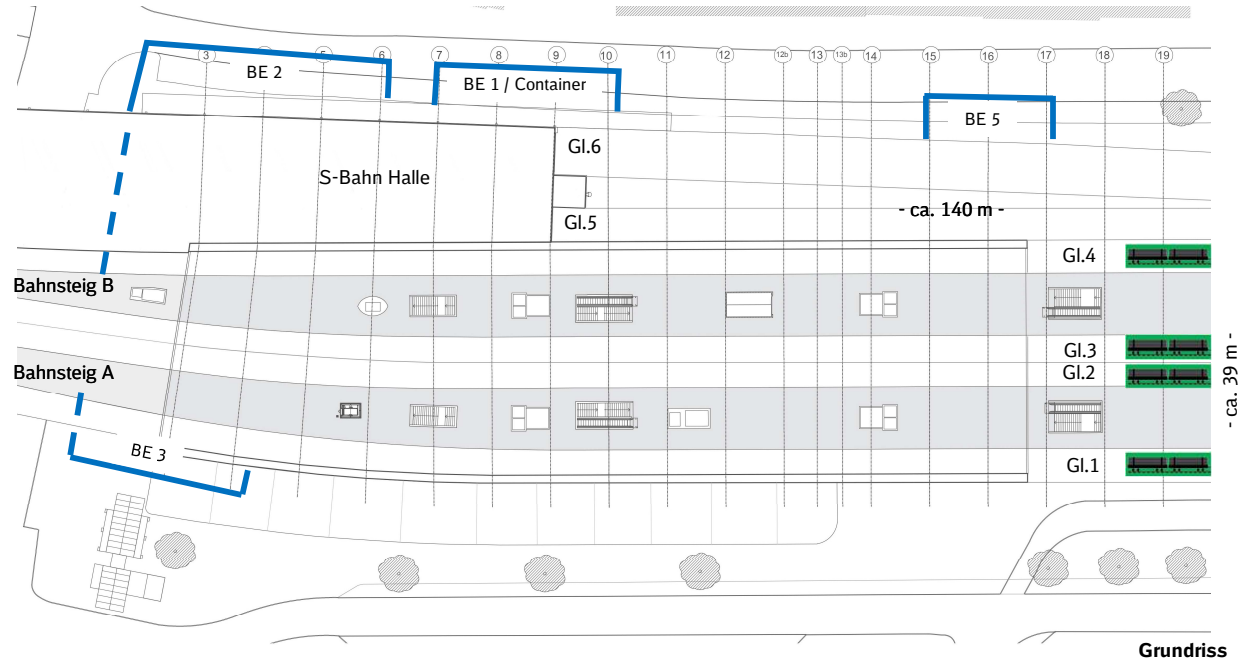

Maßnahmen:

- Arbeitsvorbereitungen
- WMP Fassade

Logistik:

Straße (LKW)


Antransport:

Abtransport:

Schiene (Logistikfahrten)

Antransport:

Abtransport:

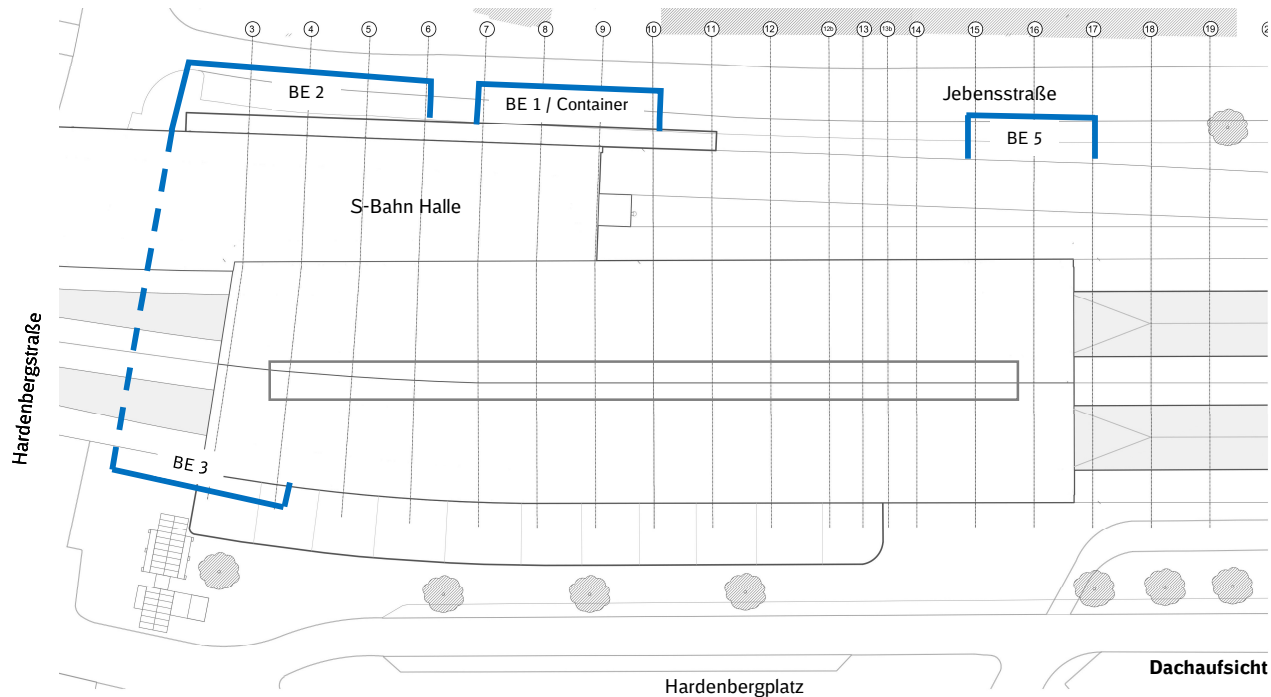


Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 1, Regelbetrieb Mai – Dez. 2025

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung

-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

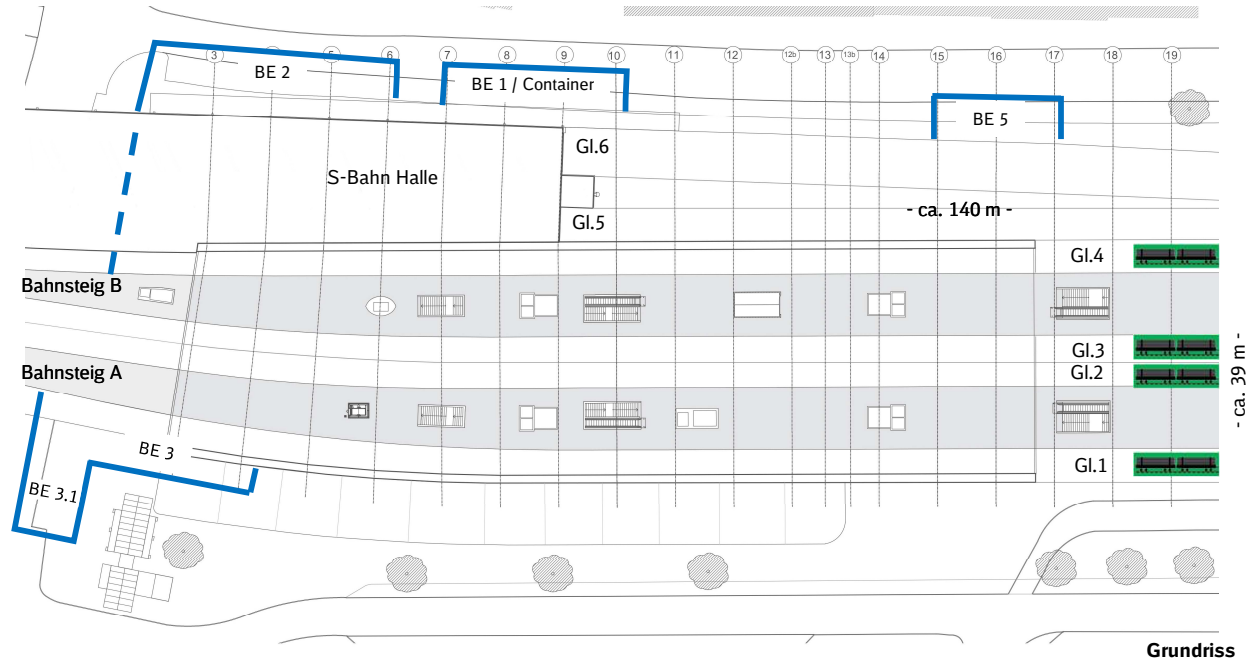

Maßnahmen:

- Arbeitsvorbereitungen
- WMP Fassade
- Erweiterung BE3
- Beginn Arbeiten BA 2+3

Logistik:

Straße (LKW)


Antransport:

Abtransport:

Schiene (Logistikfahrten)

Antransport:

Abtransport:

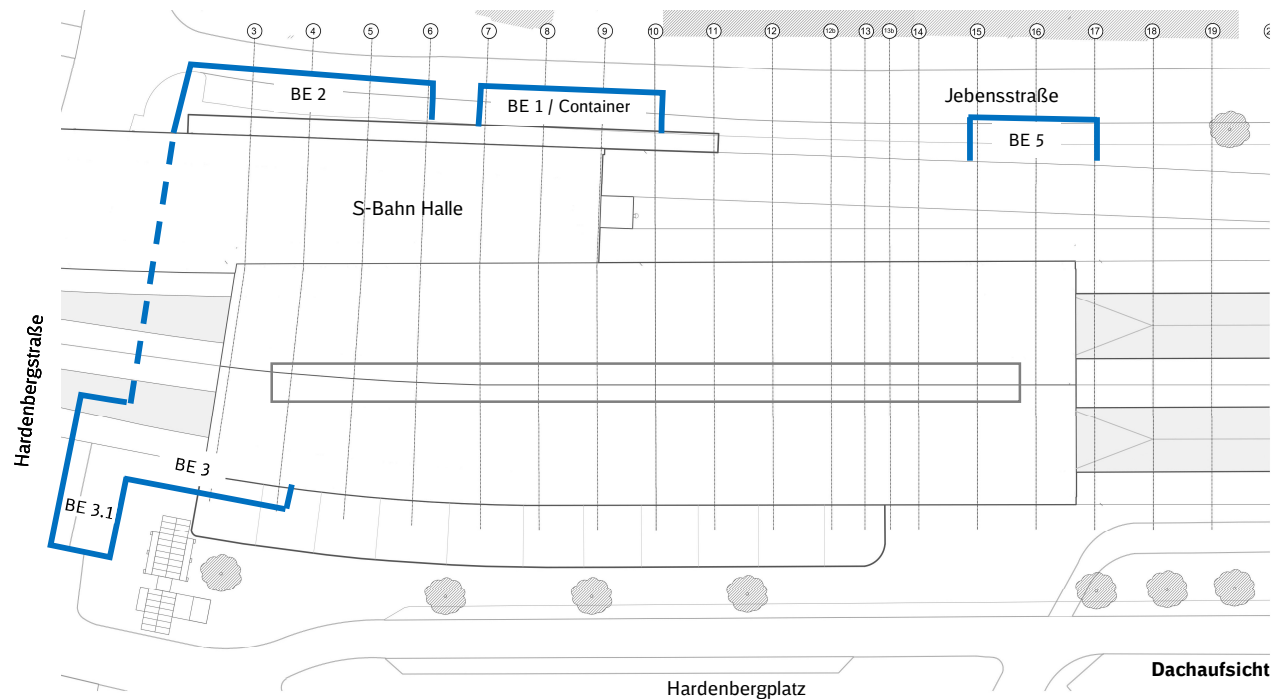


Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 1.1, Regelbetrieb bis Juli/August 2025

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- ||| bauzeitl. Beleuchtung

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

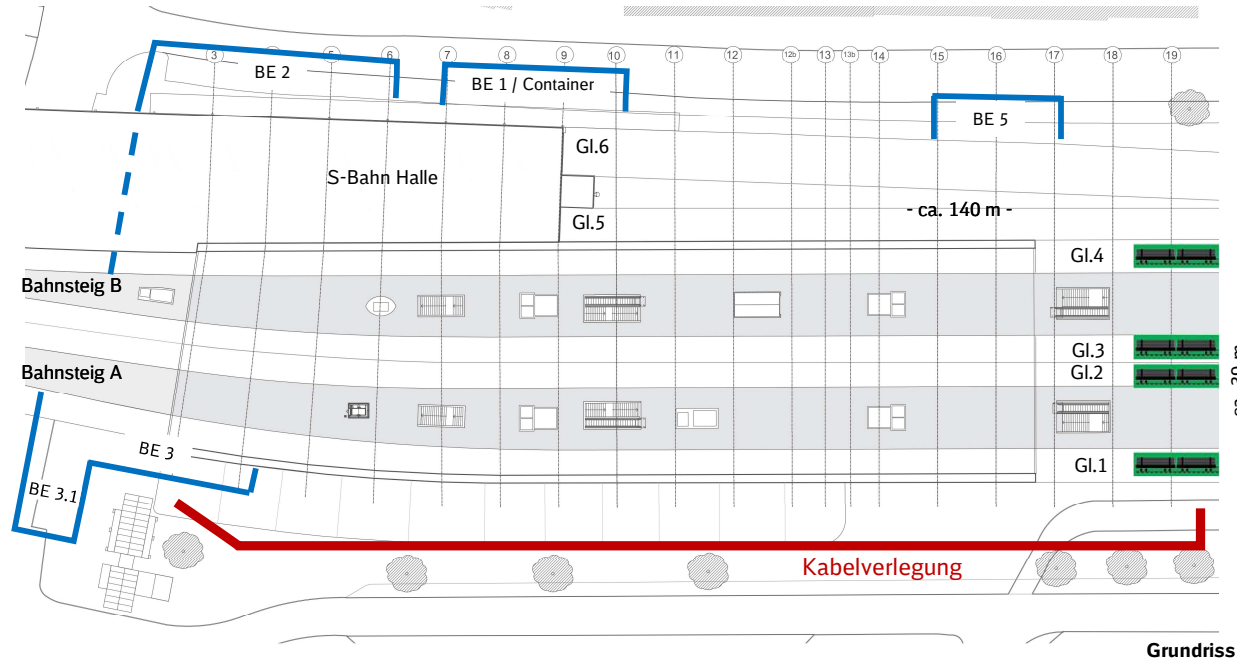


Maßnahmen:

- Arbeitsvorbereitungen
- WMP Fassade
- Kabelverlegung
- Hardenbergplatz (DB Energie) (abgeschlossen)

Logistik:

- Straße (LKW)
- Antransport:
-
- Abtransport:
-
- Schiene (Logistikfahrten)
- Antransport:
-
- Abtransport:
-

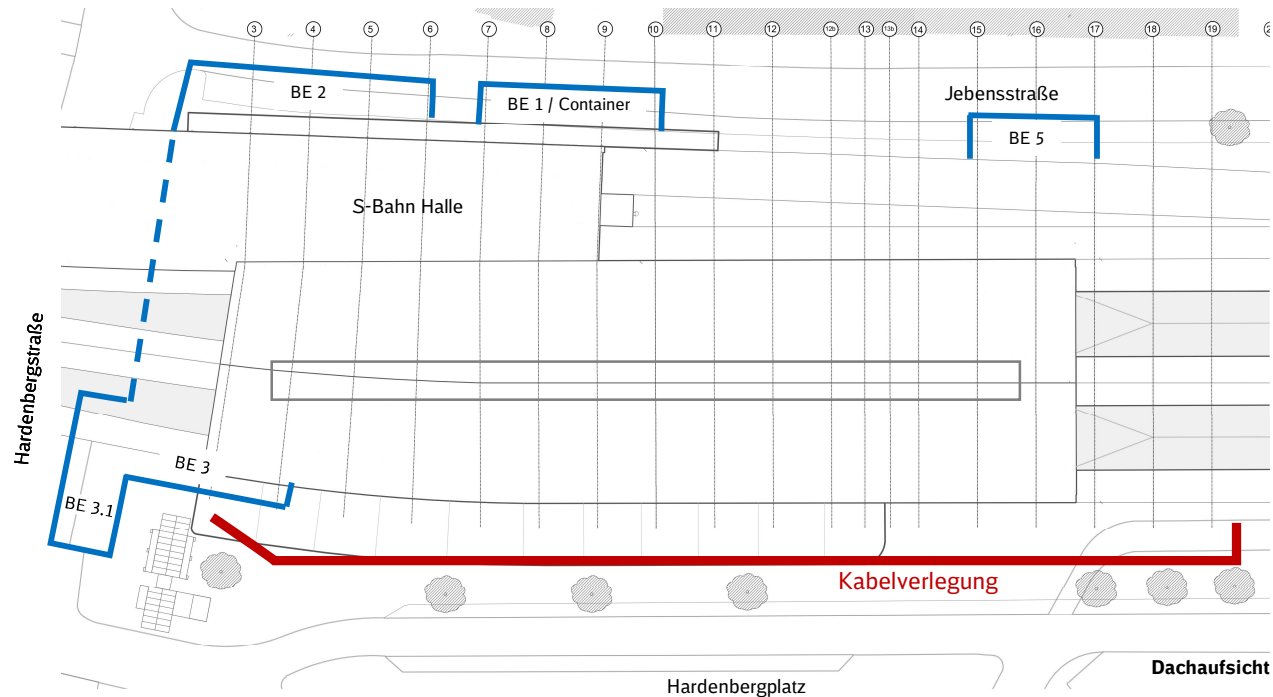


Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 1.2, Regelbetrieb Jun. – Dez. 2025

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung

-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

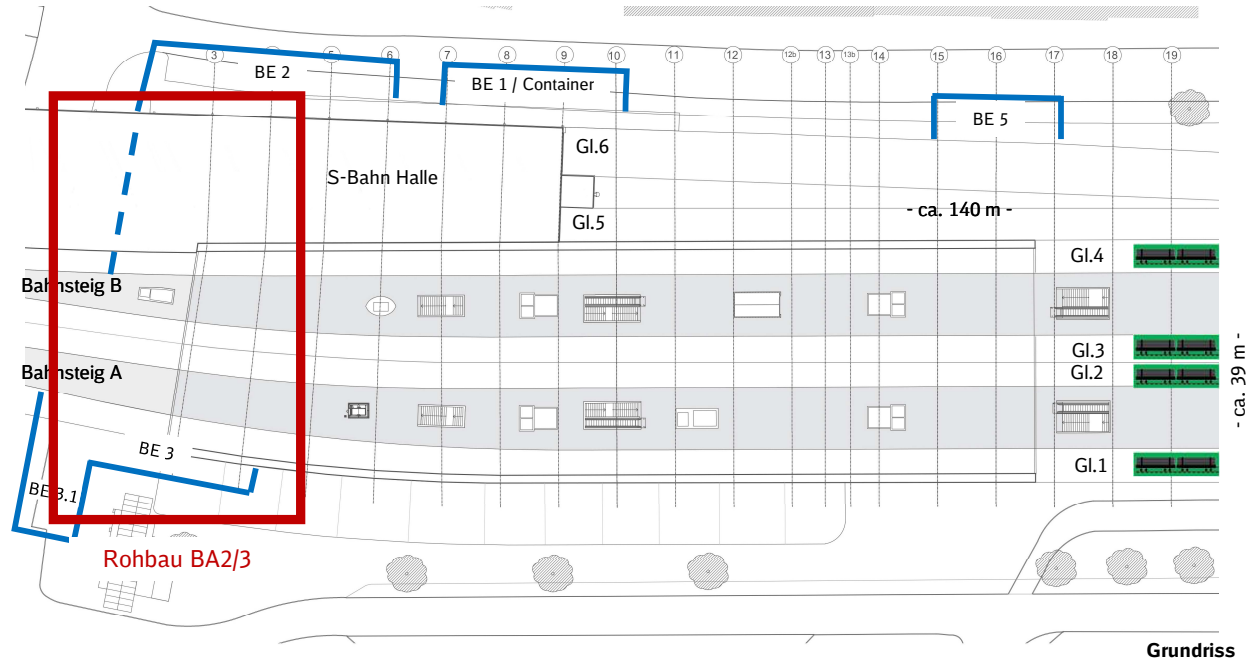

Grundriss

Maßnahmen:

- Arbeitsvorbereitungen
- WMP Fassade
- Erweiterung BE3
- Beginn Arbeiten BA 2+3

Logistik:

Straße (LKW)

Antransport:


Abtransport:

Schiene (Logistikfahrten)

Antransport:

Abtransport:

-

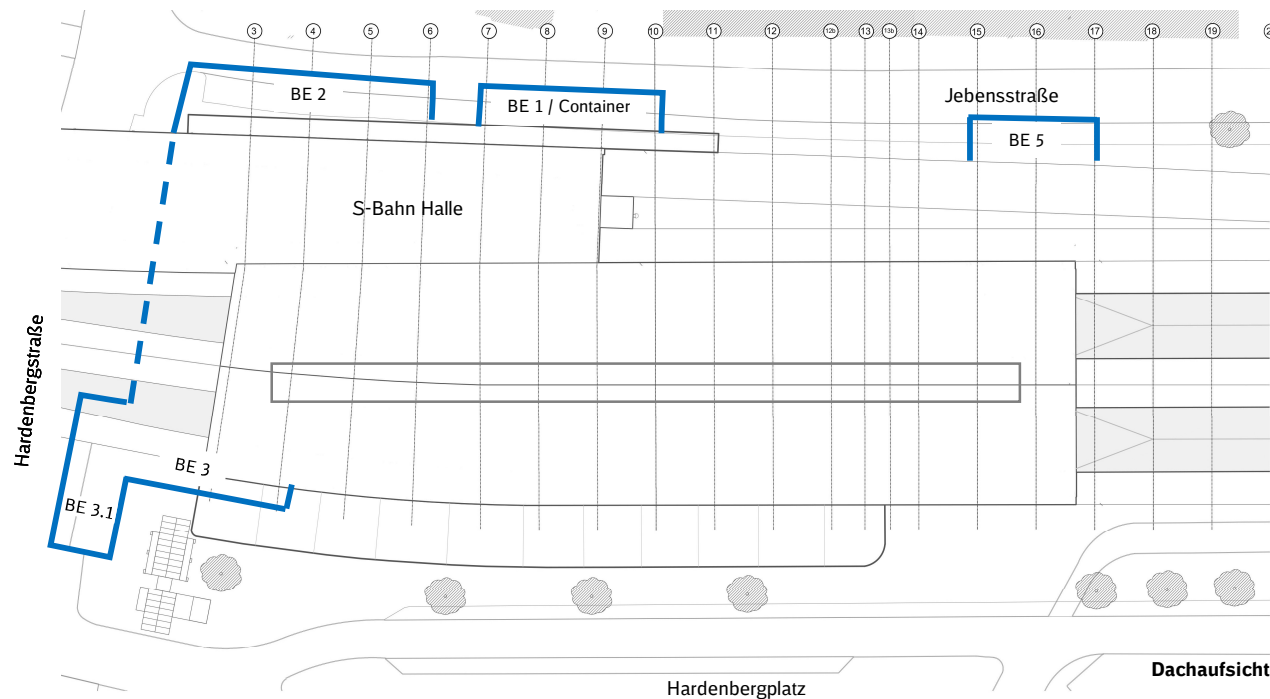

Dachaufsicht



Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Regelbetrieb Jan. – 01.05.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

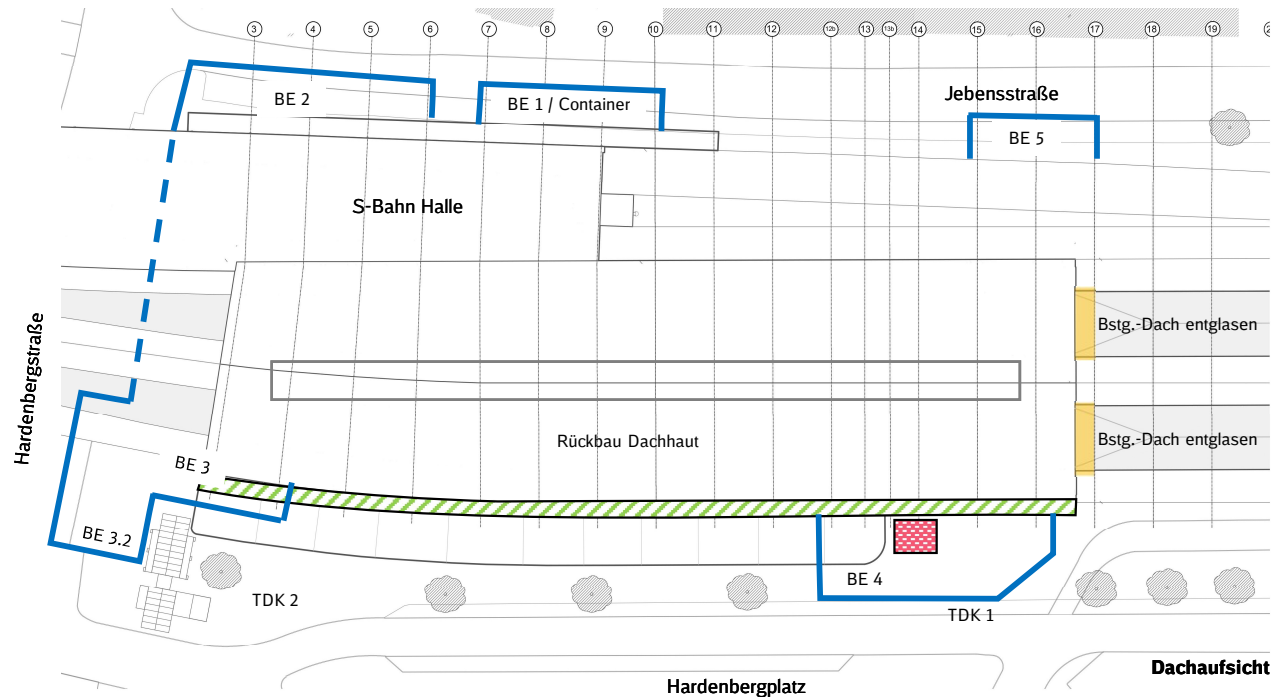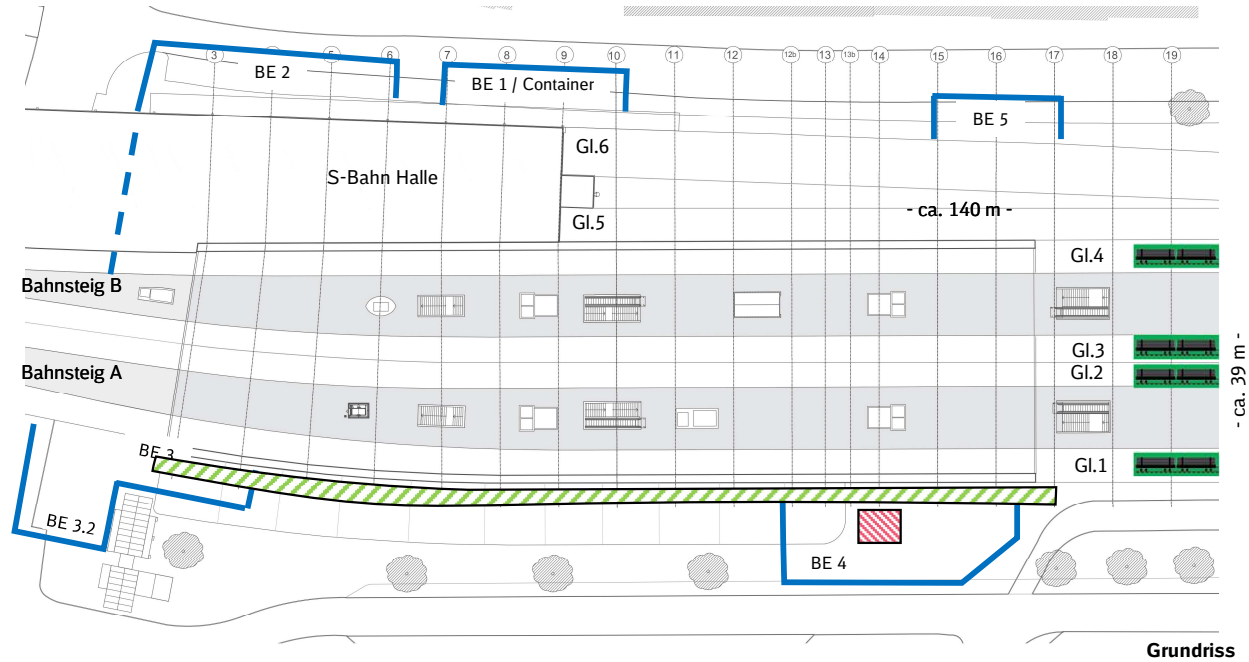

Maßnahmen:

- BE-Flächen
- Aufbau Fassadengerüst



Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 2, Regelbetrieb 01.05. – 11.06.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- ▨ Fassaden-Dachfanggerüste
- ▨ Abhanggerüst, Arbeitsebene
- ▨ Gerüsttürme
- ▨ Lastenaufzug m. Plattform
- ▨ Fassaden (Schürzen)
- ▨ Befahranlage
- ▨ bauzeitl. Beleuchtung

- ▨ Durchfahrtgleis
- ▨ Gleis für Baulogistik
- ▨ Gleis gesperrt

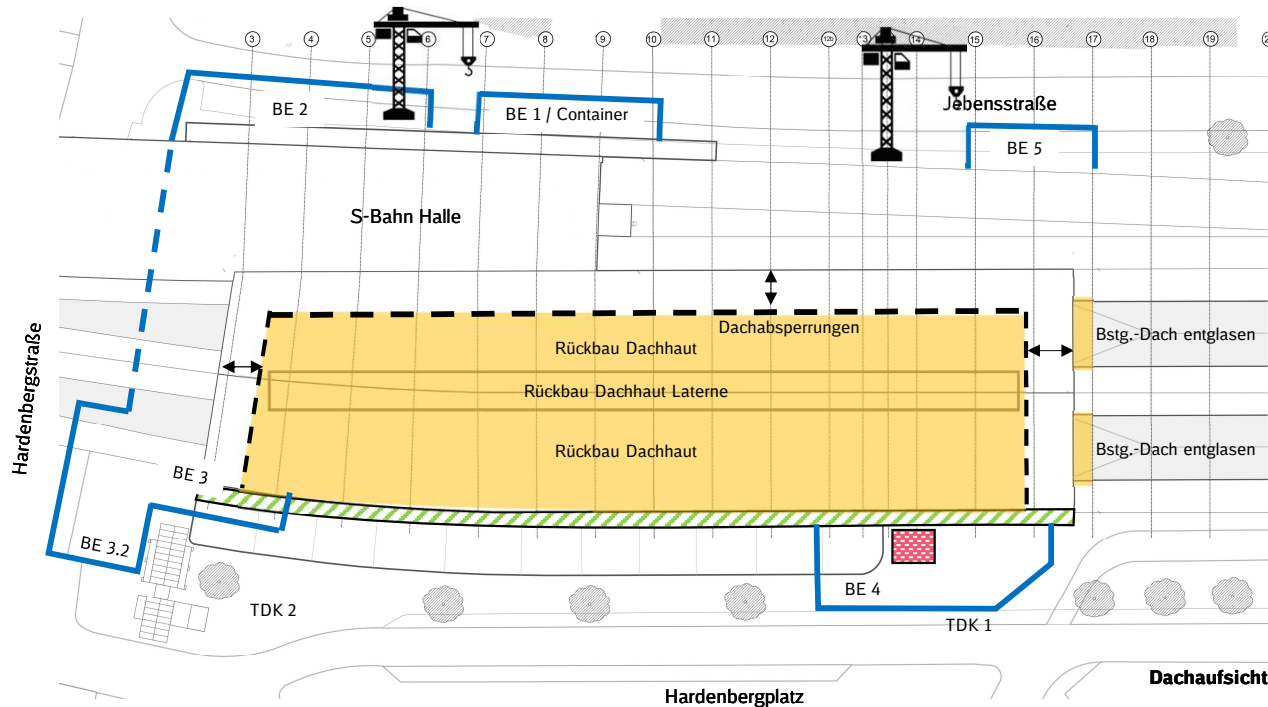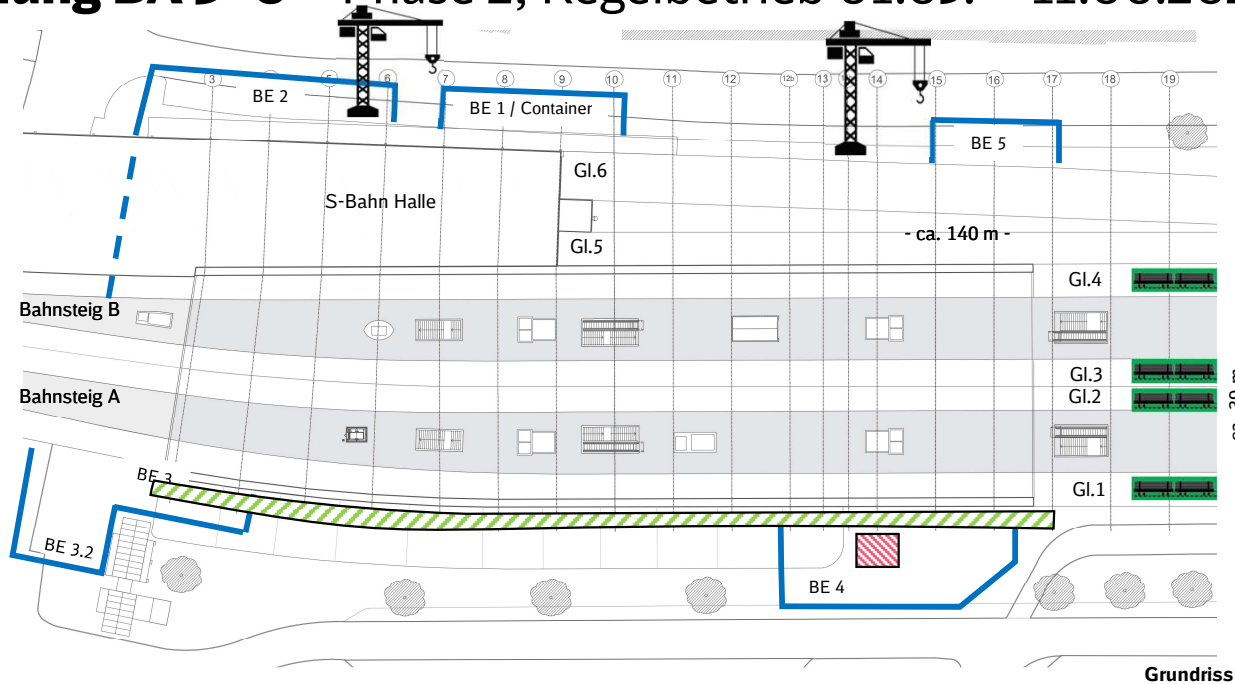

Maßnahmen:

- Rückbau Dachhaut
- Kran 1+2
(Aufstellung 04.- 08.05.)
- Rückbau Antennen*
(Steuerungskasten auf S-Bahndach: 19.05.;
2x Antennen: 22.-23.05.)
- Entglasen Dächer Bstg.
Achse 17 in BETRA
(Lagerung auf Außenbahnsteig)

*BETRA notwendig

Logistik:

Straße (LKW)

Antransport:

- Kran 1+2

Abtransport:

- Dachhaut 4.200 m²
- Dachlaterne 600 m²


Anmerkungen:

Bauphasenplanung BA 5+6 – Phase 2, Regelbetrieb bis 24h vor SPP


LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

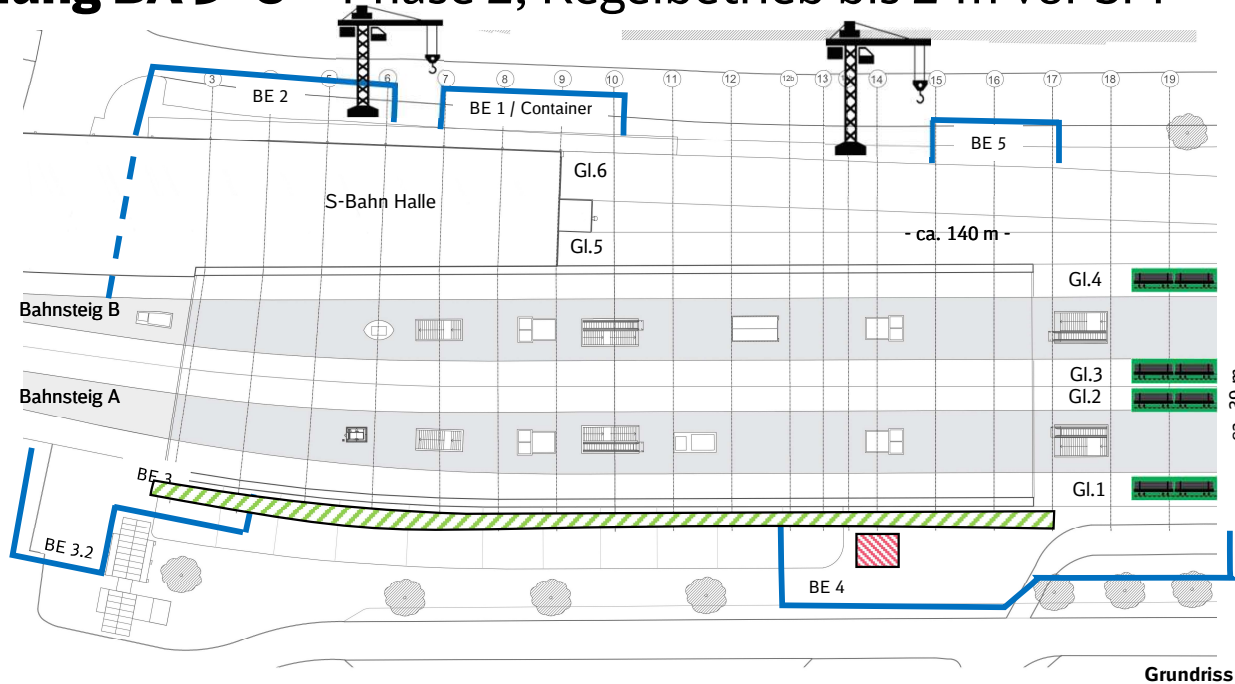

Grundriss

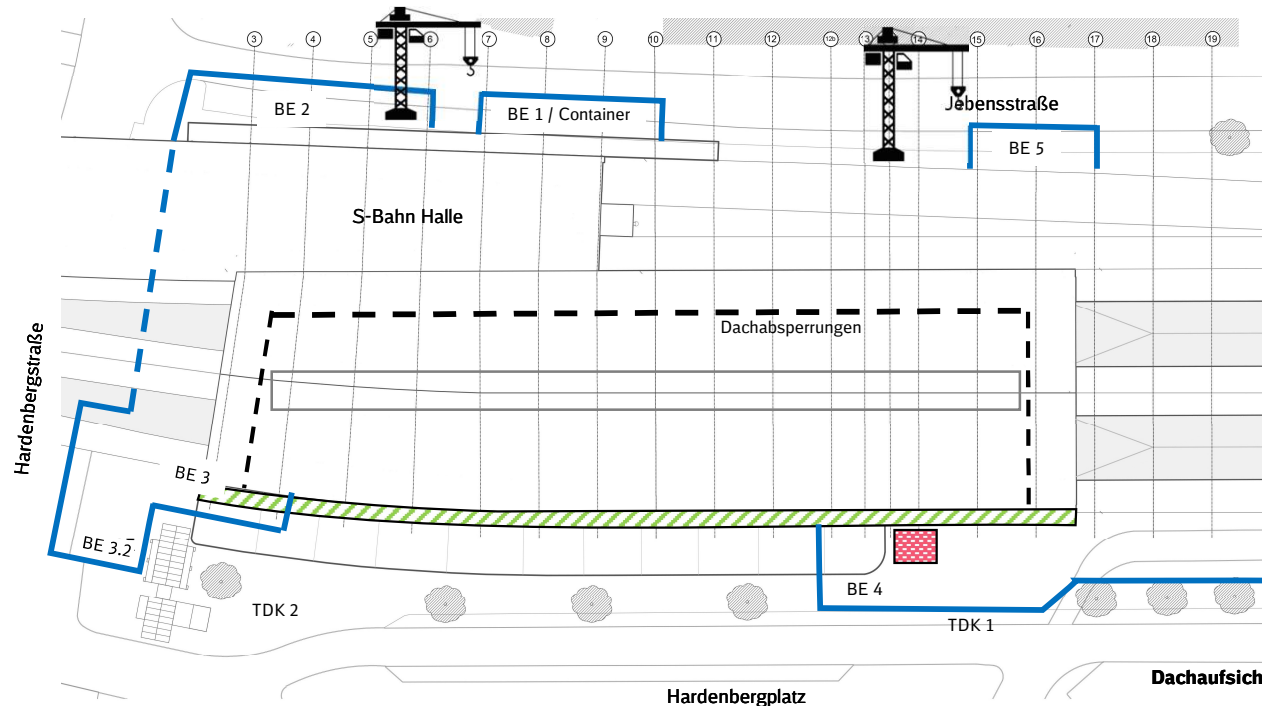

Dachaufsicht

Maßnahmen:

- Vorbereitung Absperren Zugänge Reisende abschließen
- Gerüsttransporte vorbereitet am Umschlagplatz
- PT1 Bahnsicherung zu Gleis 5 vorbereitet
- Schürzen-Konsolen vormontiert
- Rückbau Dachhaut zu 90% abgeschlossen
- **zu klären:** automatische Beschallung sperren/abschalten

Logistik:

Straße (LKW)

Antransport:

- Vorbereitung Lieferung Schürzengerüste

Abtransport:

Schiene (Logistikfahrten)

Antransport:

- Vorbereitung Lieferung Abhanggerüst
- Vorbereitung Lieferung Schürzengerüste
- Vorbereitung Lieferung Schutzmaßnahmen VE501

Anmerkungen:

- Alle sperrpausen-relevanten Gewerke baufrei!


Phase 3, Sperrpause

14.06. – 12.12.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

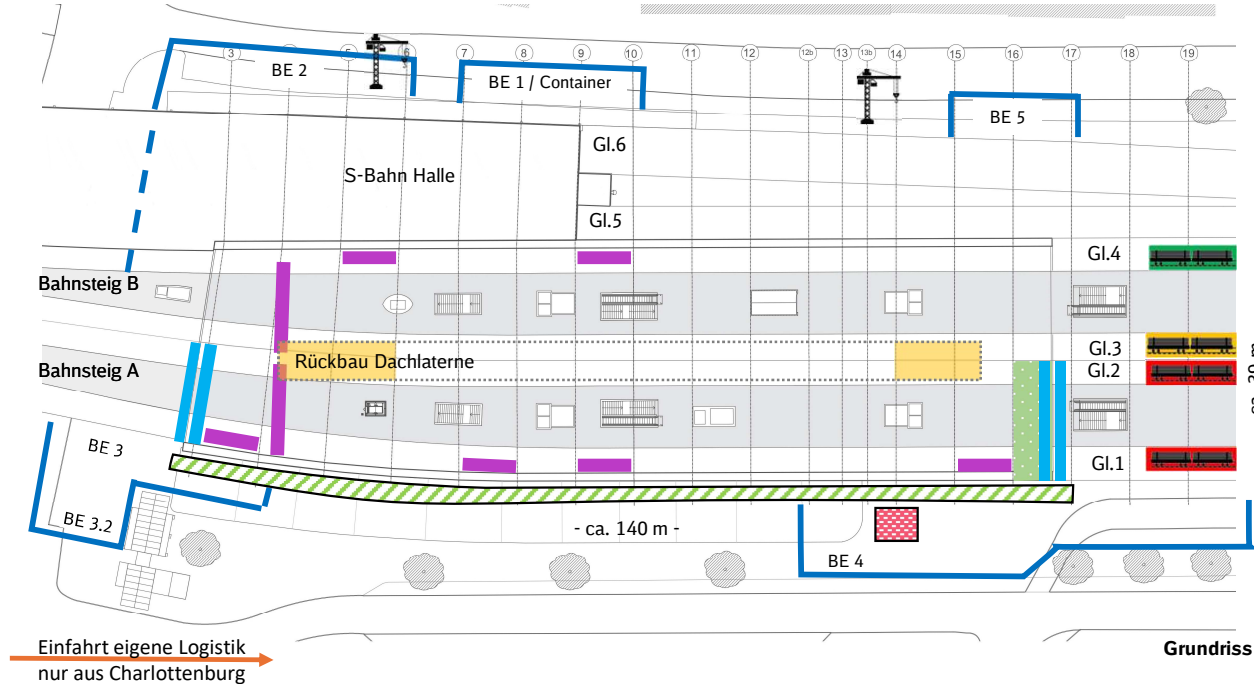

Maßnahmen Schürze/Außen:

- Einrichtung Sicherheit (PT1) Gleis 4 zu 5
- Schutz von Ola und LST
- Konsolen anschweißen & Schutzbleche OLA abnehmen
- entglasen Bahnsteigdach außen
- Gleis 1+2 Aufbau Schürzengerüst auf Konsole Innen und Außen.
- Aufbau restlicher Gerüste im OLA-Sicherheitsbereich (Anschlusspunkte)
- Aufbau Absturzsicherungen Dach
- Rückbau Dachlaterne
- Rückbau restliche Dachhaut
- Rückbau Lüftungskanal Bereich Schürzengerüst Gleis 1
- Sicherung Lautsprecher (Abspannung & Kabel)

Kranbelastung

Ab W1 ist mit einer intensiveren Krannutzung durch Dachlaterne zu rechnen.

Zusätzliche Maßnahmen:

- Dach:
- Rückbau restliche Dachhaut
 - Rückbau Laterne zur Gewichtsreduzierung.
 - Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

- Fassadengerüste aufgebaut
- Kräne sind aufgebaut
- BE-Flächen 3+4 eingerichtet inkl. Gerüsttürm
- Sperrung der Zugänge für Reisende
- BE Umschlagplatz eingerichtet
- Vorbereitete Gerüsttransporte vom Umschlagplatz
- Konsolen
- PT1 Bahnsicherung zu Gleis 5
- Abschaltung OLA
- Rückbau 90% Dachhaut

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Schürzengerüste

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 1+2 Aufbau Baubehelfe

Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene

- Einhausung Fahrtreppen und Schutz Treppenaufgänge
- Belegen Bstg. A + B mit Bautenschutzmatte
- Herausnehmen der Deckenbefahranlage Bstg B
- Rückbau 4 Stk. Fassadenbefahranlagen Gleis 1


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Demontagezeit je Kastenleiter: 5 Stunden

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

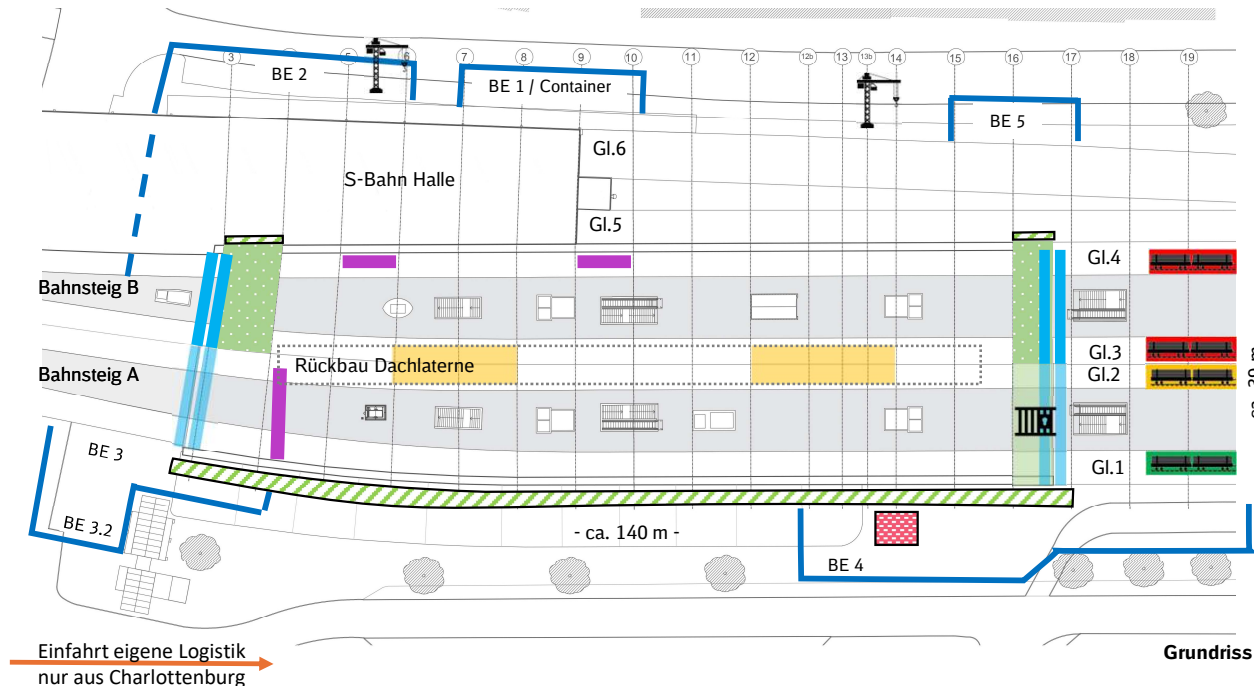

Maßnahmen Schürze/Außen:

- Einrichtung Sicherheit (PT1) Gleis 4 zu 5
- Schutz von Ola und LST-Anlagen
- Konsolen anschweißen & Schutzbleche OLA abnehmen,
- entglasen Bahnsteigdach außen, falls nicht vor SPP stattgefunden
- Gleis 3+4 Aufbau Schürzengerüst auf Konsole Innen und Außen
- Aufbau restlicher Gerüste im OLA-Sicherheitsbereich (Anschlusspunkte)
- Aufbau Absturz Sicherungen Dach
- Rückbau Dachlaterne
- Rückbau restliche Dachhaut

Kranauslastung

Intensiveren Krannutzung durch Dachlaterne zu rechnen. Entglasungsarbeiten Schürze

Zusätzliche Maßnahmen:

- Dach:
- Rückbau restliche Dachhaut
 - Rückbau Laterne zur Gewichtsreduzierung.
 - Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelfe
 - Aufbau Absturz Sicherung/ Dachfang

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

- Deckenbefahranlage Demontiert

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelfe
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene

- Aufbau Absturz Sicherung/ Dachfang in BETRA
- Herausnehmen der Deckenbefahranlage Bstg A
- Untersuchung Gleishallenfußpunkte möglich
- Untersuchung Gleistrogbegehungen möglich etc.
- Gleisentwässerungsinspektion /Reinigung möglich.


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Demontagezeit je Kastenleiter: 5 Stunden

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

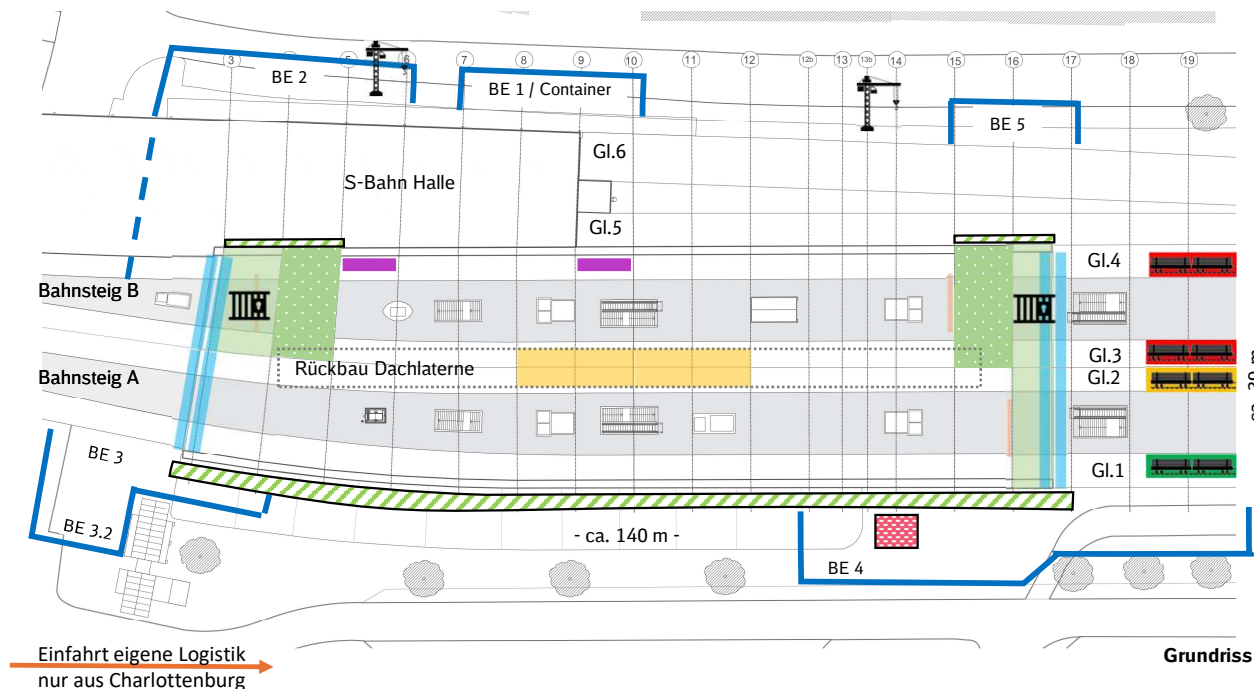

Maßnahmen Schürze/Außen:

- Rückbau Dachlaterne
- Rückbau restliche Dachhaut

Kranerauslastung

Intensiveren Krannutzung durch Dachlaterne zu rechnen. Entglasungsarbeiten und Rahmenleiterentfernung Schürze

Zusätzliche Maßnahmen:

- Dach:
- Rückbau Laterne zur Gewichtsreduzierung.
 - Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Rückbau Dachhaut Randbereich
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelfe
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Keine
 - Rückbau Dachhaut Randbereich
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelfe
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA

Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene

- Untersuchung Gleishallenfußpunkte möglich
- Untersuchung Gleistrogbegehungen möglich etc.
- Gleisentwässerungsinspektion/ Reinigung möglich.

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz: Aufbau Durchschlagschutzebenen gemäß Statik auszuführen.


Sperrpause Fokus Gerüstablauf W 4/26

06.07. – 12.07.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

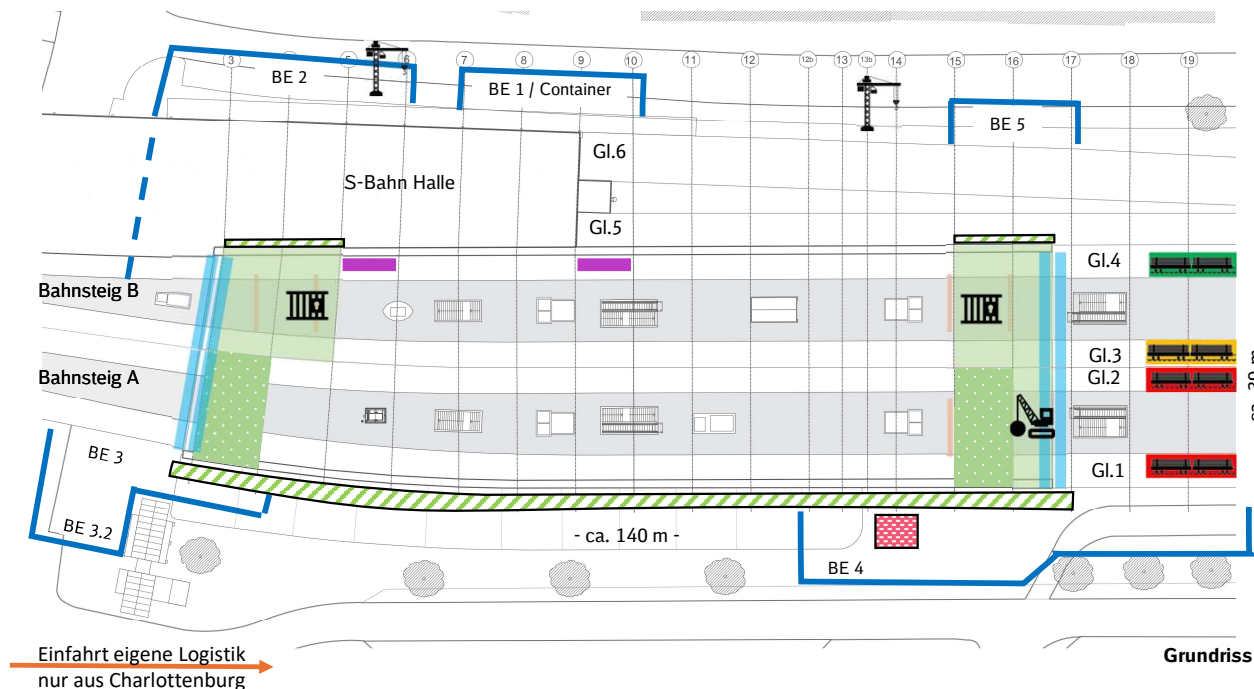

Kranauslastung
Entglasungsarbeiten und
Rahmenleiterentfernung Schürze
Abbrucharbeiten Dach

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelfe
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz

Logistik:

- Sperrung Gleis 1+2**
- Gleis 3 für Logistikzug
 - Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 keine
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelfe

Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene

- Untersuchung Gleishallenfußpunkte möglich
- Rückbau 4 Stk. Fassadenbefahranlagen Gleis 4

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.


Sperrpause Fokus Gerüstablauf W 5/26

13.07. – 19.07.2026

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen

-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

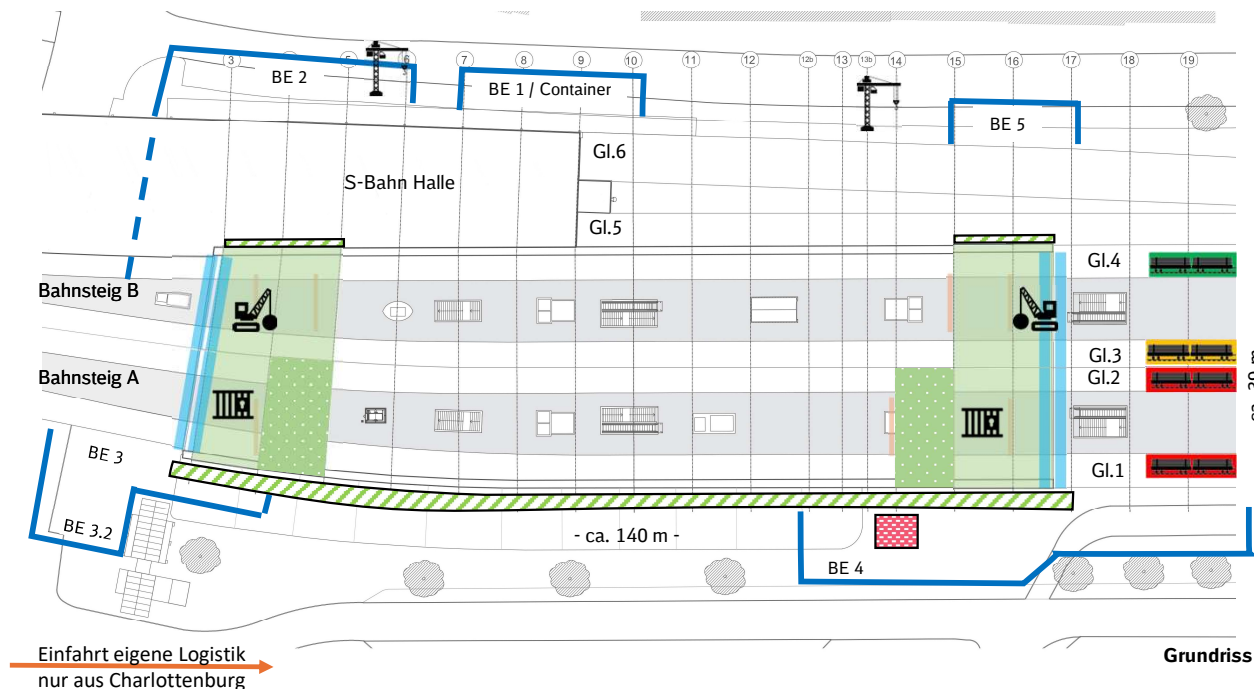

Hinweis Sandstrahlarbeiten

- vor Ausführung ist Fachbereich LST zur Freigabe einzubinden

Kranauslastung

Abbrucharbeiten Dach

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Logistik:

- Sperrung Gleis 1+2**
- Gleis 3 für Logistikzug
 - Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 14-15:
- Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf
- Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene**
- Untersuchung Gleishallenfußpunkte möglich

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.


Sperrpause Fokus Gerüstablauf W 6/26

20.07. – 26.07.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

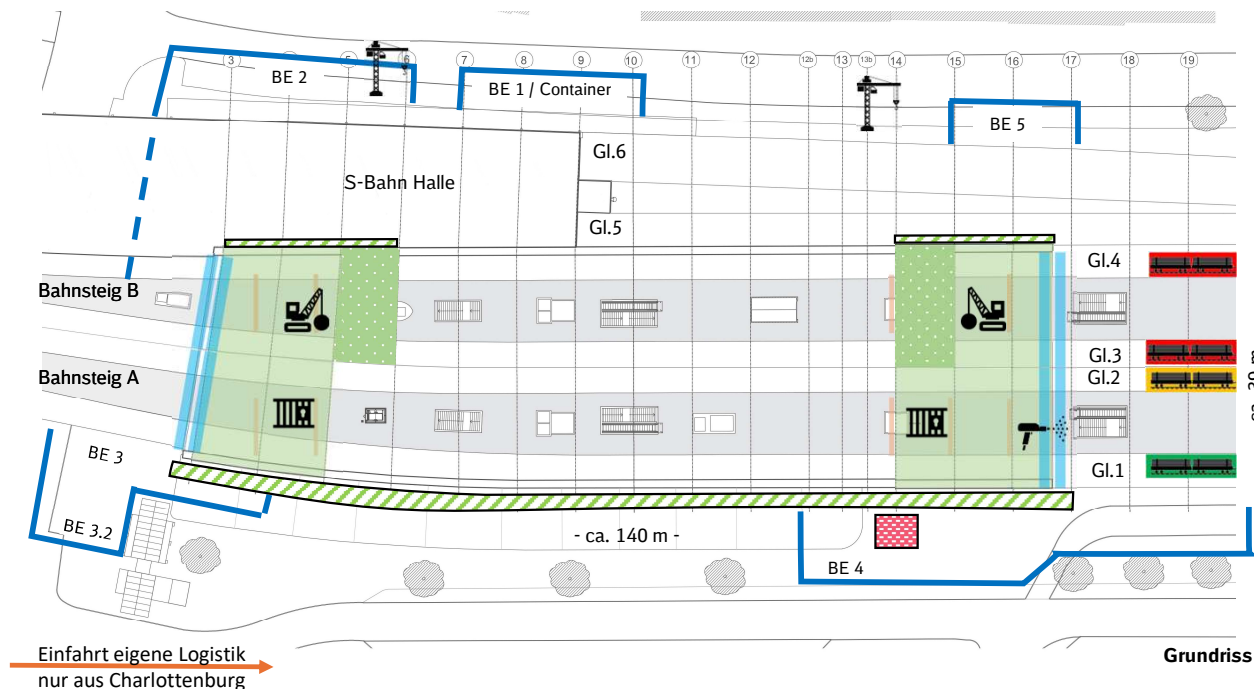

Kranbelastung Abbrucharbeiten Dach

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 5-6
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Sandstrahlarbeiten
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Abbruch
- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA

Maßnahmen in der Halle auf Bstg.-Ebene

- Untersuchung Gleishallenfußpunkte möglich


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

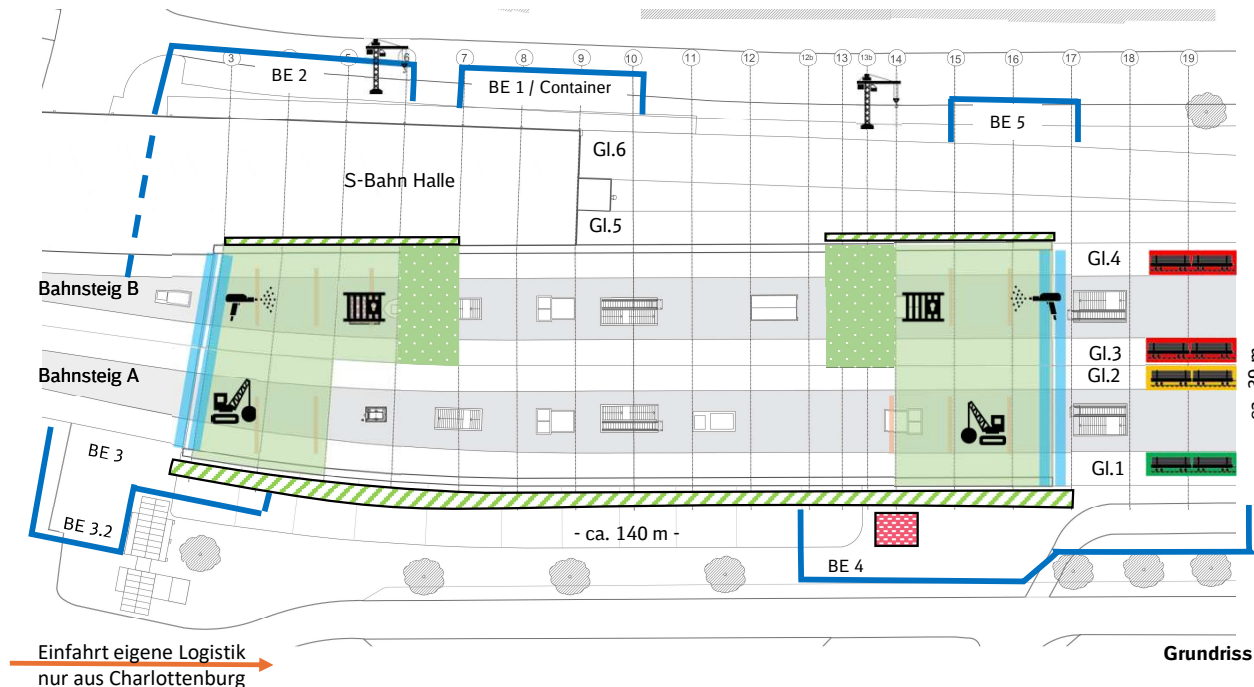

Maßnahmen Lüftersteine

- Begutachtung aller Lüftersteine beginnt
(Dauer: 2 Tage je Binderfeld)

Kranbelastung

Abbrucharbeiten Dach

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Sandstrahl
 - Gleis 1+2 Abbruch
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 keine
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 5-6:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
- Achse 6-7:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 keine
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 keine
 - Gleis 1+2 Abbruch
- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 13-14:
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

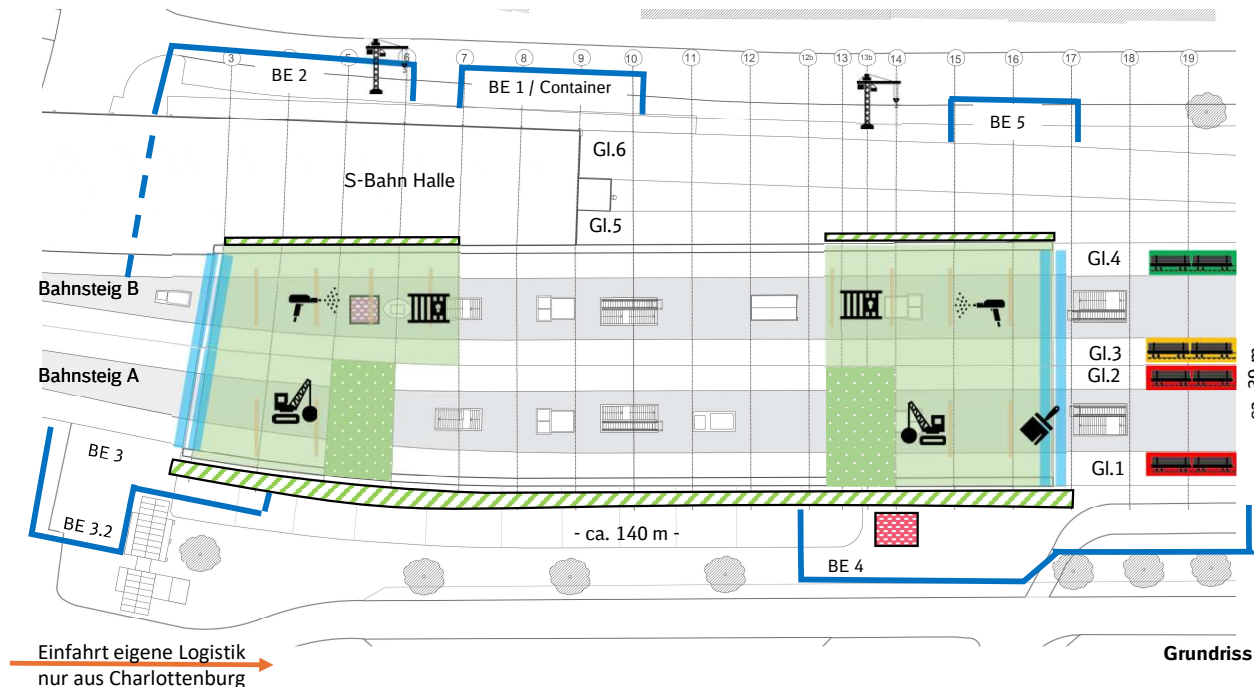

Maßnahmen Schürze/Außen:

- Rückbau und Verschließen Lüftungsschlitze Bereich Schürzengerüst Gleis 1

Kranauslastung

Intensivere Nutzung Einbau neue Schürzenelemente

Abbrucharbeiten Dach

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 keine
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Abbruch
- Achse 5-6:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf
- Achse 6-7:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz

Logistik:

- Sperrung Gleis 1+2**
- Gleis 3 für Logistikzug
 - Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Beschichten
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Abbruch
- Achse 13-14:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.


Sperrpause Fokus Gerüstablauf W 9/26

10.08. – 16.08.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

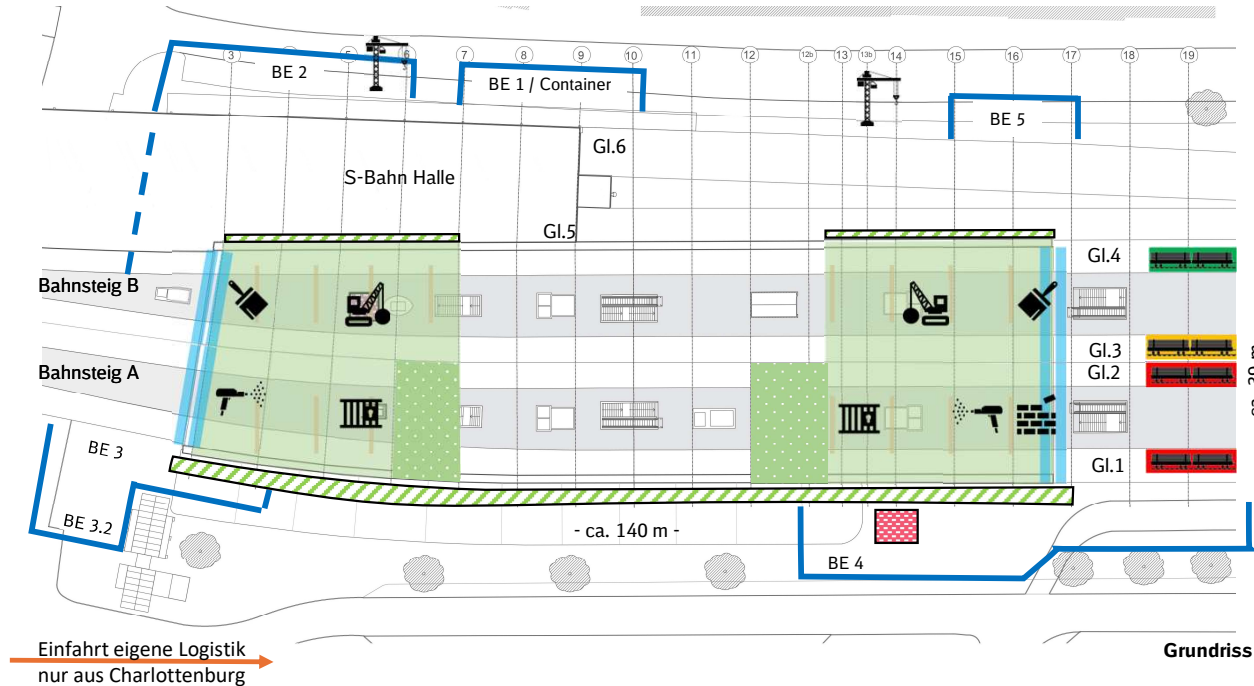

Kranbelastung
Intensivere Nutzung Einbau neue Schürzenelemente

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
 - Gleis 3+4 Beschichten
 - Gleis 1+2 Sandstrahlen
- Achse 4-5:
 - Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 5-6:
 - Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 6-7:
 - Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Logistik:

- Sperrung Gleis 1+2**
 - Gleis 3 für Logistikzug
 - Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
 - Gleis 3+4 Beschichten
 - Gleis 1+2 Auflager Beton
- Achse 15-16:
 - Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Sandstrahlen
- Achse 14-15:
 - Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 13-14:
 - Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 12-13:
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

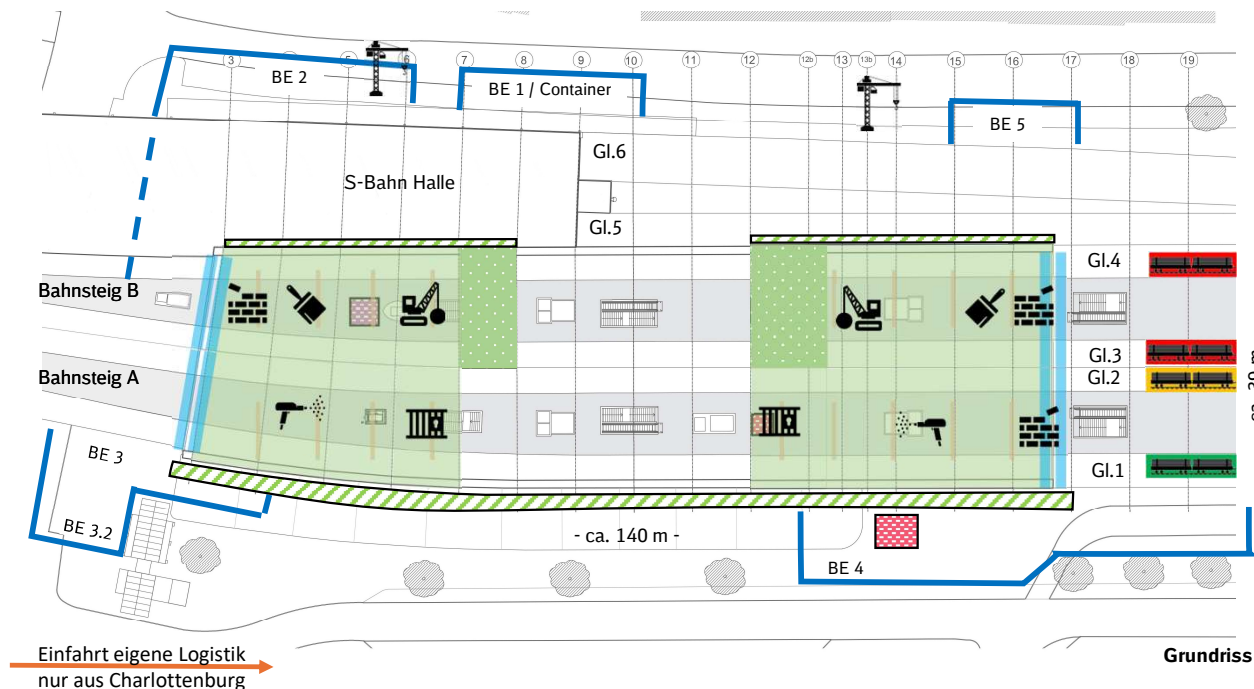

Kranbelastung
Intensivere Nutzung Einbau neue Schürzenelemente

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Beschichter
 - Gleis 1+2 Sandstrahlen
- Achse 5-6:
- Gleis 3+4 keine
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 6-7:
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Achse 7-8
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Auflager Beton
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Beschichtung
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Sandstrahlen
- Achse 13-14
- Gleis 3+4 Abbruch
 - Gleis 1+2 Keine
- Achse 12-13
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Gleis 1+2 Durchschlagschutz
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

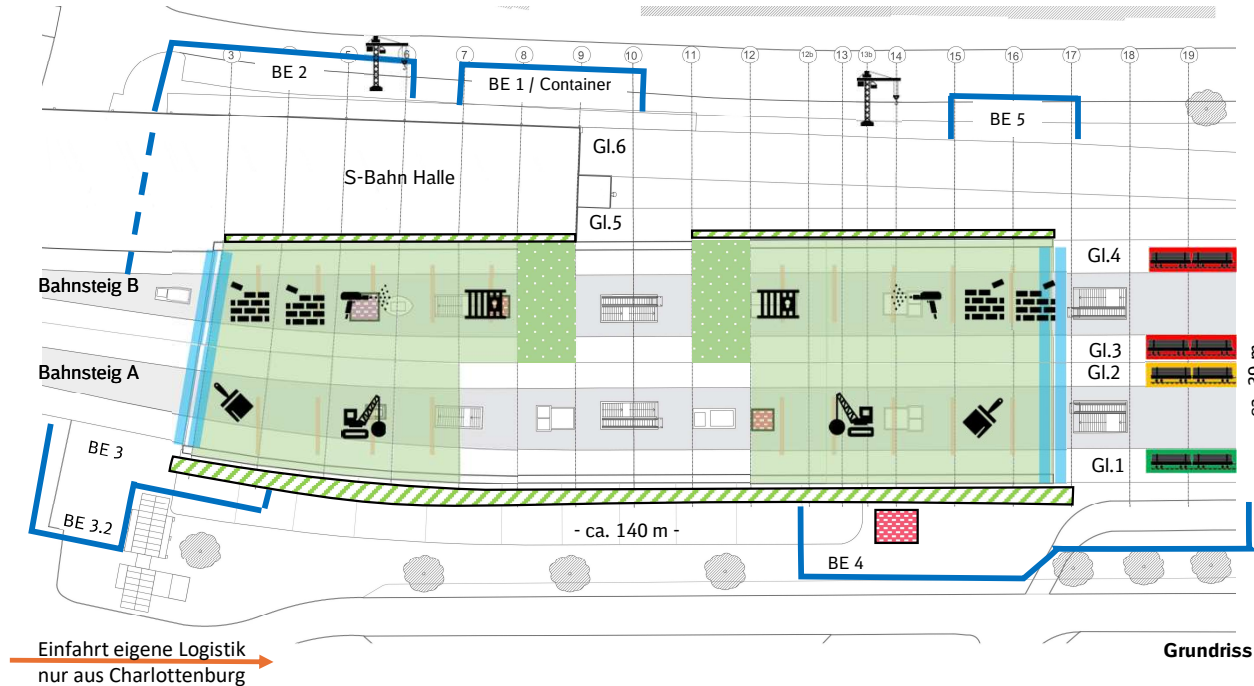

Kranbelastung
Intensivere Nutzung Einbau neue Schürzenelemente

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung

Maßnahmen in der Halle

- Achse 8-9
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Beschichtung

- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 5-6:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Abbruch

- Achse 6-7:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 7-8:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz

Logistik:

- Sperrung Gleis 3+4**
- Gleis 2 für Logistikzug
 - Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Beschichten

- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 13-14:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Abbruch

- Achse 12-13:
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 11-12
- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
 - Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker

- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

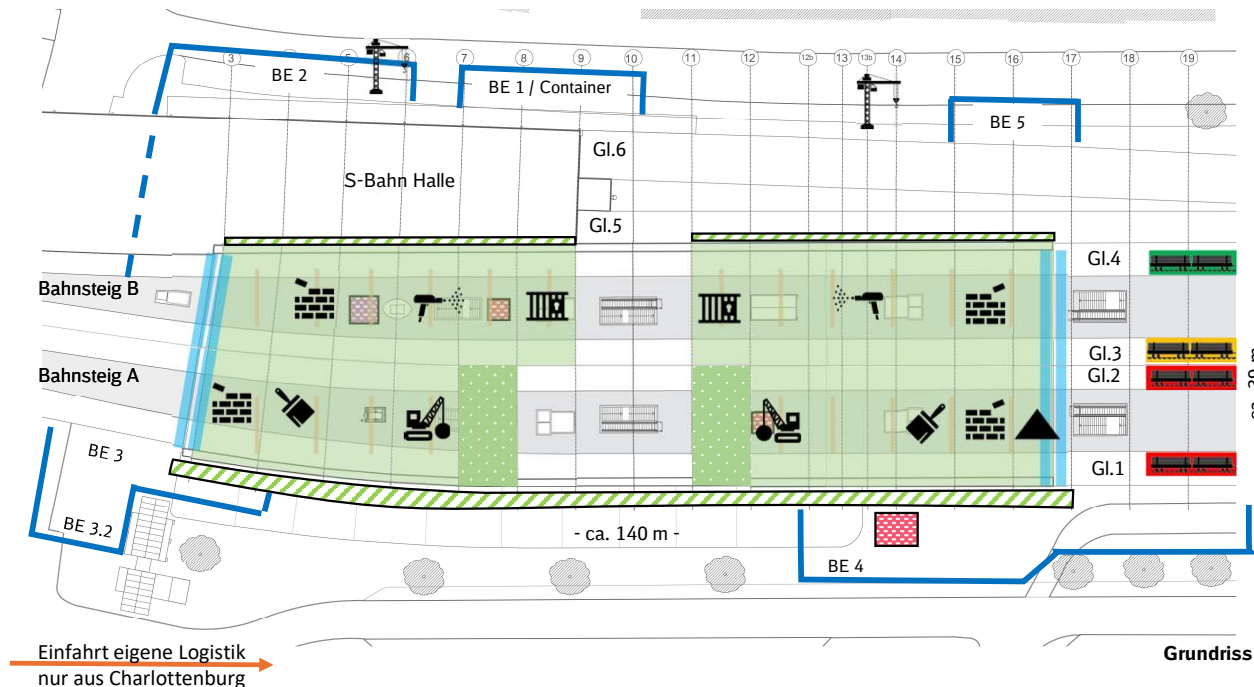

Kranbelastung
Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung
Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

- Achse 8-9
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Auflager Beton

- Achse 4-5:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Beschichtung

- Achse 5-6:
- Gleis 3+4 keine
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 6-7:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Abbruch

- Achse 7-8:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Logistik:

- Sperrung Gleis 1+2**
- Gleis 3 für Logistikzug
 - Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4 Dachdecker
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 15-16:
- Gleis 3+4 Auflager Beton
 - Gleis 1+2 Auflager Beton

- Achse 14-15:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Beschichten

- Achse 13-14:
- Gleis 3+4 Sandstrahlen
 - Gleis 1+2 Keine

- Achse 12-13:
- Gleis 3+4 Keine
 - Gleis 1+2 Abbruch


- Achse 11-12
- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
 - Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

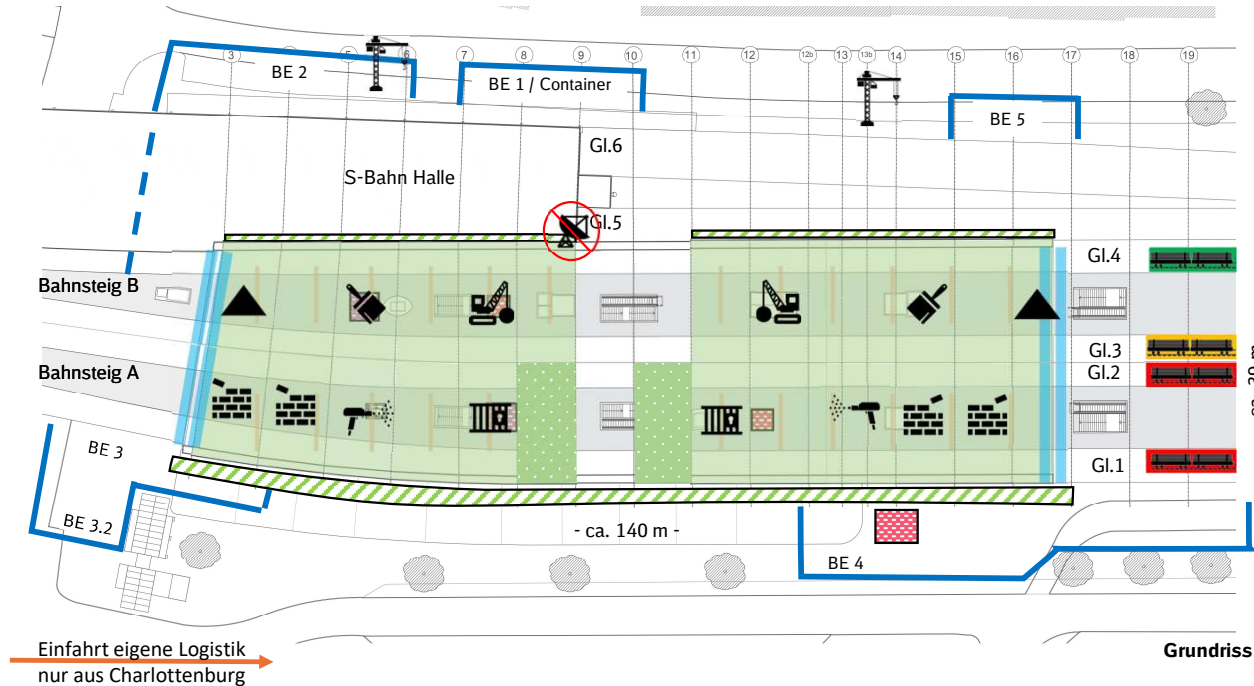

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- beginnender Abriss Dachdecke: während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

Kranauslastung

- Abbrucharbeiten Dach
- Auflager für Schalung
- Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Keine

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 Dachdecker

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 Keine

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11


- Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

- Durchschlagschutz: Aufbau Durchschlagschutzebenen gemäß Statik auszuführen.
- Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

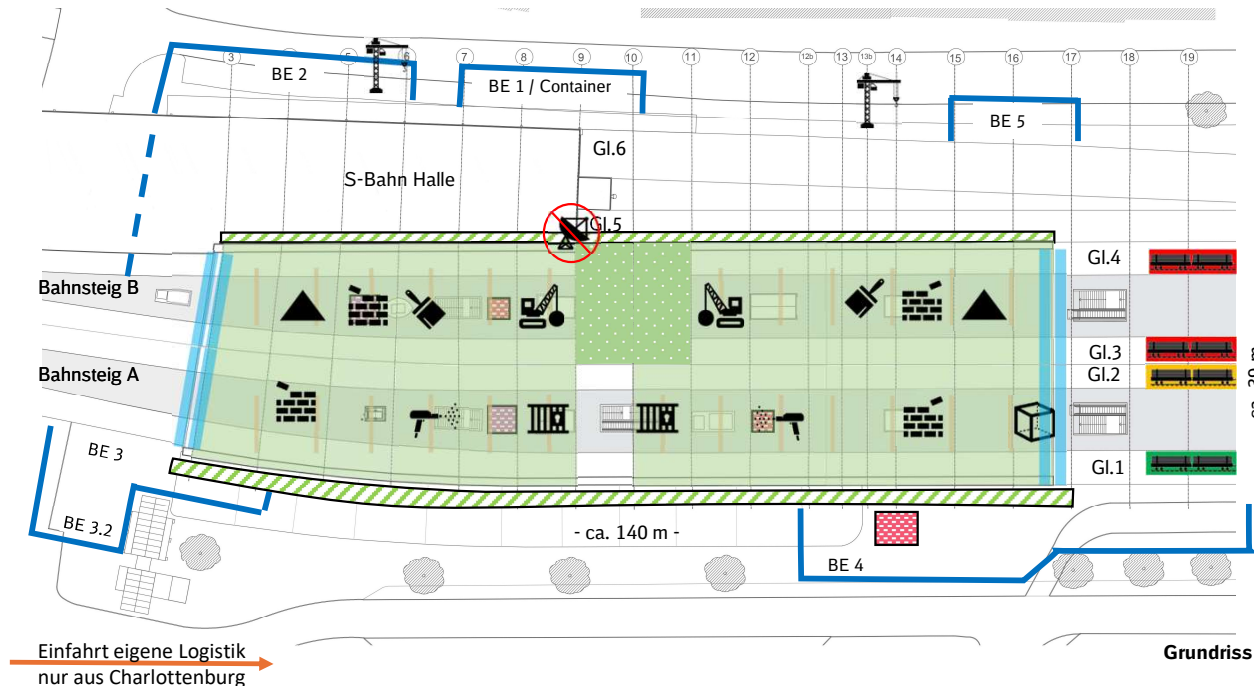

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

Kranauslastung

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung
Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Ache 9-10

- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
- Aufbau Absturzsicherung/ Dachfang

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Beschichter
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Keine

Achse 8-9

- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Keine

Achse 14-15

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Keine

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 Keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11


- Gleis 3+4 Aufbau Baubehelf
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz
- Absturzsicherung/ Dachfang in BETRA

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutzebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

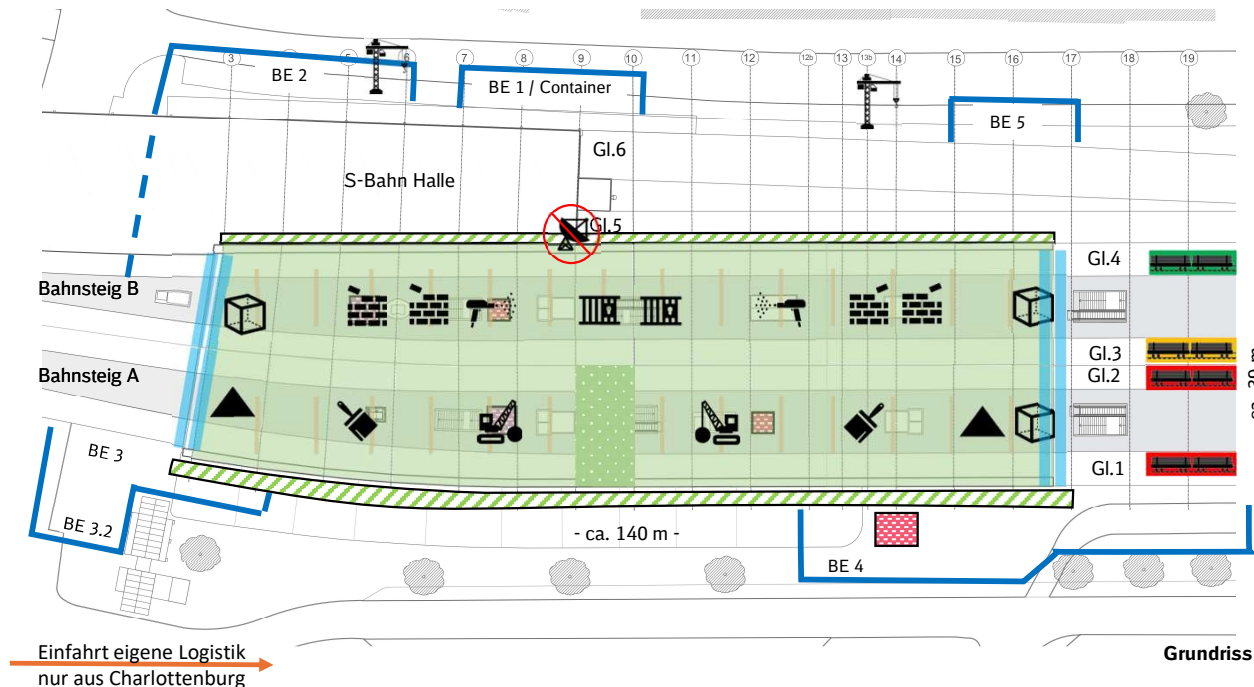

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

Kranauslastung

- Abbrucharbeiten Dach
- Auflager für Schalung
- Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Durchschlagschutz
- Gleis 1+2 Aufbau Baubehelf

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichten

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Keine

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Abbruch

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Keine

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- Gleis 3 für Logistikzug
- Gleis 4 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 15-16:

- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichtung

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Keine

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Abbruch

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtschienen
- Gleis für Bauleistungen
- Gleis gesperrt

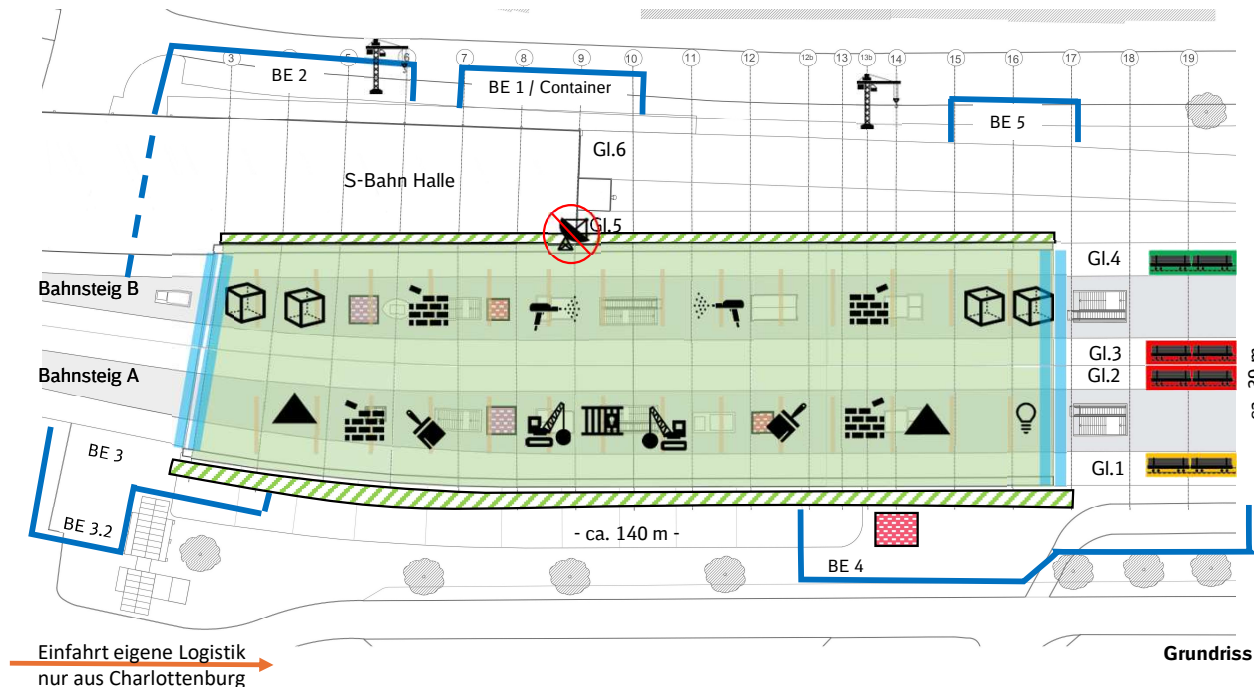

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten nicht in Betrieb.
- vsl. letzte freie Fahrt aus Wustermark, danach erhöhter Koordinierungsaufwand mit Bauprojekt HLK Berlin-Hannover

Maßnahmen Lüftersteine:

- vsl. Ende Begutachtung Lüftersteine
- vsl. Beginn Sanierung Schadstellen

Maßnahmen Bremsrahmen:

- Sperrung Gl. 2+3 für erschütterungsfreie Spritzbetonarbeiten an Bremsrahmen in BA2+3

Kranbelastung

Abbrucharbeiten Dach Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Durchschlagschutz

Zusätzliche Maßnahmen:

- Bauzeitliche Beleuchtung unter dem Abhanggerüst

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichtung

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Keine

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Abbruch

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17

- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal
- Gleis 3+4 Trockenbauer

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Trockenbauer

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Beschichten

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Abbruch

Zeitsätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

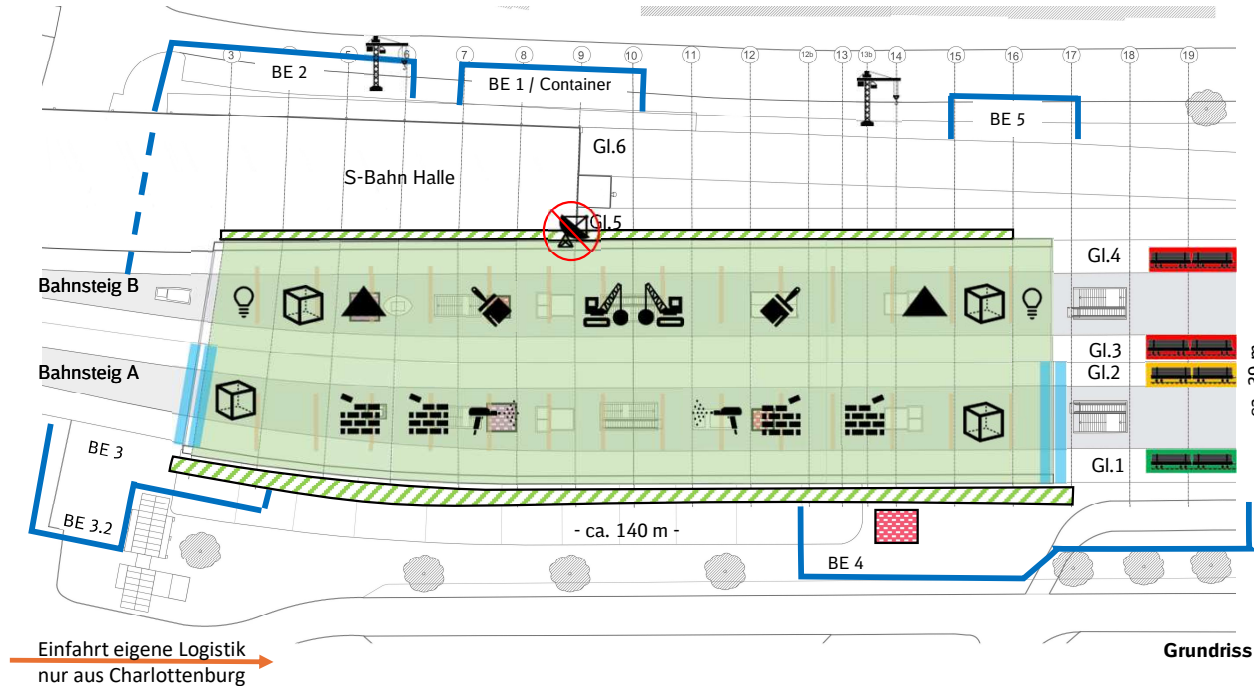

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

Kranauslastung

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung
Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 Keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 keine

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Abbruch
- Gleis 1+2 keine

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-
ebenen gemäß Statik
auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner
eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

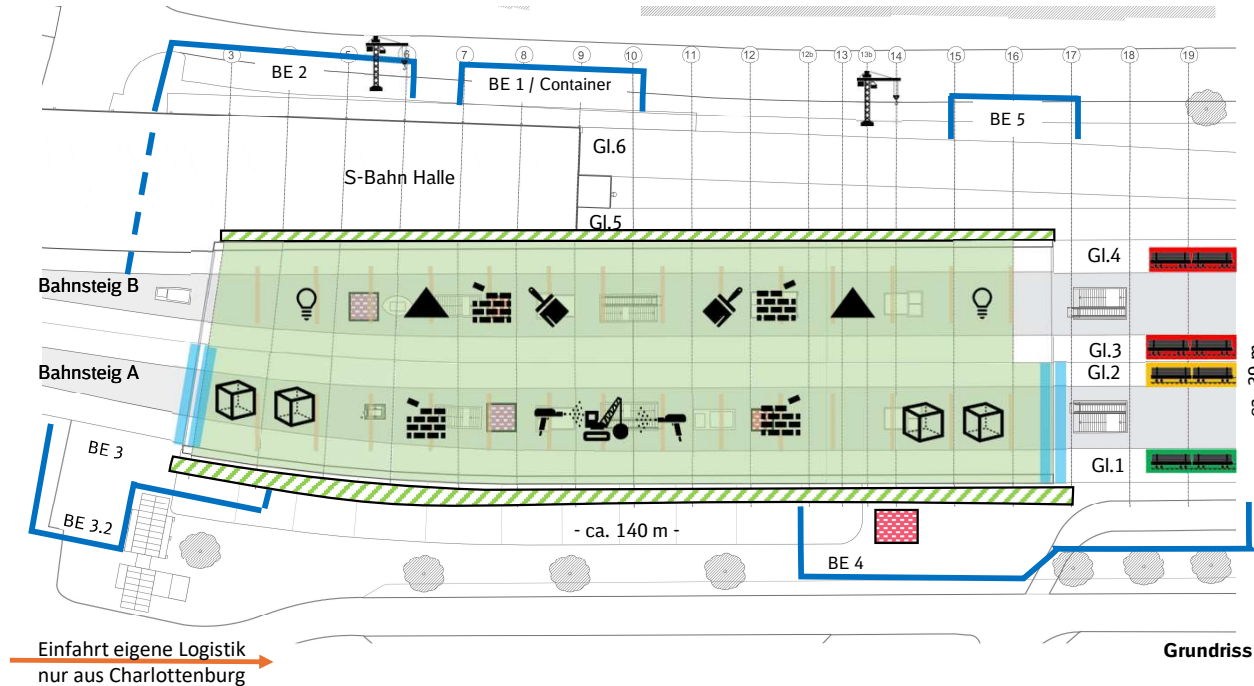

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Bestandsdach:

Ist von Schnee zu räumen, sofern noch vorhanden.

Kranbelastung

Abbrucharbeiten Dach
Auflager für Schalung
Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Abbruch

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Keine

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Beschichtung
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 Keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Keine

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Beschichtung
- Gleis 1+2 Keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Sandstrahlen


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:

Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

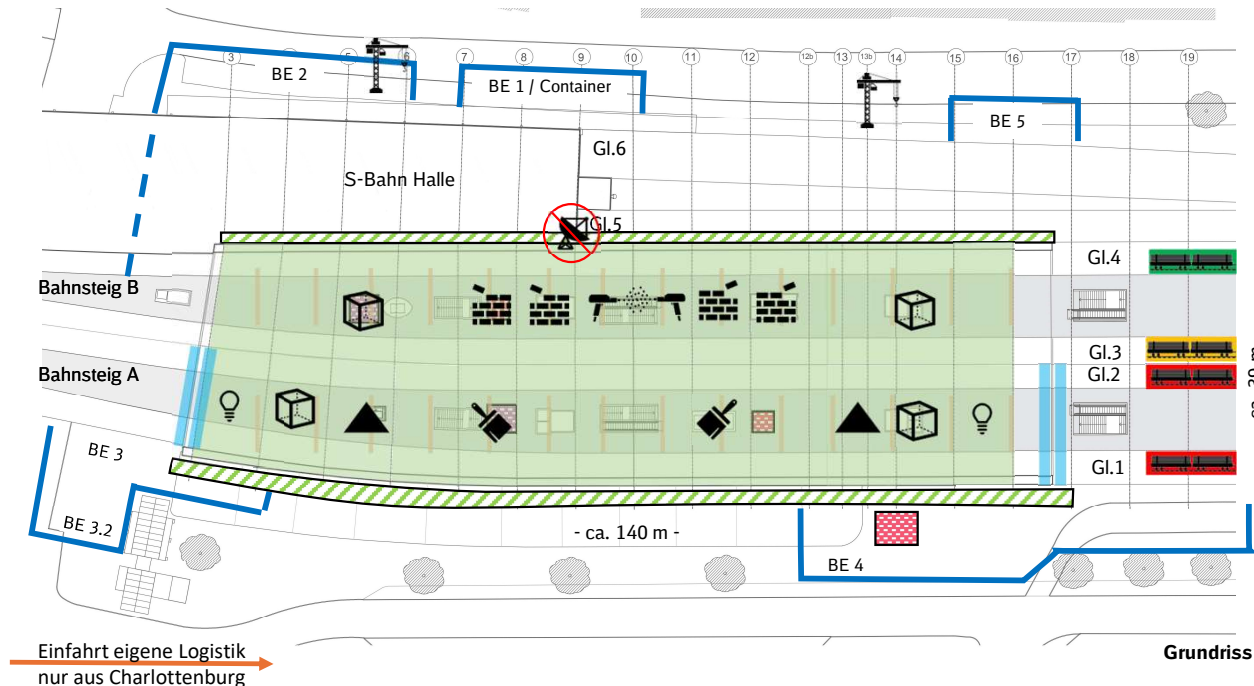

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Bestandsdach:

Ist von Schnee zu räumen, sofern noch vorhanden.

Kranauflastung

Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichten

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 keine

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Rückbau Gerüst

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 keine

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichten

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Sandstrahlen
- Gleis 1+2 Keine

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtschienen
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

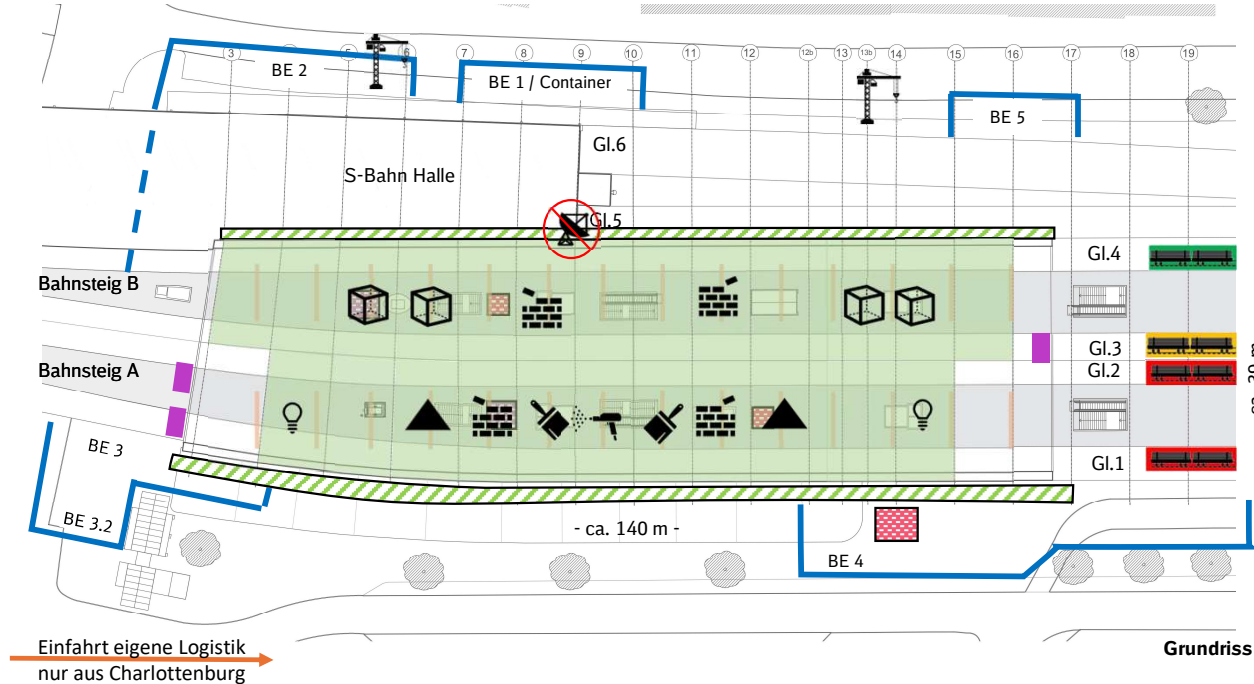

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Bestandsdach:

Ist von Schnee zu räumen, sofern noch vorhanden.

Befahranlagen:

Einhängen Außenbefahranlagen und Innenbefahranlage West.

Kranauslastung

Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Sandstrahlen

Zusätzliche Maßnahmen:

Dach:

- Einbringen von Befahranlagen Schürze

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Rückbau Gerüst

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichten

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Rückbau Gerüst

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Beschichten


Zeitsätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:

Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

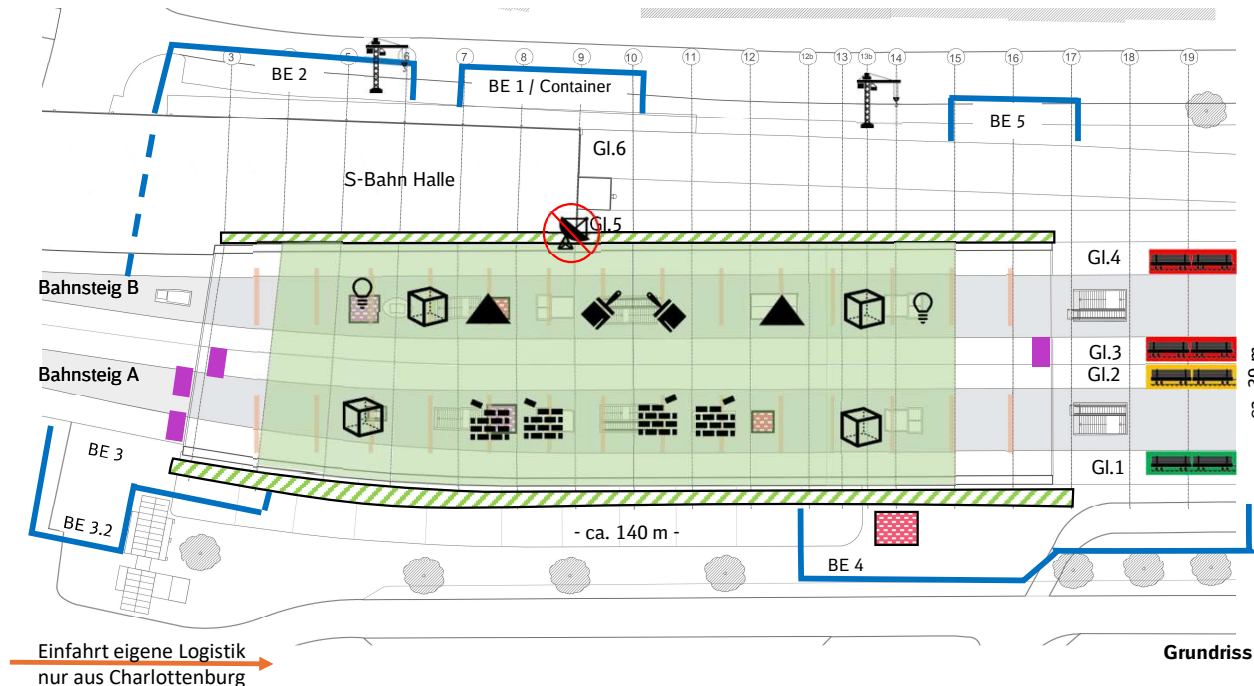

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung
- Abfahren über Gleis 2 Schürzengerüst Gleis 1+2 Ost+West ab 02.11

Befahranlagen:

Einhängen Innengefähranlage Ost.

Kranauslastung

Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Keine

Zusätzliche Maßnahmen:

Dach:

- Einbringung Befahranlagen Schürzen

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 keine

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:

- Gleis 3+4 Beschichten
- Gleis 1+2 Auflager Beton


Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:

Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtschienen
- Gleis für Bauleitung
- Gleis gesperrt

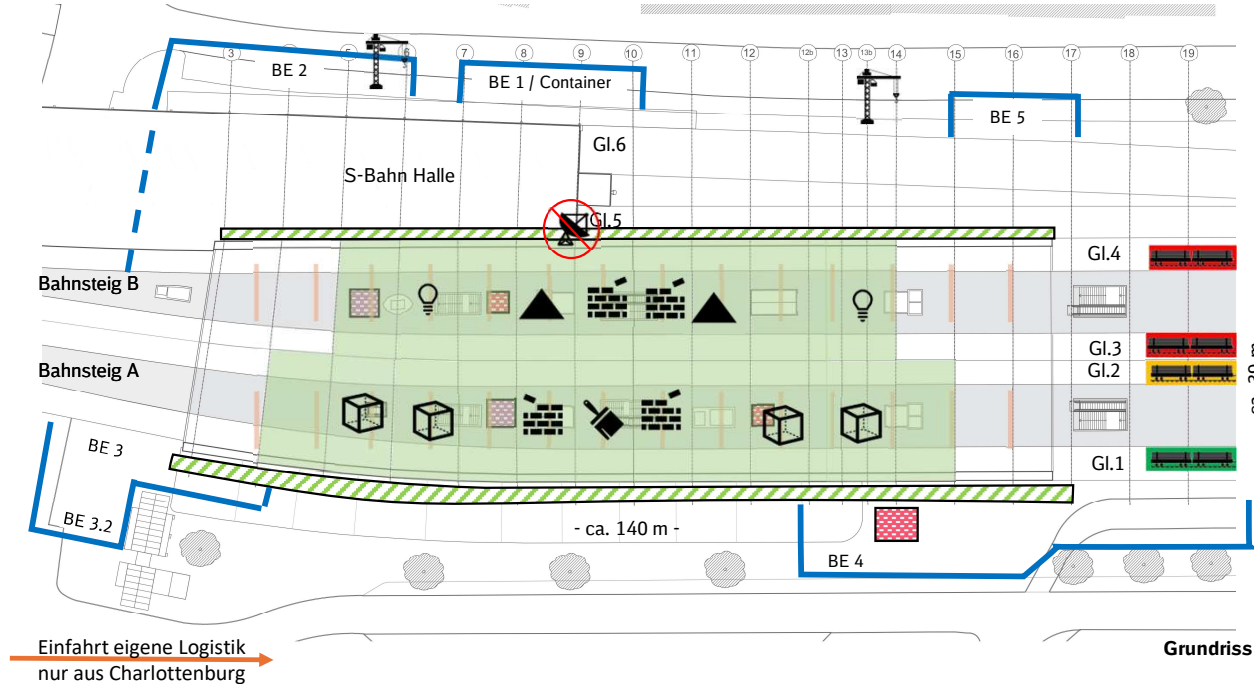

Hinweise:

Kranerauslastung

Ab W22 ist mit einer intensiveren Krannutzung durch Dachlaterne zu rechnen.

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Kranerauslastung

Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Beschichten

Zusätzliche Maßnahmen:

Dach:

- Aufbau Dachlaterne

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Zeitanätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

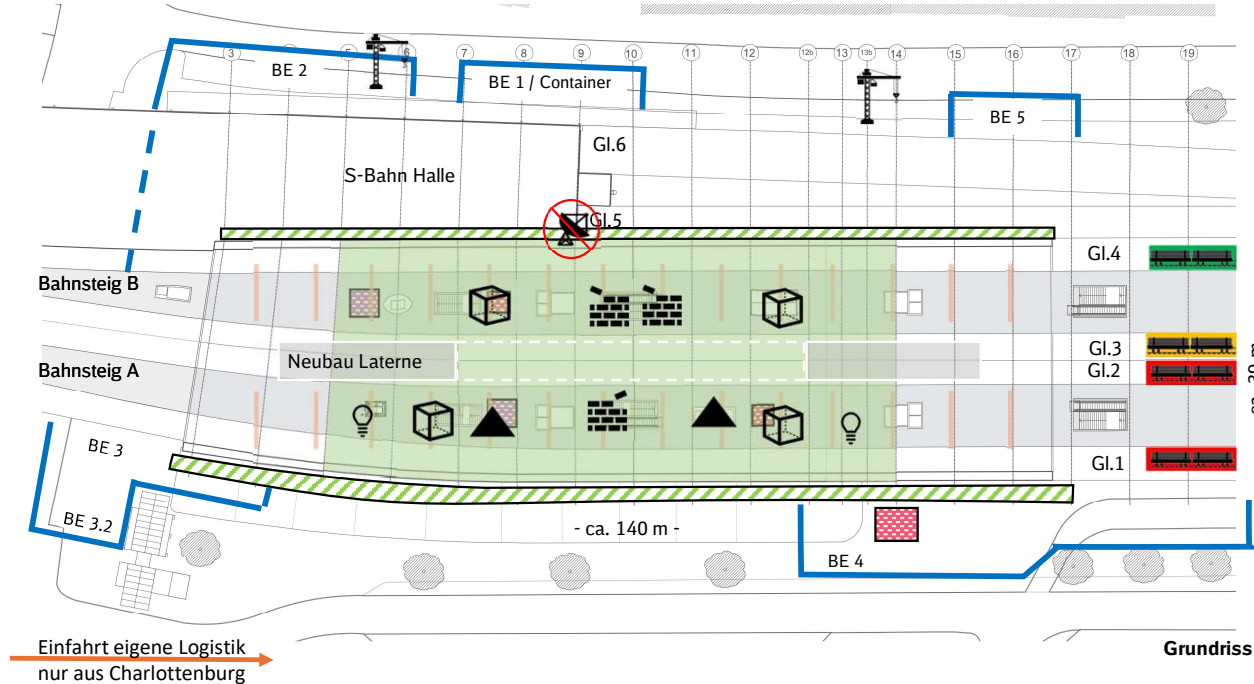

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Kranauslastung

Intensive Nutzung für Dachlaterne Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton

Zusätzliche Maßnahmen:

Dach:

- Aufbau Dachlaterne

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Rückbau Gerüst

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 keine

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtschienen
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

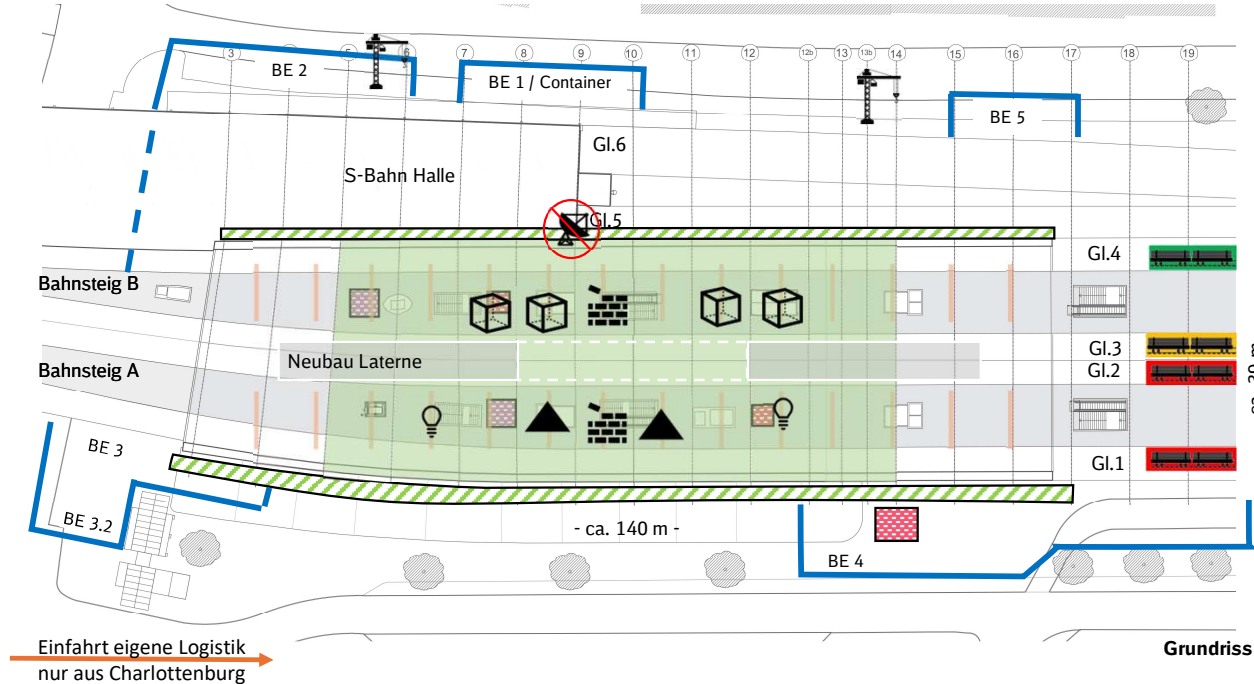

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Kranerauslastung

Intensive Nutzung für Dachlaterne Auflager für Schalung Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Auflager Beton
- Gleis 1+2 Auflager Beton
- Dach: Montage Laterne

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Keine

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Dachdecker

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 Optional Rückbau Gerüst
- Gleis 1+2 keine

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:


- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

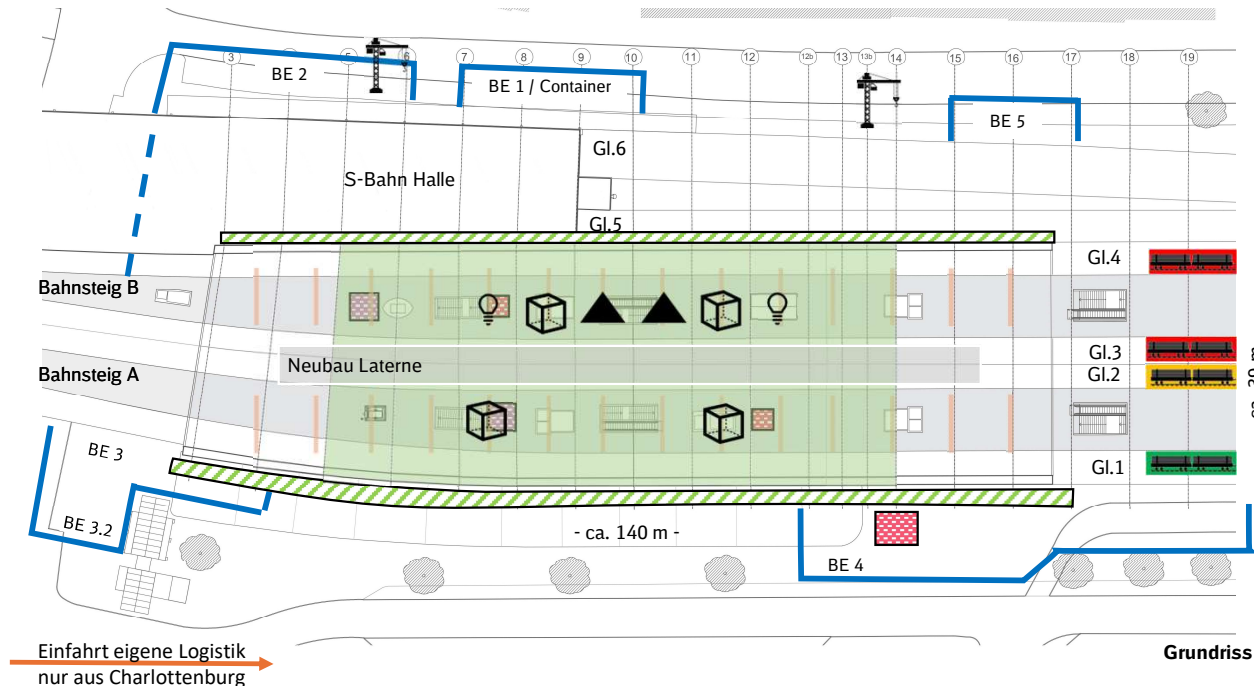

Hinweise:

- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeits-ebenenbelags zu Entrauchungs-zwecken, UK Baubeleuchtung
- OLA & LST: Übergabe und Inbetriebnahme durch ALV

Kranauslastung

Intensive Nutzung für Dachlaterne Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 keine

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Keine

Achse 7-8

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Keine

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Optional Rückbau Gerüst

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 keine

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Trockenbauer
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:

- Gleis 3+4 Dachdecker
- Gleis 1+2 Keine

Rückbau Einhausung Fahr-treppen, Schutzabdeckungen Treppen & Bstg.

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:


Durchschlagschutz:

Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.

Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

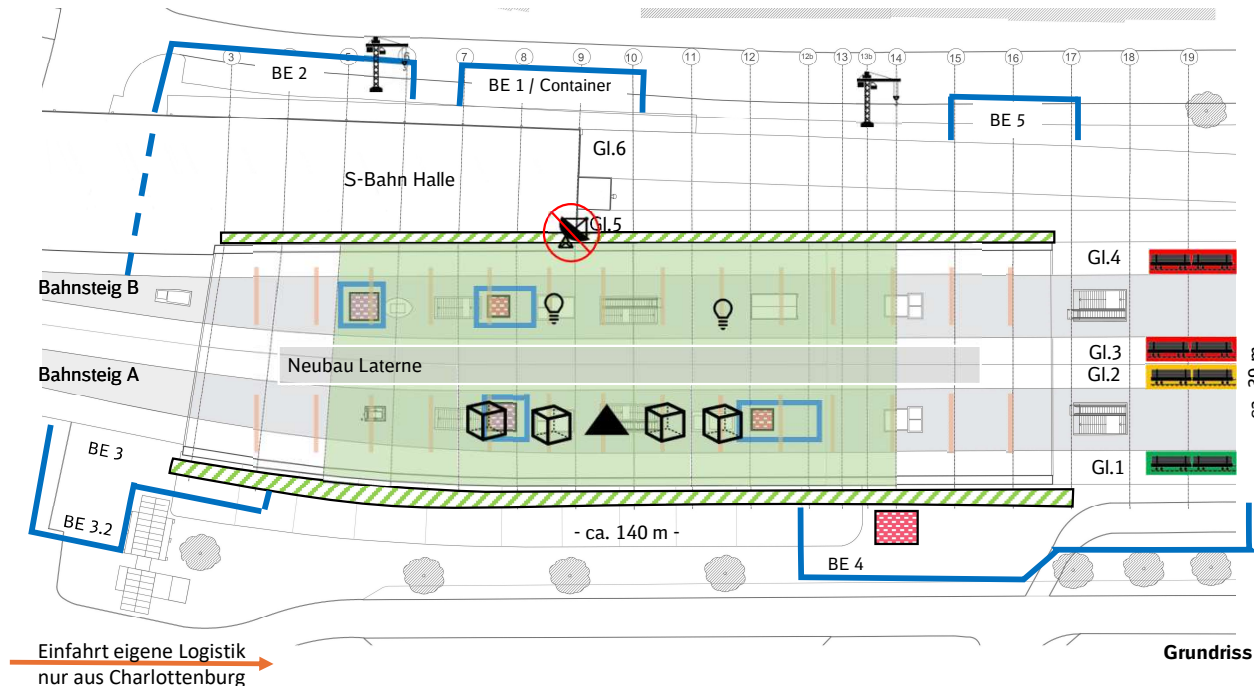

Hinweise:

GSMR

Achse 9:

- Während der Bauarbeiten aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.
- Rückbau Gerüst heißt: Rückbau nur des Arbeitsebenenbelags zu Entrauchungszwecken, UK Baubeleuchtung

Kranerauslastung

Intensive Nutzung für Dachlaterne Dachdeckermaterial

Maßnahmen in der Halle

Achse 9-10:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Dachdecker

Bstg. A + B

- BE auf Bstg.s einrichten

Maßnahmen in der Halle

Achse 3-4:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 4-5:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 5-6:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 6-7:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 7-8:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Achse 8-9:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- Gleis 2 für Logistikzug
- Gleis 1 für Durchfahrten

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

Achse 16-17:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 15-16:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 14-15:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 13-14:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 keine

Achse 12-13:

- Gleis 3+4 keine
- Gleis 1+2 Optional Rückbau Gerüst

Achse 11-12:

- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Maßnahmen in der Halle

Achse 10-11:

- Gleis 3+4 Keine
- Gleis 1+2 Trockenbauer

Zeitansätze für die Maßnahmen in der Halle:

Durchschlagschutz:
Aufbau Durchschlagschutz-ebenen gemäß Statik auszuführen.
Sandstrahlen gemäß Fachplaner eine Achse Abstand zum Abbruch.

Ende der Sperrpause


Regelbetrieb

Fokus Gerüstablauf (Regelbetrieb)

13.12. – 20.12.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

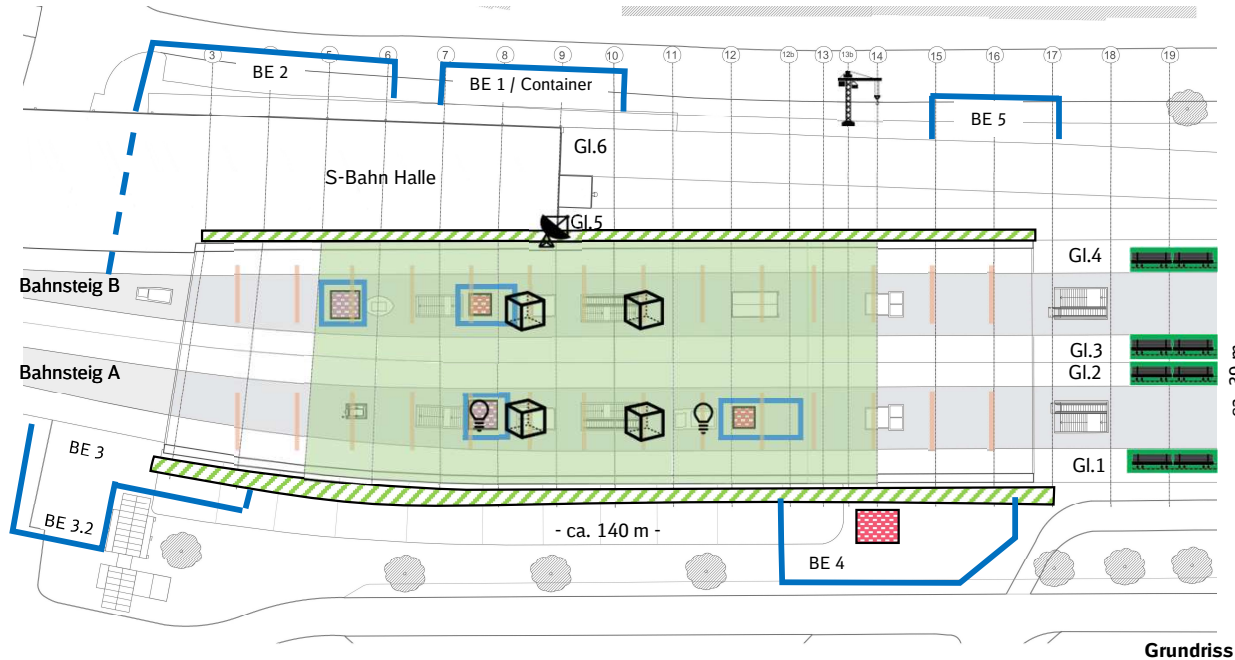

Hinweise:

- Regelbetrieb
- Rückbau TDK 2

Maßnahmen in der Halle

- Achse 9-10
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 4-5:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 5-6:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 6-7:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 7-8
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2 Montage Lichtkanal
- Achse 8-9
- Gleis 3+4 Trockenbauer
 - Gleis 1+2 Trockenbauer

Logistik:

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 15-16:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 14-15:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 13-14
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 12-13
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2
- Achse 11-12
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2 Montage Lichtkanal

Maßnahmen in der Halle

- Achse 10-11
- Gleis 1+2 Trockenbauer
 - Gleis 3+4 Trockenbauer

Fokus Gerüstablauf (Regelbetrieb)

21.12. – 27.12.2026

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt



Hinweise:
- Regelbetrieb

Maßnahmen in der Halle

- Achse 9-10
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 4-5:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 5-6:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 6-7:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 7-8:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 8-9:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

Logistik:

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 15-16:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 14-15:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 13-14:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 12-13:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 11-12:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2


Maßnahmen in der Halle

- Achse 10-11
- Gleis 1+2
 - Gleis 3+4

keine Arbeiten: Weihnachtspause

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

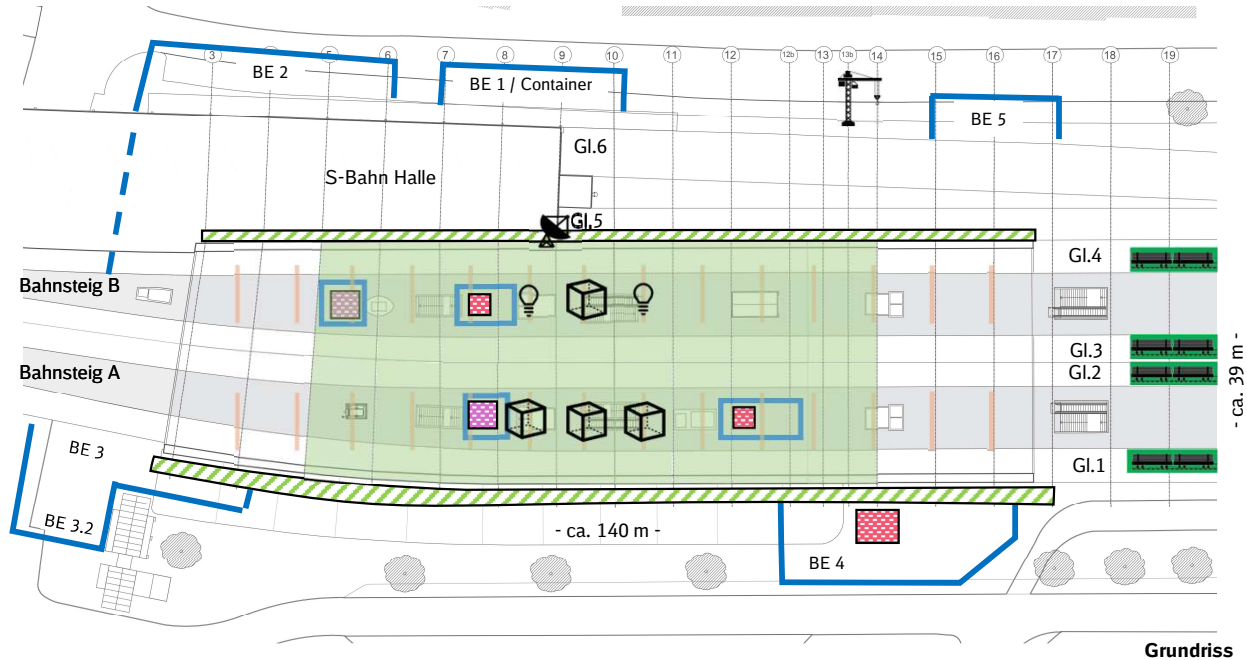

Hinweise:
- Regelbetrieb

Maßnahmen in der Halle

- Achse 9-10
- Gleis 3+4 Trockenbauer
 - Gleis 1+2 Trockenbauer

Bstg. A + B

- BE auf Bstg.s einrichten

Maßnahmen in der Halle

- Achse 3-4
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 4-5:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 5-6:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 6-7:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 7-8
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 8-9
- Gleis 3+4 Montage Lichtkanal
 - Gleis 1+2

Logistik:

Voraussetzungen:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

Maßnahmen in der Halle

- Achse 16-17:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 15-16:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 14-15:
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 13-14
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 12-13
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

- Achse 11-12
- Gleis 3+4
 - Gleis 1+2

Maßnahmen in der Halle

- Achse 10-11
- Gleis 1+2
 - Gleis 3+4 Montage Lichtkanal


Jahreswechsel

2026 – 2027

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

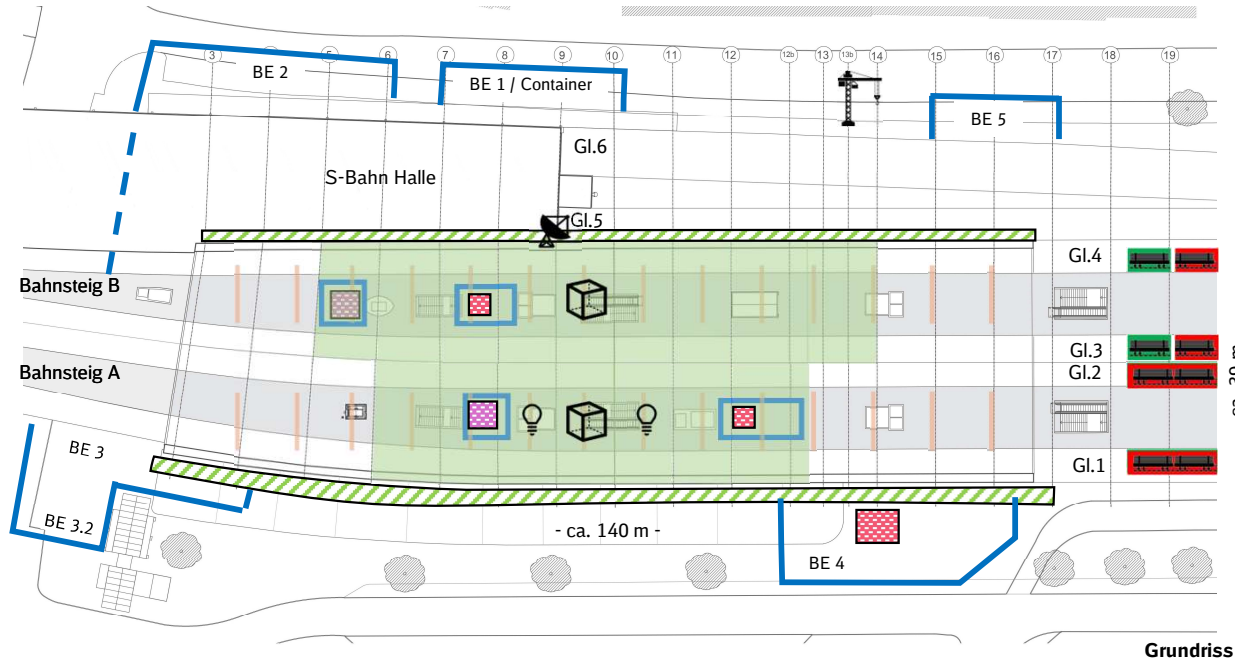

Hinweise:

- Regelbetrieb

Maßnahmen Lüftersteine

- Beginn ggf. notwendiger Ausbesserungsmaßnahmen
- Arbeitsplattform unterhalb Lüftersteinen erf.

SpWo

KW 1, 4 oder 6, 9; 2027
Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Restarbeiten Unterdecke (Trockenbau) (ggf. wg. Weihnachten / Jahres-wechsel verzögert)
- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. A
- Rückbau TDK 1

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 jeweils von 1:00 – 3:00

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung(en) möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

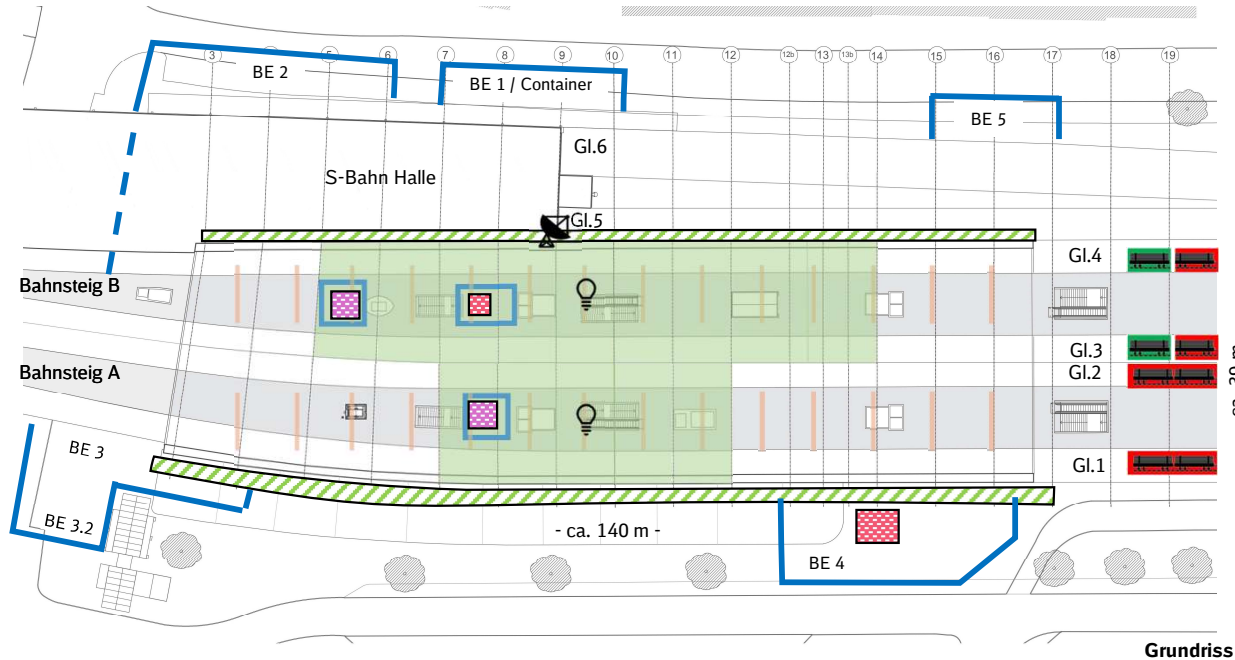

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 1, 4 oder 6, 9; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Restarbeiten Unterdecke (Trockenbau) (ggf. wg. Weihnachten / Jahres-wechsel verzögert)
- Rückbau der Bodenplatten und Aufzugsturm der Arbeitsebene über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 jeweils von 1:00 – 3:00

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung(en) möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

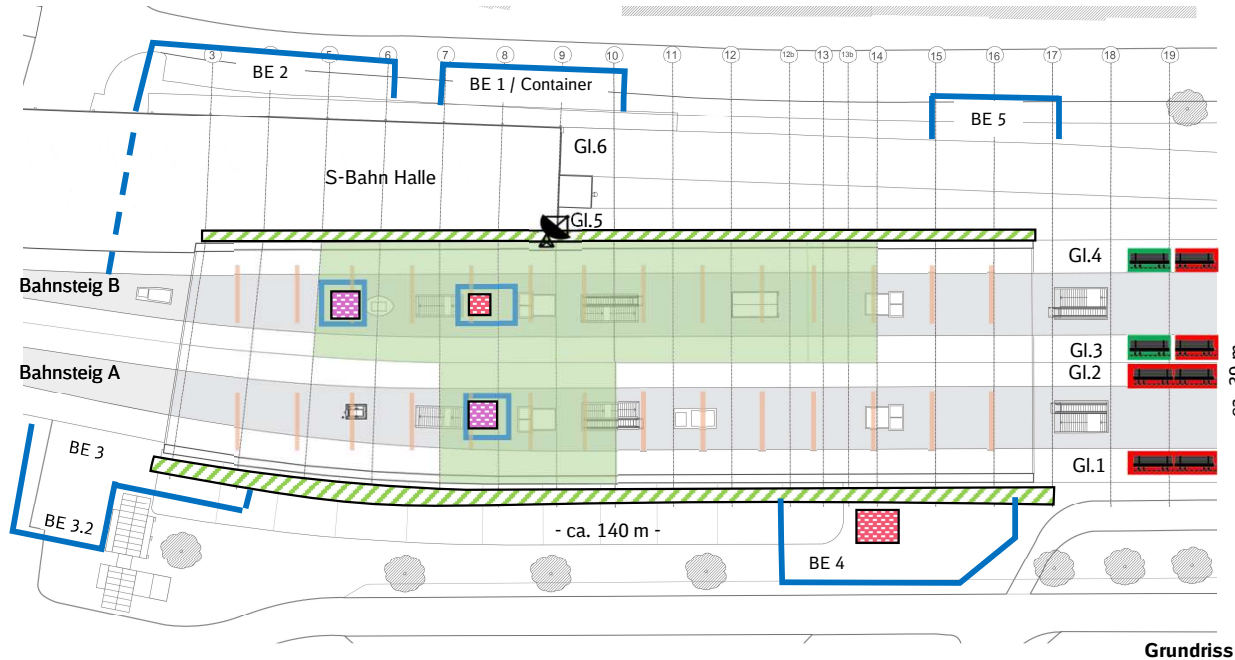

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 1, 4 oder 6, 9; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 jeweils von 1:00 – 3:00

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung(en) möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

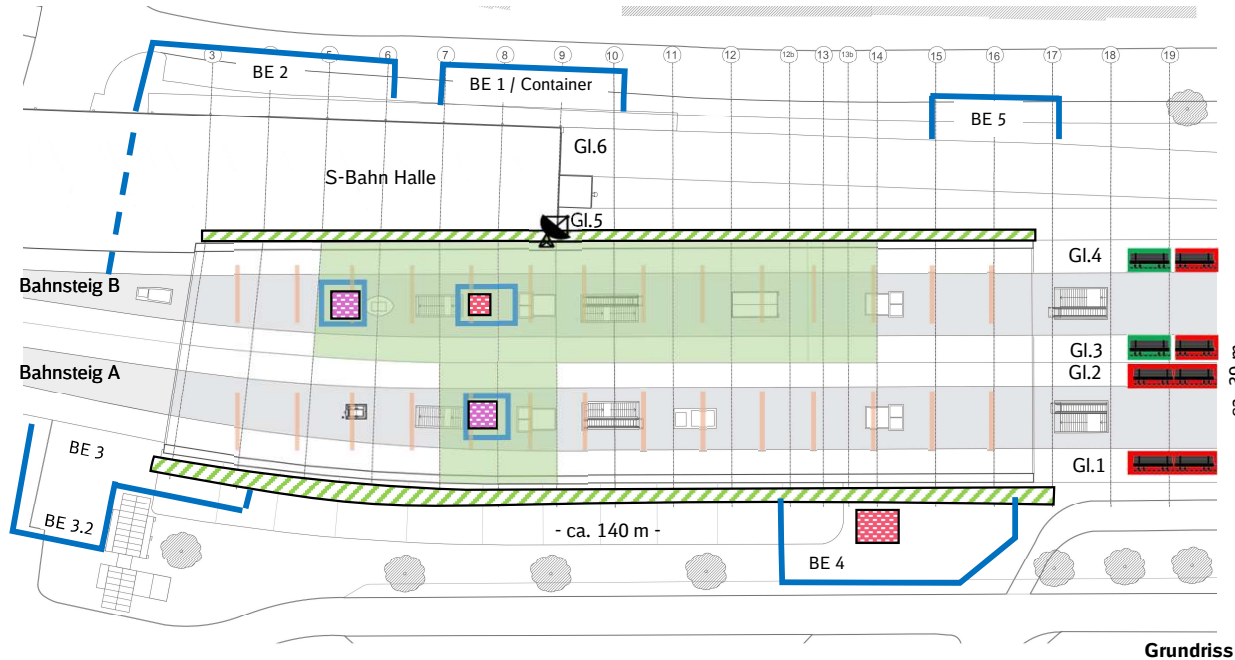

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 1, 4 oder 6, 9; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 jeweils von 1:00 – 3:00

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung(en) möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

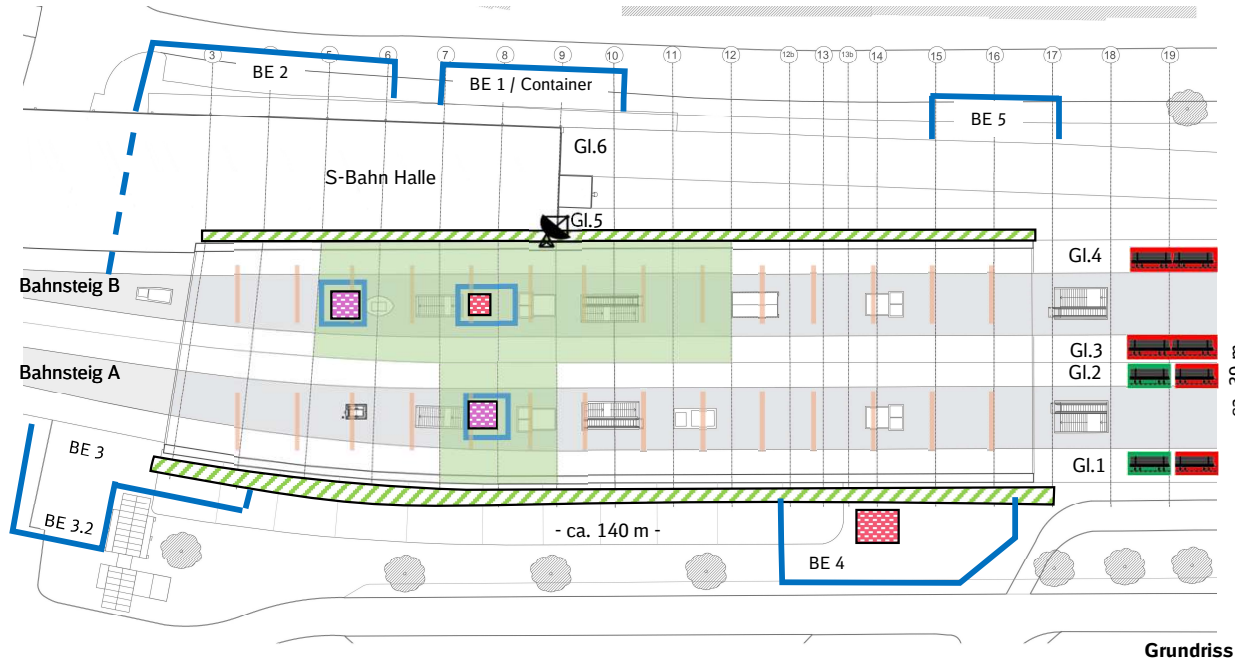

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 13, 17, 20; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtsgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

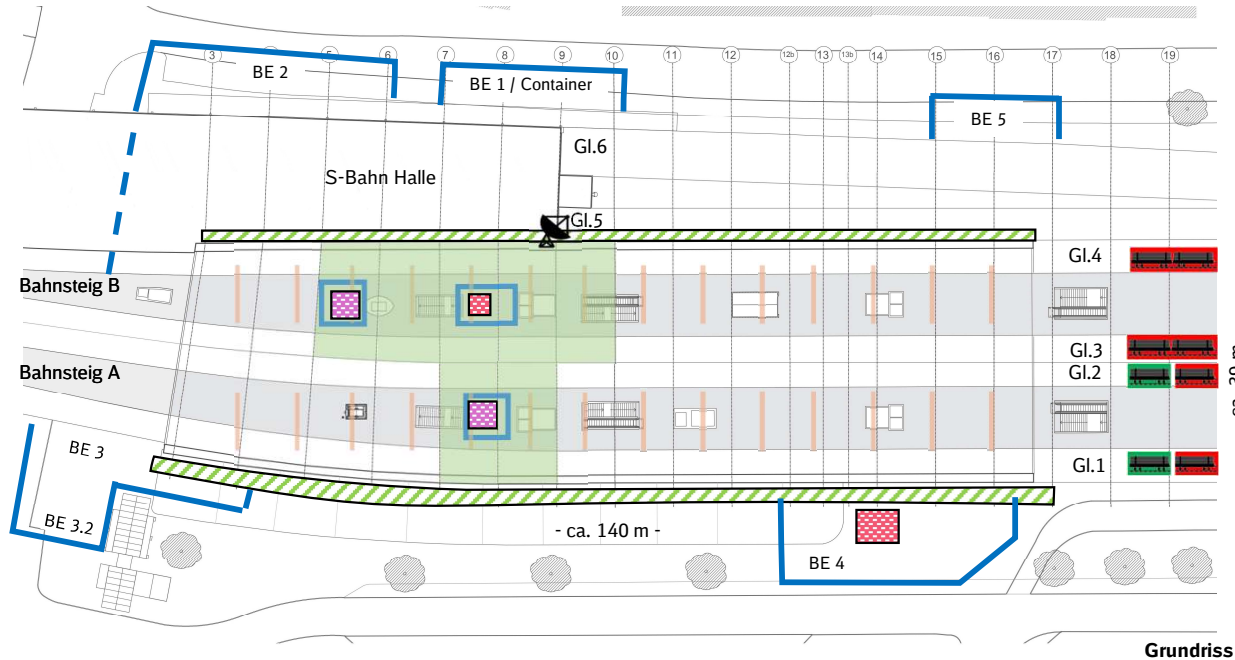

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 13, 17, 20; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

AUSNAHME KW 21

- Gleissperrung 3+4, 1:40 – 3:40
- keine Totalsperrung


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

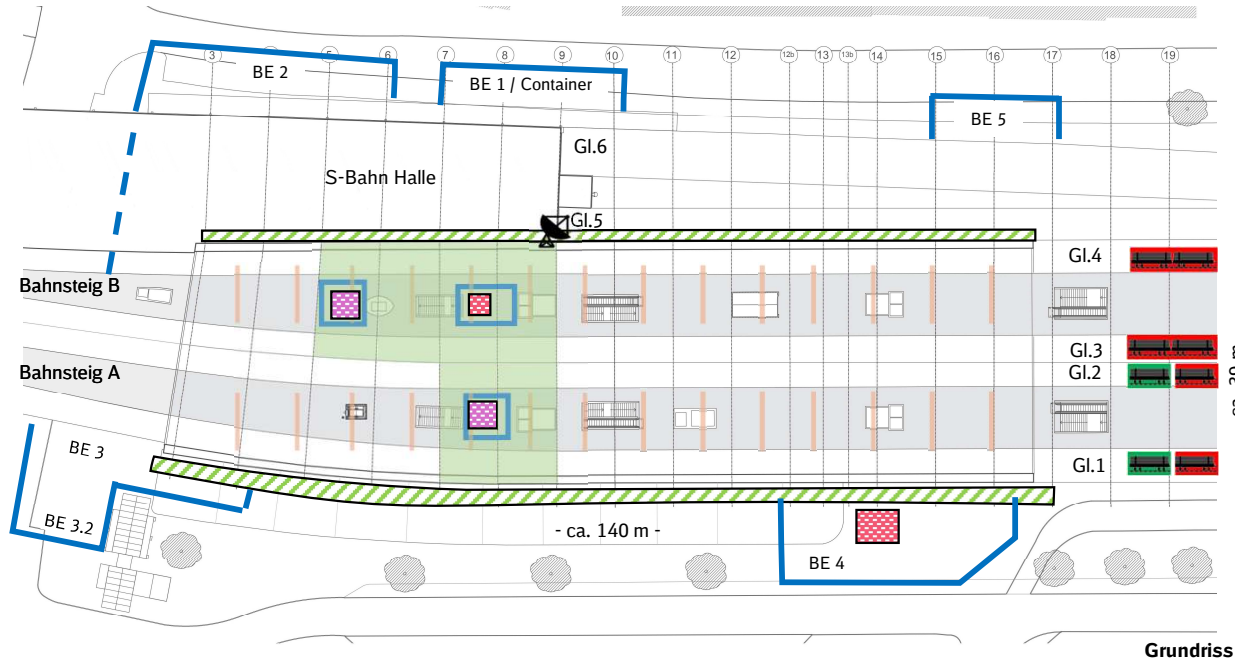

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 13, 17, 20; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten der Arbeitsebene über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

AUSNAHME KW 21

- Gleissperrung 3+4, 1:40 – 3:40
- keine Totalsperrung


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

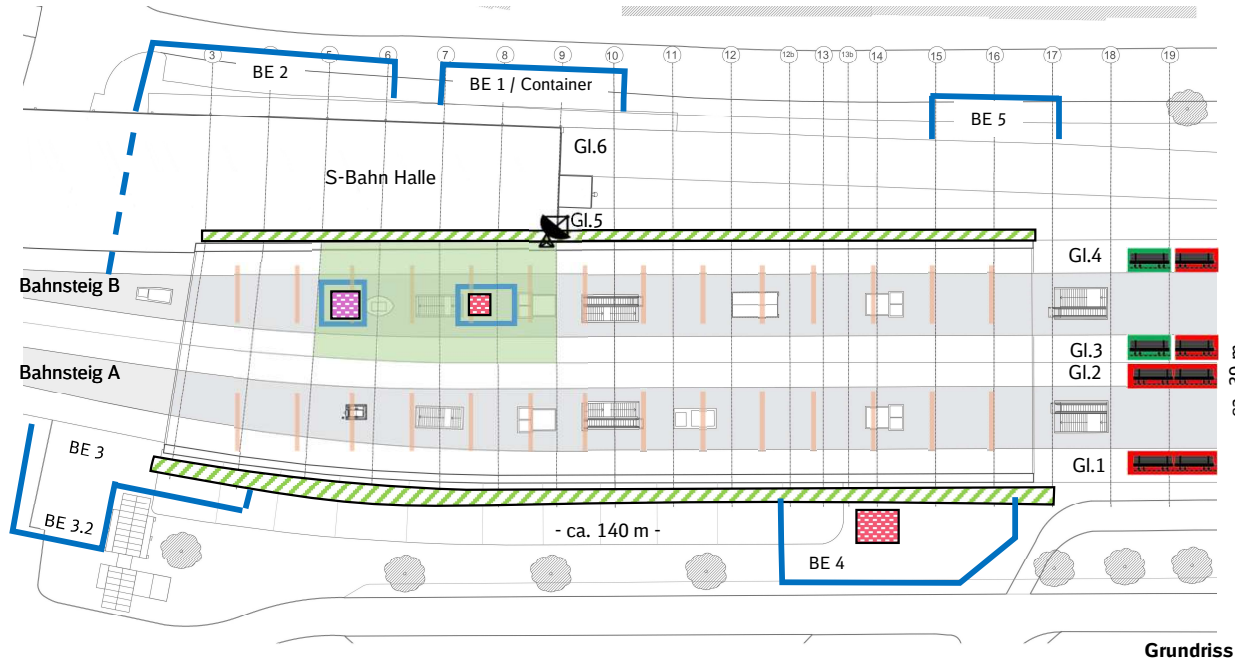

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 25, 33, 37; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten und Treppenturm der Arbeitsebene über Bstg. A

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

AUSNAHME KW 25, 33

- Gleissperrung 1+2, 1:40–3:40
- keine Totalsperrung


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

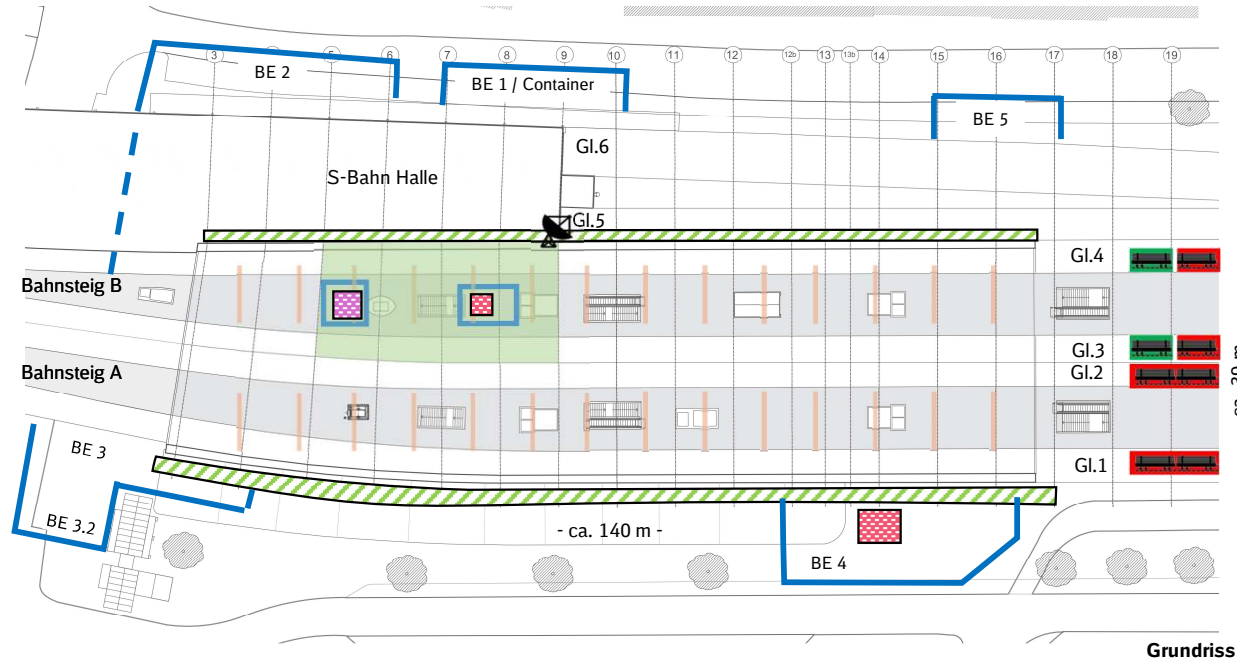

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 25, 33, 37; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

AUSNAHME KW 25, 33

- Gleissperrung 1+2, 1:40–3:40
- keine Totalsperrung


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

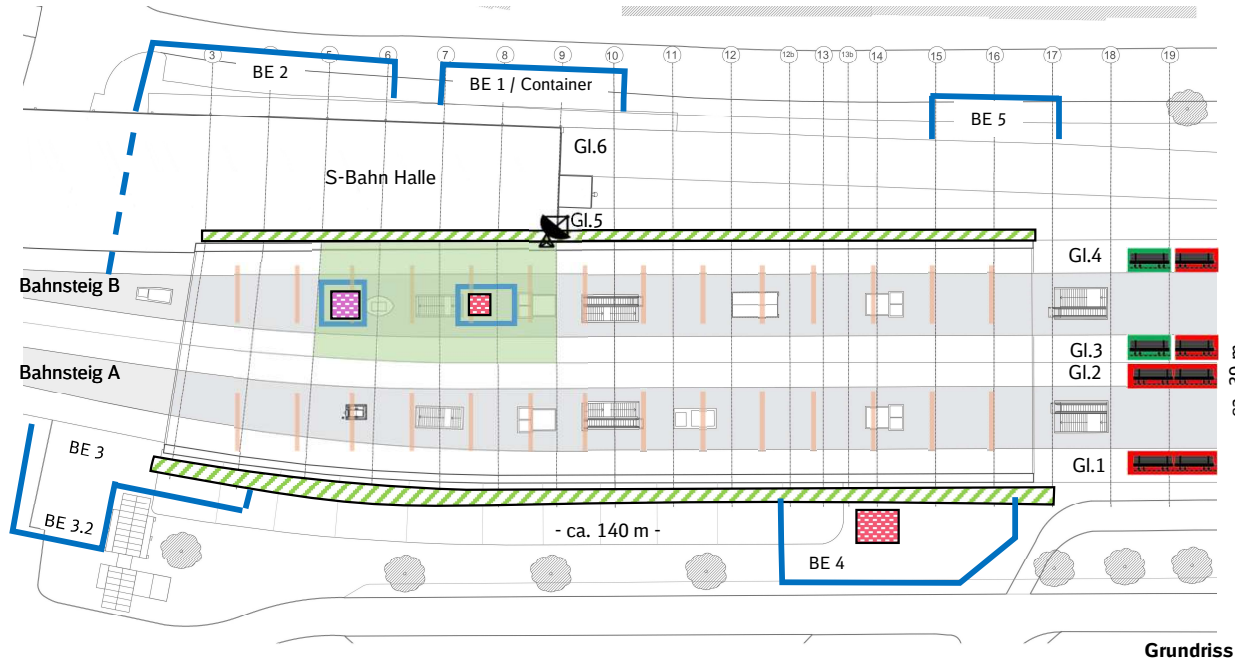

Hinweise:

- Regelbetrieb

Maßnahmen Lüftersteine

- Fertigstellung ggf. notwendiger Ausbesserungen Lüftersteine

SpWo

KW 25, 33, 37; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

Logistik:

Sperrung Gleis 1+2

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

AUSNAHME KW 25, 33

- Gleissperrung 1+2, 1:40–3:40
- keine Totalsperrung


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

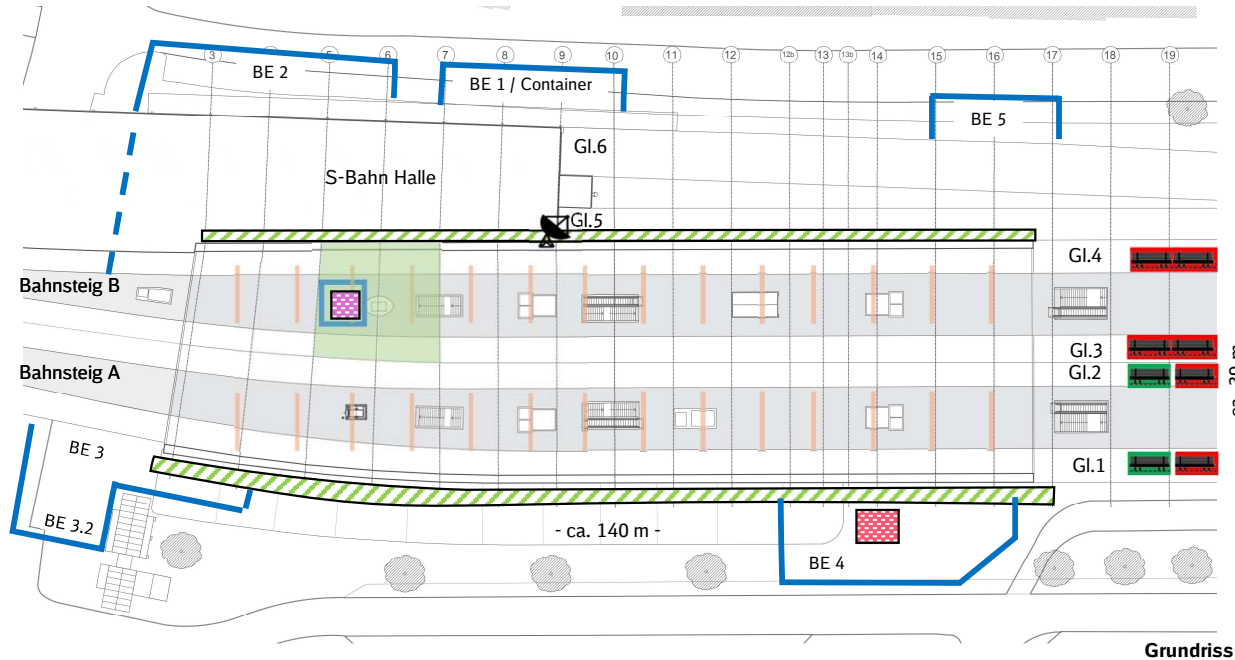

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 41, 45, 48; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten und des Aufzugs der Arbeitsebene über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

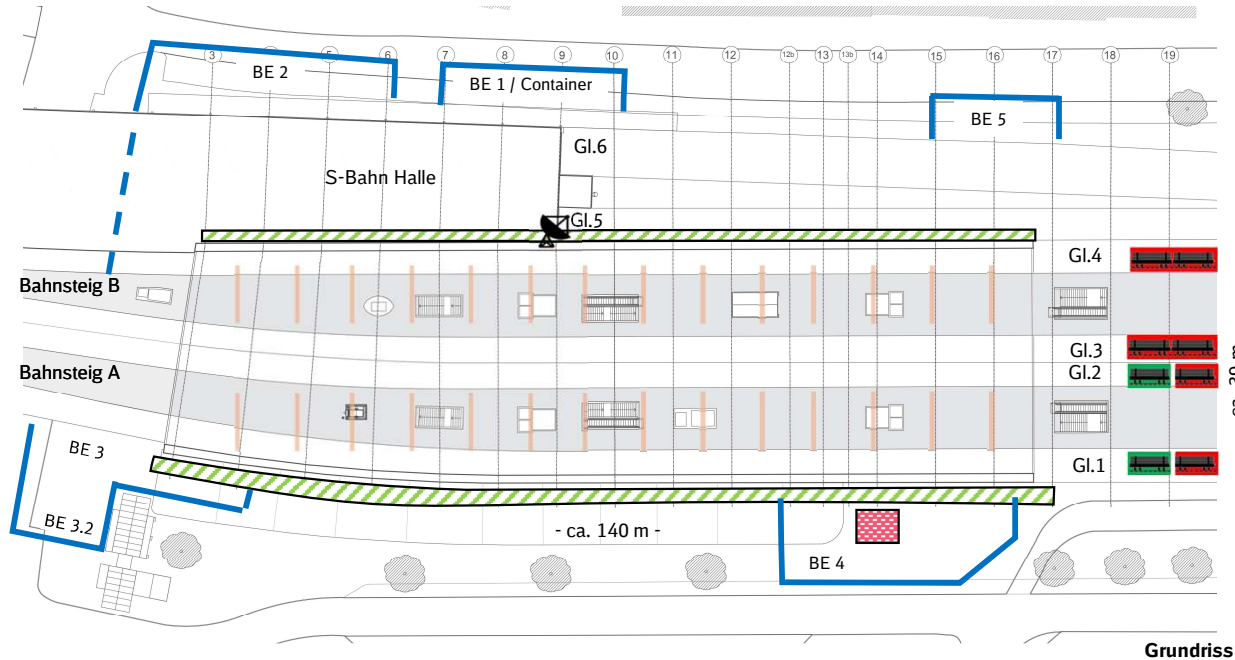

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 41, 45, 48; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau der Bodenplatten und des Treppenturms der Arbeitsebene über Bstg. B

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.


Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

LEGENDE

-  BE, Lagerfläche
-  Fassaden-Dachfanggerüste
-  Abhanggerüst, Arbeitsebene
-  Gerüsttürme
-  Lastenaufzug m. Plattform
-  Fassaden (Schürzen)
-  Befahranlage
-  bauzeitl. Beleuchtung
-  Durchschlagschutz
-  Abbruch
-  Sandstrahlen
-  Beschichten
-  Auflager Beton
-  Dachdecker
-  Trockenbauer
-  GSMR-Antenne
-  Lichtkanalsystem
-  Durchfahrtgleis
-  Gleis für Baulogistik
-  Gleis gesperrt

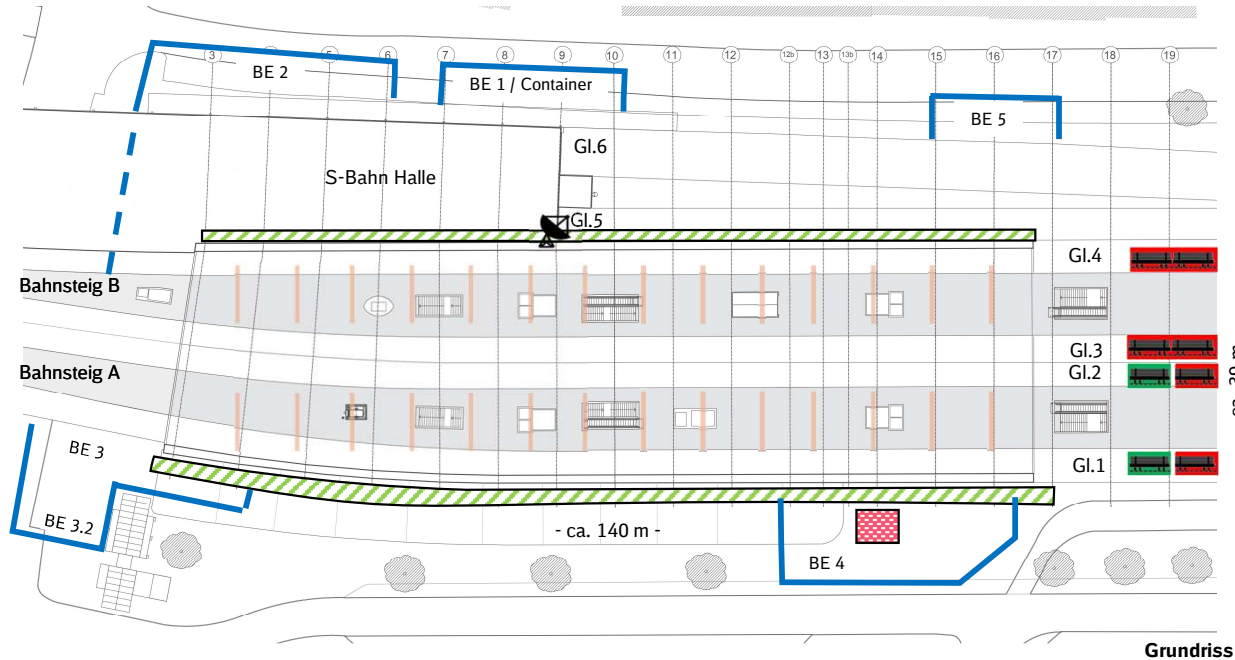

Hinweise:

- Regelbetrieb

SpWo

KW 41, 45, 48; 2027

Sperrung jeweils über Nacht

Maßnahmen in der Halle

Logistik:

Sperrung Gleis 3+4

- in angegebenen Wochen je 23:00 – 4:00
- Totalsperrung: Gleise 1 – 4, 1:00 – 3:30 Uhr, außer Nächte Fr/Sa, Sa/So

Anmerkung:

Überschwenken FBGH mit Kran in während Gleissperrung Gleise 1-4 möglich.

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- Zugang der Arbeiter über die Gerüsttürme bei den Baubehelfen.

VORABZUG – 2027 in Feinabstimmung

Jahreswechsel

2027 – 2028


VORABZUG – 2028 in Feinabstimmung

Sperrpause (Gleis 1, Bstg. A)

07.01. – 26.05.2028

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

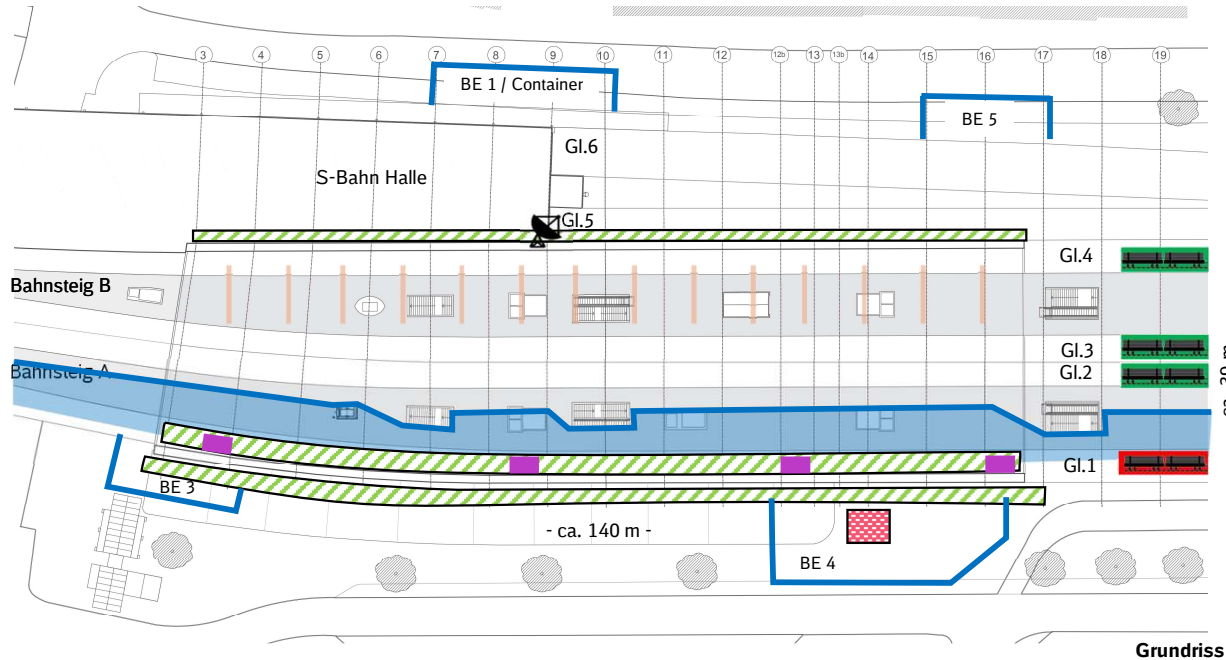

Hinweise:

- Regelbetrieb
- Außerbetriebnahme Beschallung Gleis 1
- Abnahme Beschallung stets halbseitig je Bahnsteig

Maßnahmen in der Halle Gleis 1

- Aufstellung Fassadengerüst in Gleis 1
- Sanierung Fassade Hardenbergpl.,
- Rückbau UK Arbeitsebene und Baubeleuchtung über Gleis 1 und Bstg. A
- Inbetriebnahme Bstg.-Beleuchtung Bstg. A
- Sanierung Bahnsteigdach, Dach längs geteilt, Sanierung ca. 2/3 des Daches
- Sanierung Bahnsteig-Belag & Tröge
- Wegeleitsystem
- zum Ende Sperrpause einhängen der Fassadenbefahranlagen

Logistik: Sperrung Gleis 1

Anmerkung:

- Abnahme Hallenbeleuchtung über Bstg. A

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- über Bstg. A auf Innengerüst
- über BE 3 & 4 auf Außengerüst


VORABZUG – 2028 in Feinabstimmung

Sperrpause (Gleis 2, Bstg. A)

26.05. – 21.07.2028

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

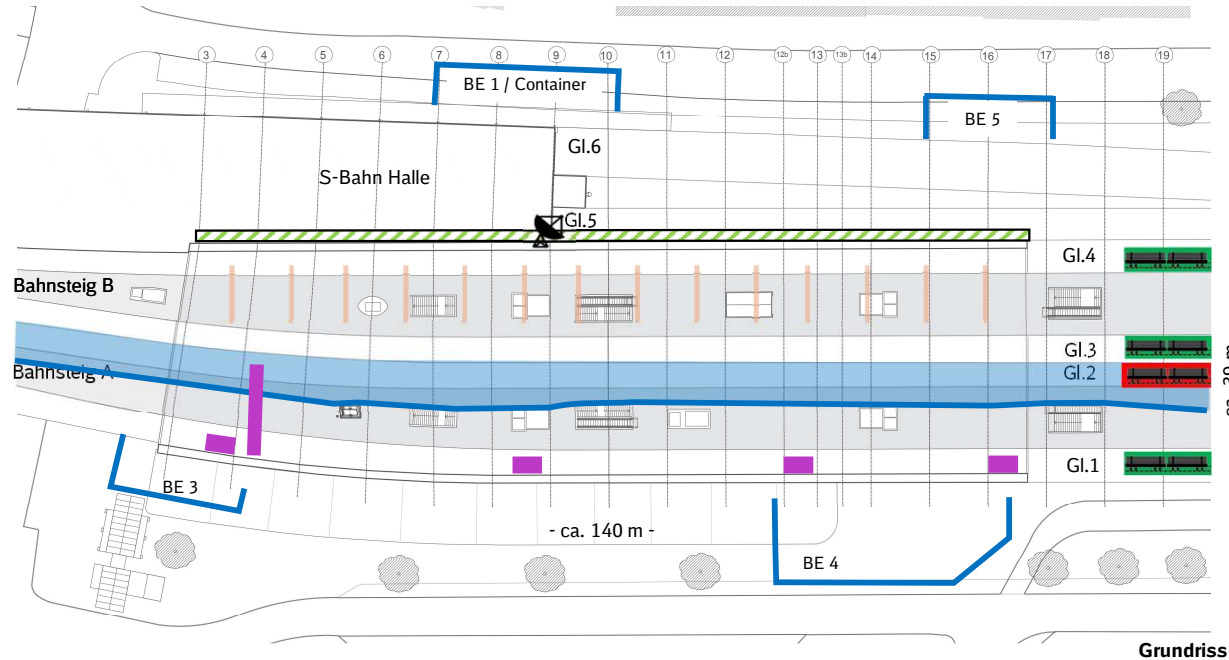

Hinweise:

- Regelbetrieb
- Außerbetriebnahme Beschallung Gleis 2
- Abnahme Beschallung stets halbseitig je Bahnsteig

Maßnahmen in der Halle Gleis 2

- Rückbau UK Arbeitsebene und Baubeleuchtung
- Sanierung Bahnsteigdach, Dach längs geteilt, Sanierung ca. 1/3 des Daches
- Sanierung Bahnsteigkante
- Sanierung Bahnsteig-Belag & Tröge
- Wegeleitsystem
- Einhängen Deckenbefahranlage über Gleis 1 und 2 (in nächstlicher BETRA)

Logistik: Sperrung Gleis 2

Anmerkung:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- über BE 3 & 4 auf Außengerüst


VORABZUG – 2028 in Feinabstimmung

Sperrpause (Gleis 3, Bstg. B)

21.07. – 15.09.2028

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Baulogistik
- Gleis gesperrt

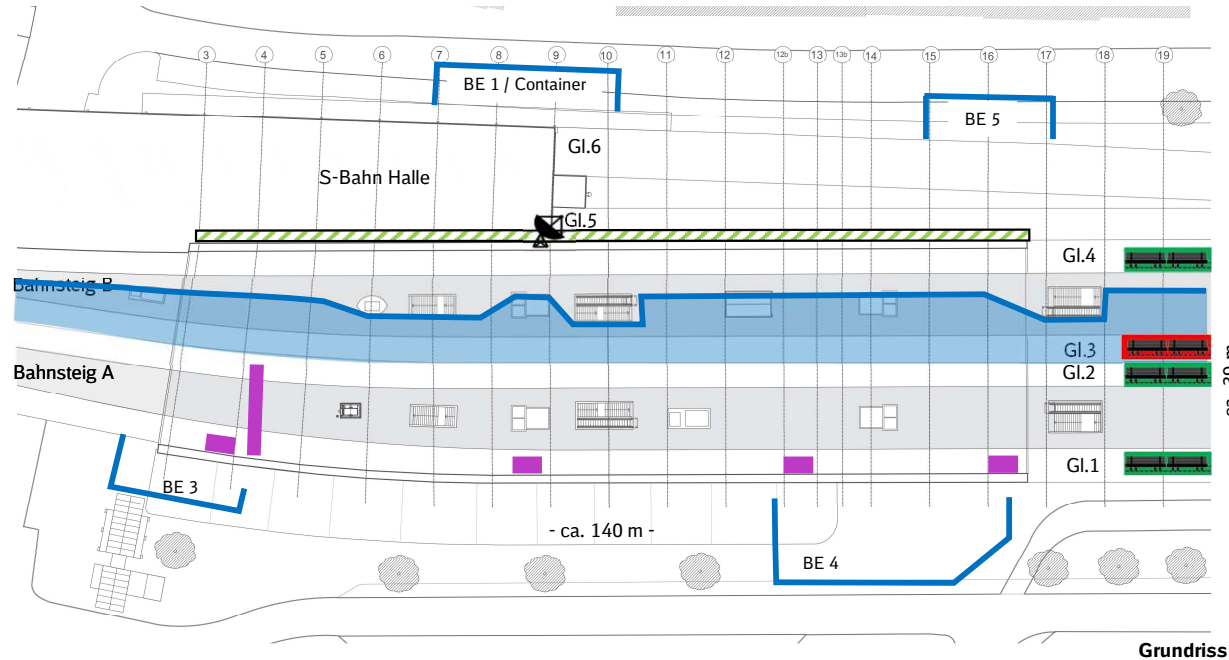

Hinweise:

- Regelbetrieb
- Außerbetriebnahme Beschallung Gleis 3
- Abnahme Beschallung stets halbseitig je Bahnsteig

Maßnahmen in der Halle Gleis 3

- Rückbau UK Arbeitsebene und Baubeleuchtung
- Inbetriebnahme Bstg.- Beleuchtung Bstg. A
- Sanierung Bahnsteigdach, Dach längs geteilt, Sanierung ca. 2/3 des Daches
- Sanierung Bahnsteigkante
- Sanierung Bahnsteig-Belag & Tröge
- Wegeleitsystem

Logistik: Sperrung Gleis 3

Anmerkung:

- Abnahme Hallenbeleuchtung Bstg. B

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- über Bstg. A auf Innengerüst
- über BE 3 & 4 auf Außengerüst


VORABZUG – 2028 in Feinabstimmung

Sperrpause (Gleis 4, Bstg. B)

15.09. – 09.12.2028

LEGENDE

- BE, Lagerfläche
- Fassaden-Dachfanggerüste
- Abhanggerüst, Arbeitsebene
- Gerüsttürme
- Lastenaufzug m. Plattform
- Fassaden (Schürzen)
- Befahranlage
- bauzeitl. Beleuchtung
- Durchschlagschutz
- Abbruch
- Sandstrahlen
- Beschichten
- Auflager Beton
- Dachdecker
- Trockenbauer
- GSMR-Antenne
- Lichtkanalsystem
- Durchfahrtgleis
- Gleis für Bauleistigkeit
- Gleis gesperrt

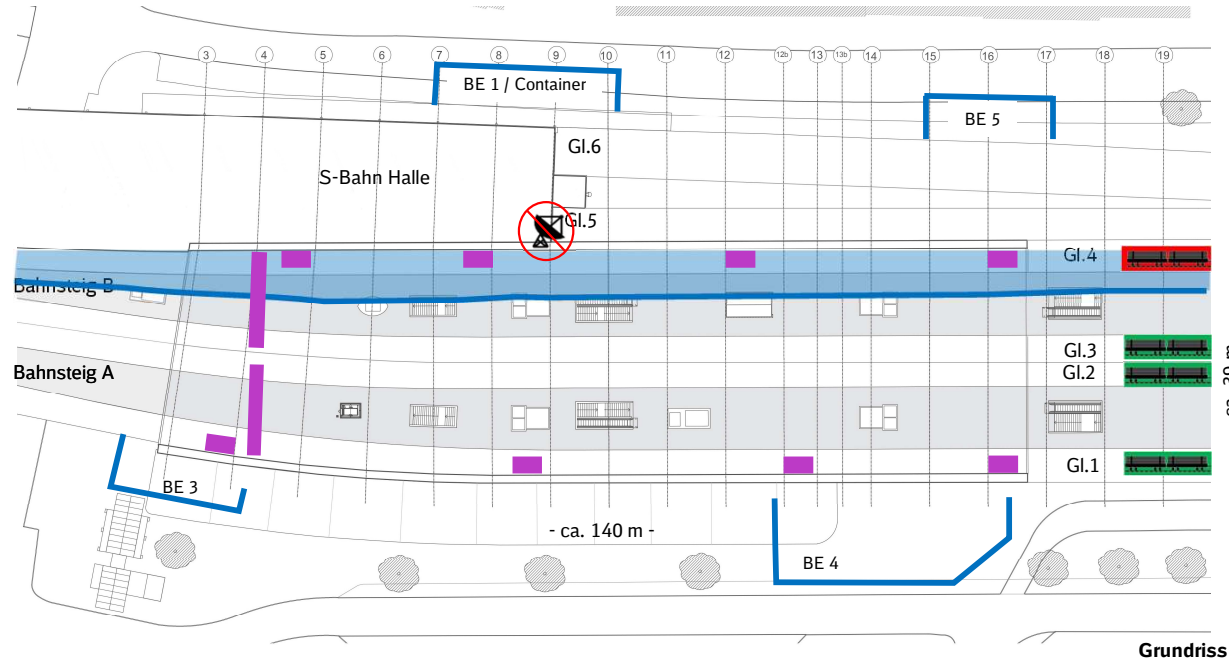

Hinweise:

- Regelbetrieb
- Außerbetriebnahme Beschallung Gleis 4
- Abnahme Beschallung stets halbseitig je Bahnsteig

GSMR

- Während Bauarbeiten Rückbau Absturzsicherung Achse 9 über Gleis 5 in nächtlicher BETRA aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb.

Maßnahmen in der Halle

- Rückbau UK Arbeitsebene und Baubeleuchtung
- Sanierung Bahnsteigdach, Dach längs geteilt, Sanierung ca. 1/3 des Daches
- Sanierung Bahnsteigkante Gleis 2
- Sanierung Bahnsteig-Belag & Tröge
- Wegeleitsystem
- Einhängen Deckenbefahranlage über Gleis 3 und 4 (in nächtlicher BETRA)
- zum Ende Sperrpause einhängen der Fassadenbefahranlagen

Logistik: Sperrung Gleis 4

Anmerkung:

Zugänglichkeiten der Arbeiter:

- über Bstg. A auf Innengerüst
- über BE 3 & 4 auf Außengerüst

VORABZUG – 2028 in Feinabstimmung

Jahreswechsel

2028 – 2029

VORABZUG – in Feinabstimmung

Sperrpause S-Bahn-Gleishalle

01.10.2028 – 14.02.2029

LEGENDE

- | | |
|---|----------------------------|
|  | BE, Lagerfläche |
|  | Fassaden-Dachfanggerüste |
|  | Abhanggerüst, Arbeitsebene |
|  | Gerüsttürme |
|  | Lastenaufzug m. Plattform |
|  | Fassaden (Schürzen) |
|  | Befahranlage |
|  | bauzeitl. Beleuchtung |
|  | Durchschlagschutz |
|  | Abbruch |
|  | Sandstrahlen |
|  | Beschichten |
|  | Auflager Beton |
|  | Dachdecker |
|  | Trockenbauer |
|  | GSMR-Antenne |
|  | Lichtkanalsystem |
|  | Durchfahrtsgleis |
|  | Gleis für Baulogistik |
|  | Gleis gesperrt |



Hinweise:

- Regelbetrieb

Maßnahmen in der S-Bahnlinie

Logo:

Von: Christian Bahl <christian.bahl@deutschebahn.com>

Gesendet: Dienstag, 12. März 2024 10:38

An: Jan Herberg (DB E.C.O.) <Jan.Herberg@db-eco.com>

Cc: Thorsten Schulz <thorsten.schulz@deutschebahn.com>; Dieter D Schmidt

[<dieter.d.schmidt@deutschebahn.com>](mailto:dieter.d.schmidt@deutschebahn.com)

Betreff: MKM 27-28 - Gleishallen BZOS (Sperr Gl255 - Status zurückgewiesen)

Hallo Jan,

die für das Jahr 2028 angezeigte tVE für eine **Sperrung des Gleises 255** in BZOS ab 01.10.2028 (bis 02/2029) habe ich in den Status „**zurückgewiesen**“ gesetzt.

Eine lang andauernde Sperrung eines S-Bahngleises in BZOS ist erst nach Einbau der besprochenen bauzeitlichen Infrastruktur durch das Projekt möglich.

Ziel muss die Aufrechterhaltung mindestens eines 5-Minuten-Taktes der S-Bahnlinien über die Stadtbahn sein.

Bitte diese Umstände projektintern abstimmen.

[illegible]

Viele Grüße

Zugängli

- über B
- über B

Christian Bahl

Teamkoordinator Kapazitätsmanagement S-Bahn Berlin

Fahrplan und Kapazitätsmanagement S-Bahn Berlin (I.B-O-FS)

BZUG
stimmung

Abkürzungsverzeichnis

AN	Auftragnehmer
BA	Bauabschnitt
BE	Baustelleneinrichtung
BETRA	Betriebs- und Bauanweisung: (meist nächtliche) Sperrung der Gleise für Zugdurchfahrten
Bstg.	Bahnsteig
GSMR	Global System Mobil Rail (digitales Mobilfunksystem Bahn)
HLK	Hochleistungskorridor (Baumaßnahmen an Bahnstrecke)
Hdbpl.	Hardenbergplatz
KW	Kalenderwoche
LST	Leit- und Sicherungstechnik (Signalanlagen)
SPP	Sperrpause
TDK	Turmdrehkran
Titel	meint Titel im Leistungsverzeichnis
OLA	Oberleitungsanlage
UK	Unterkonstruktion
VE	Vergabeeinheit
W	Woche
WMP	Werk- & Montageplanung
