
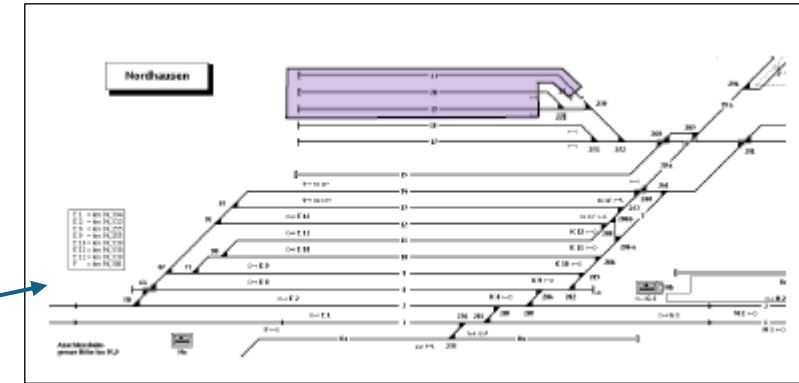


## Bf. Berga/Kelbra Weichen 1 und 2 Weichenerneuerung

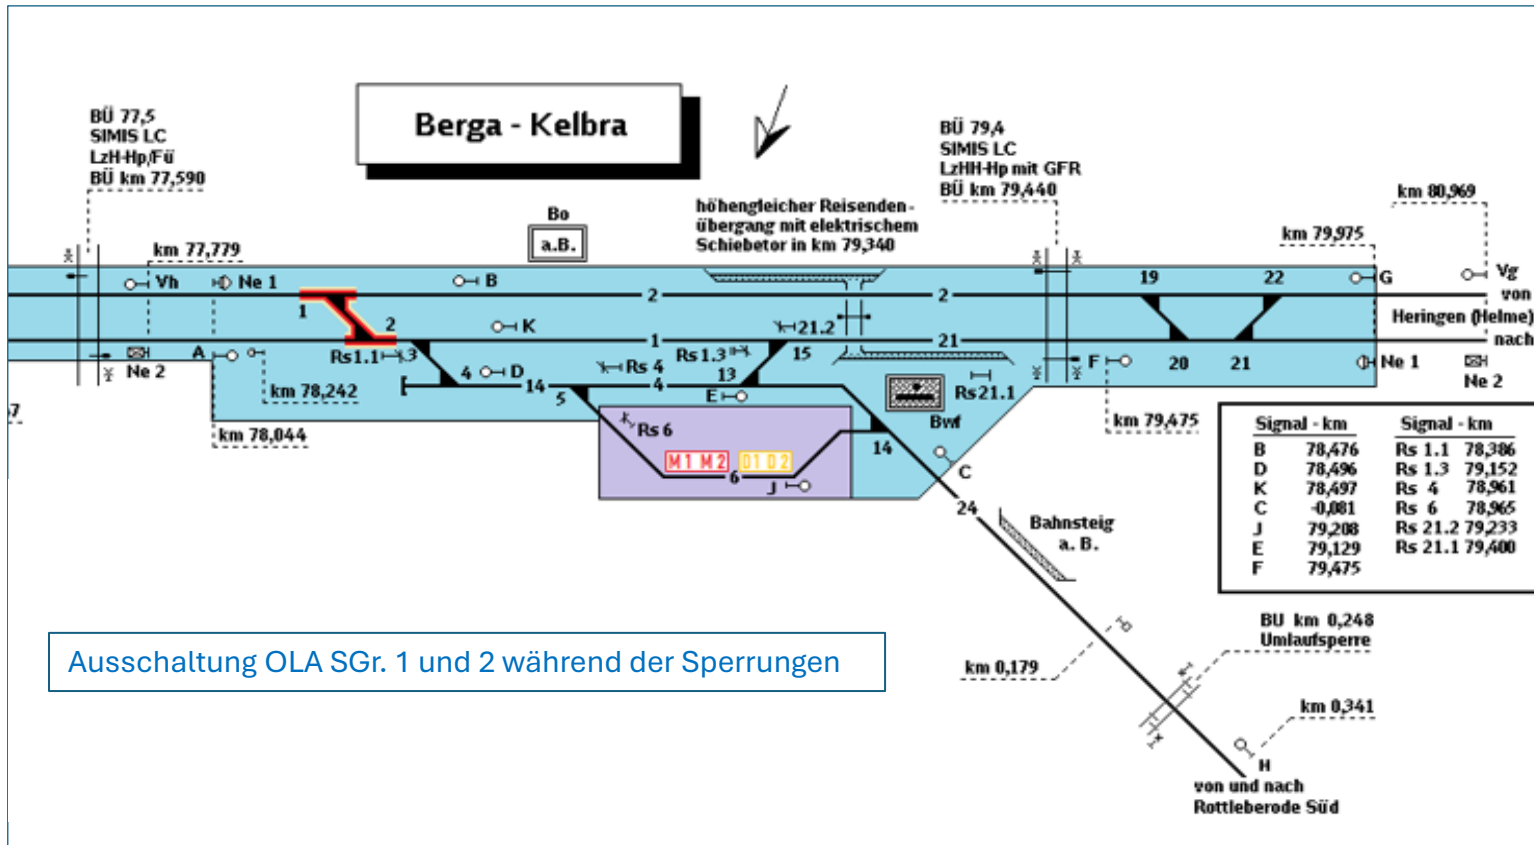

**24.02. (08:00 Uhr) - 13.03.26 (12:00 Uhr) = 16 d Bf. Berga / Kelbra Gleis 6**

**-> Vor- und Demontage Weichen 1 und 2**

**Bf. Nordhausen Gleis 18, 19, 20 -> Logistik**

**24.02. - 05.03.2026** je 08:00-17:00 Uhr  
**06.03. - 10.03.26** 07:00-03:00 Uhr durchgehend  
**11.03. + 12.03.2026** je 08:00-17:00 Uhr  
**30./31.07.- 02./03.08.2026** je 22:00-04:00 Uhr  
**01./02.08.2026** 22:00-05:00 Uhr  
**06./07. - 08./09.08.2026** je 22:00-04:00 Uhr  
**08./09.08.2026** 22:00-05:00 Uhr

**= 10 x 9 h TSP**  
**= 1 x 94 h TSP Berga / Kelbra**  
**= 2 x 9 h TSP**  
**= 4 x 6 h ESP Gleis 2**  
**= 1 x 7 h ESP Gleis 1 = TSP**  
**= 4 x 6 h ESP Gleis 1**  
**= 1 x 7 h ESP Gleis 2 = TSP**

**-> W 19 + 20 Hz-Wechsel, Vorarbeiten Entwässerung**  
**-> W 1 + 2 WE**  
**-> Randwege, Randwegverbau, Entwässerung**  
**-> Fertigstellung, Randwege**  
**-> Belastungsstopfgang Neuschienenbearbeitung**  
**-> Fertigstellung, Randwege**  
**-> Belastungsstopfgang Neuschienenbearbeitung**
