


Bf Rosdorf

Bf Obernjesa

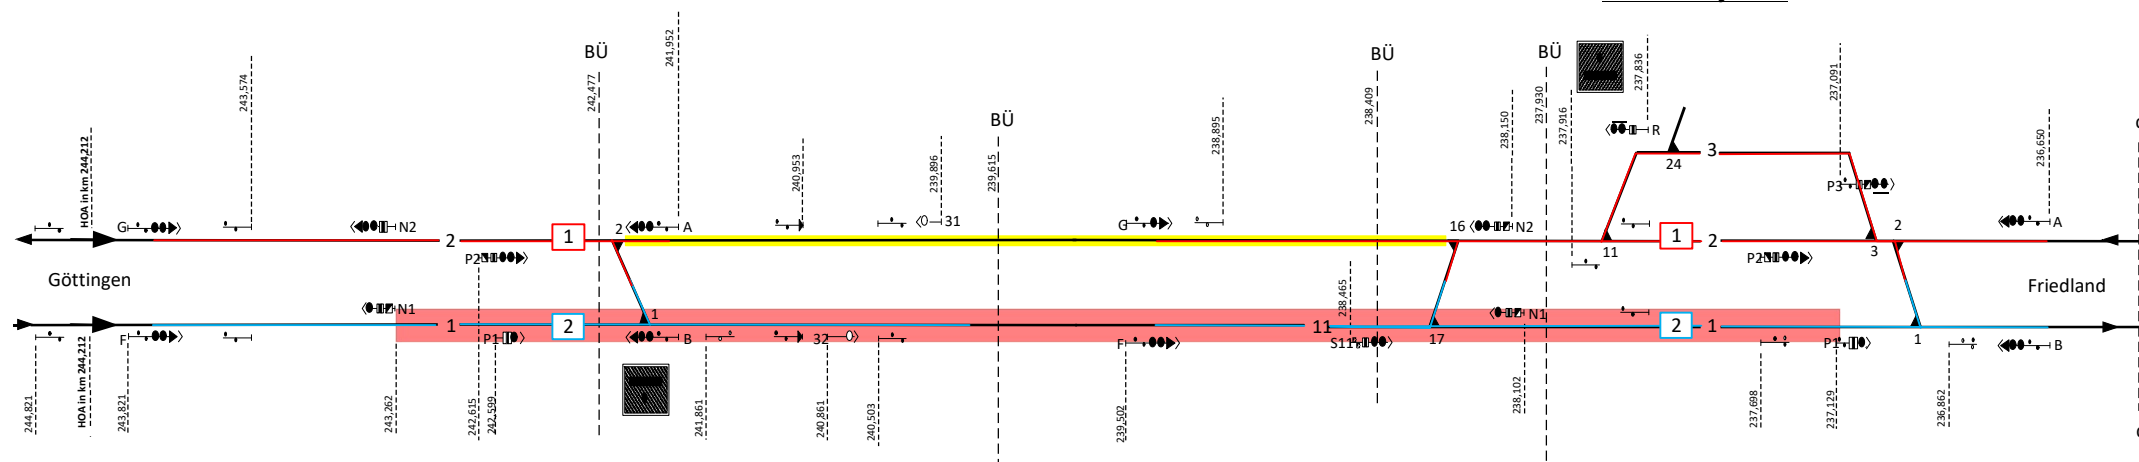

Aufbau Sicherung ATWS:

Sa. 18.04.26 – Do. 23.04.26 jeweils 23:20 – 05:10 5x5:50h Asig N1- Asig P1

Abbau Sicherung ATWS:


Fr. 15.05.26 – Mi. 20.05.26 jeweils 23:20 – 05:10 5x5:50h Asig N1- Asig P1

Umbaubereich km 238,279 – km 242,374:

Fr. 24.04.26 03:00 – Fr. 15.05.26 21:00 1x522h Grz W16 – Grz W2 SG701 aus

Bf Rosdorf

Bf Obernjesa

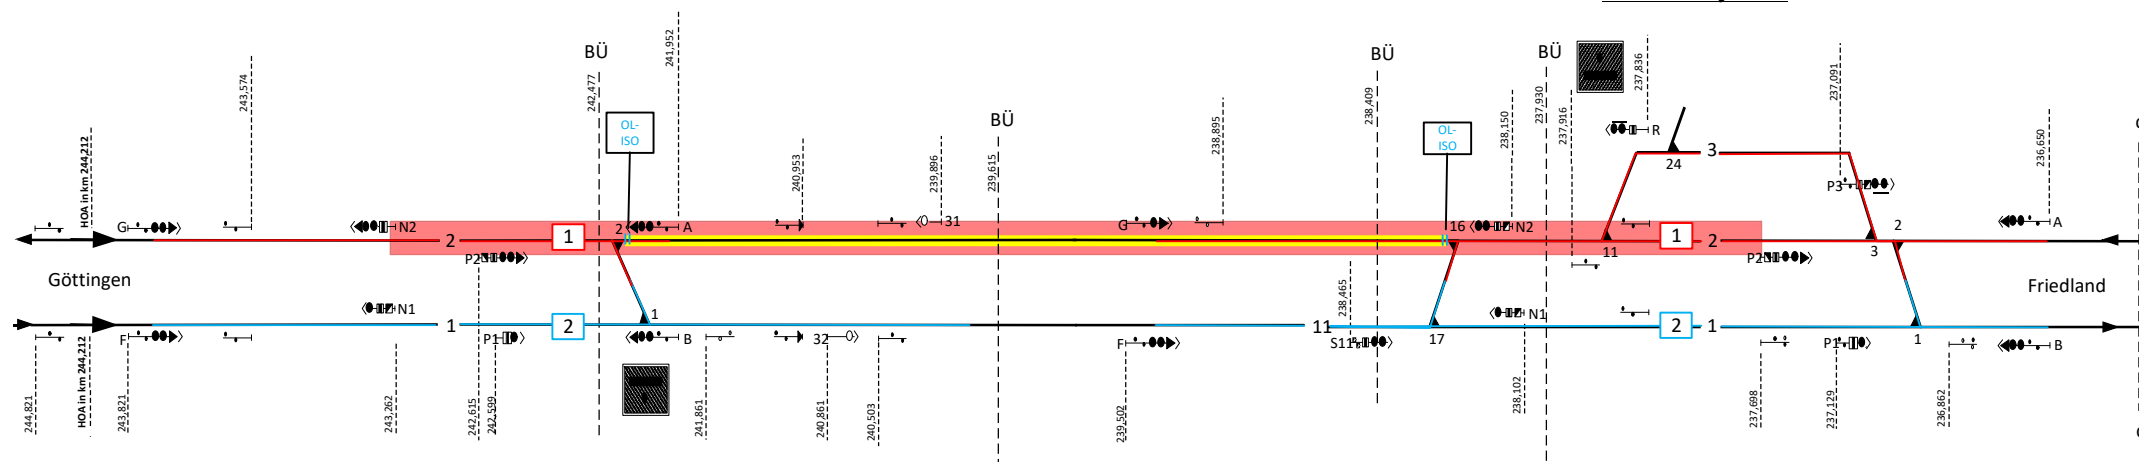

Einbau OL-ISO:


Do. 23.04.26 – Fr. 24.04.26 21:00 – 3:00 1x6h HOBJ Asig P2 – HRDF Asig N2 SG 1 HOBJ, fr. Str. HOBJ-HRDF u. SG 1 HRDF aus

Ausbau OL-ISO:

Fr. 15.05.26 15:10 – 21:00 1x5:50h HOBJ Asig P2 – HRDF Asig N2 SG 1 HOBJ, fr. Str. HOBJ-HRDF u. SG 1 HRDF aus

Umbaubereich km 238,279 – km 242,374:

Fr. 24.04.26 03:00 – Fr. 15.05.26 21:00 1x522h Grz W16 – Grz W2 SG701 aus

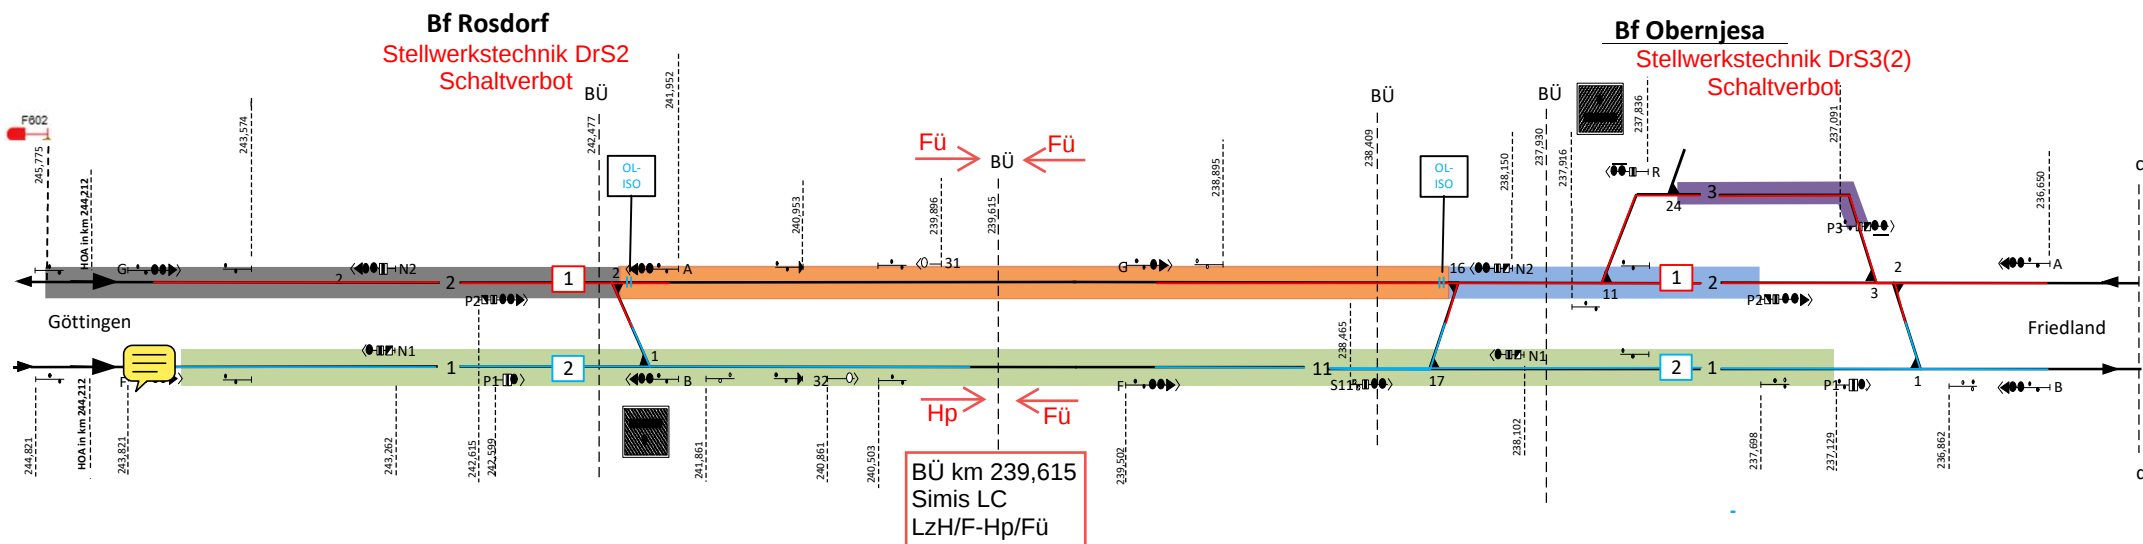


GE Obernjesa - Rosdorf

<u>Zeitraum:</u>	<u>Dauer:</u>	<u>Sperrung von:</u>	<u>Sperrung bis:</u>	<u>Arbeiten:</u>	<u>SG aus:</u>
Fr. 24.04.2026 3:00 – Fr. 15.05.2026 21:00	522h	HOBj Grz. W16	HRDF Grz. W2	GE + PSS Obernjesa-Rosdorf km 238,279 - km 242,374	SG701 HOBj-HRDF & SG701 HRDF
Fr. 24.04.2026 – Di. 05.05.2025 schichtweise 23:20 bis 05:10	11 x 5:50h	HOBj Asig P1	HRDF Esig F	TSP GE + PSS Obernjesa-Rosdorf km 238,279 - km 242,374	SG2 HRDF, SG2 HOBj u. fr. HOBj-HRDF
Sa. 02.05.2026 – Do. 07.05.2026 schichtweise 23:00 bis 05:00	5 x 6h	HOBj Asig P2	Grz. W16	Einfädeln BRM & Umbauzug. Anschlussarbeiten W16	SG1 HOBj
So. 03.05.2026 – Fr. 08.05.2026 schichtweise 23:00 bis 05:00	5 x 6h	HRDF Grz. W2	HG Esig F602	Ausfädeln RPM & Umbauzug Anschlussarbeiten W2	SG 1 HRDF & fr. Str. HRDF-HG
Mo. 24.04.2026 03:00 – So. 15.05.2025 21:00 (Hinweis: Anschluss VR Bank Südniedersachsen bleibt erreichbar, Z muss aber in Gl.1 o.2 enden/beginnen und umrangieren)	522h	Asig P3	Grz. W24	Logistikgleis	

Bf Rosdorf

Bf Obernjesa

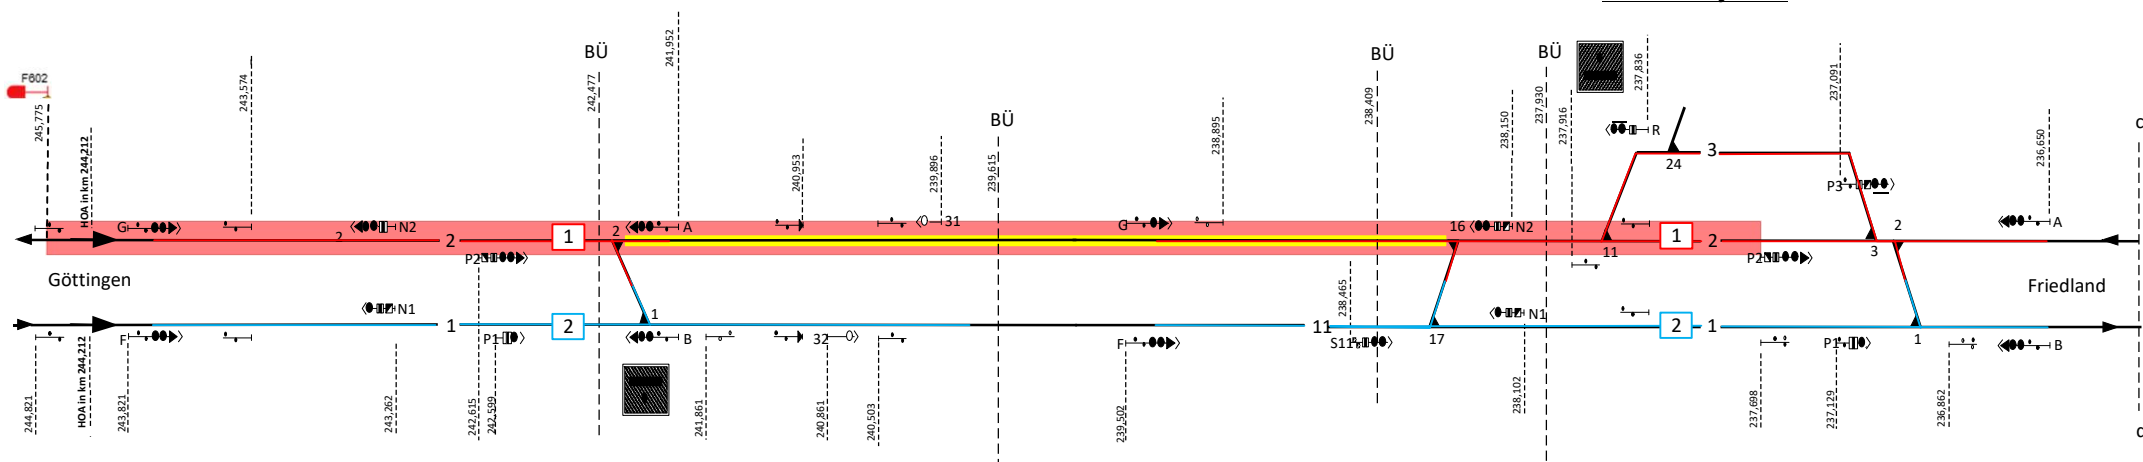

Dua nach GE + PSS Obernjesa-Rostorf:

Fr. 10.07.26 – So. 12.07.26 jeweils 21:50 – 05:30 2x7:40h Asig P2 – Esig F602

Bf Rosdorf

Bf Obernjesa

