


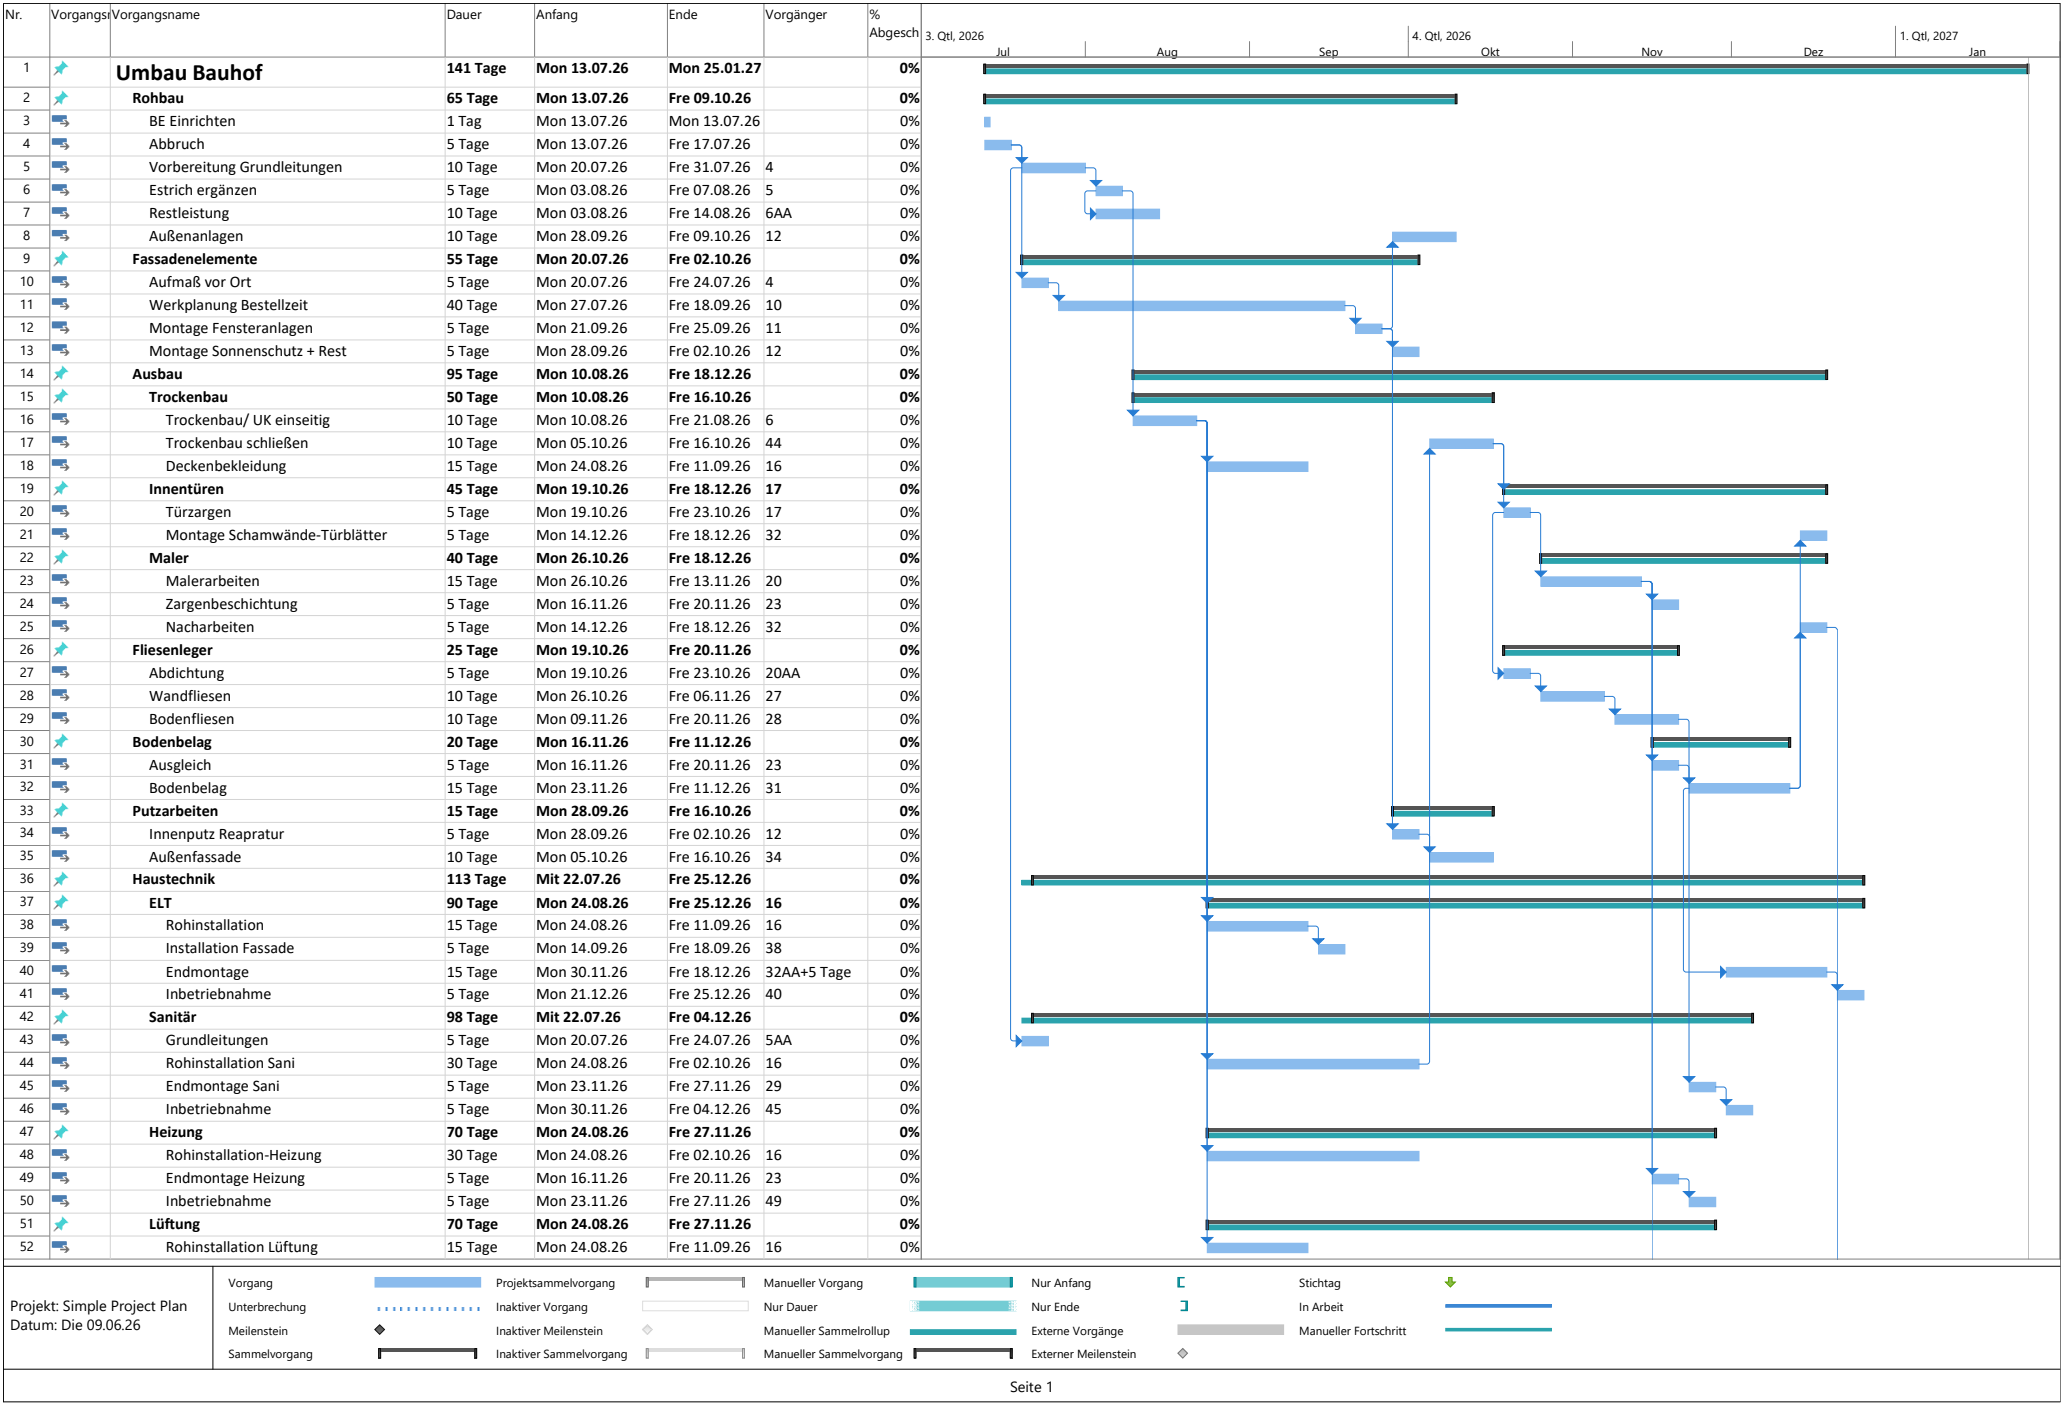

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	% Abgesch.	3. Qtl, 2026JulAugSep4. Qtl, 2026OktNovDez1. Qtl, 2027Jan											
53		Endmontage Lüftung	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	23	0%												
54		Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	53	0%												
55		Fertigstellung	26 Tage	Mon 21.12.26	Mon 25.01.27		0%												
56		Abnahmen	5 Tage	Mon 21.12.26	Fre 25.12.26	25	0%												
57		Ausstattung/ Möblierung	16 Tage	Mon 04.01.27	Mon 25.01.27		0%												
58		mögliche Nutzungsaufnahme	0 Tage	Mon 25.01.27	Mon 25.01.27	57	0%												

Projekt: Simple Project Plan Datum: Die 09.06.26	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
