


Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

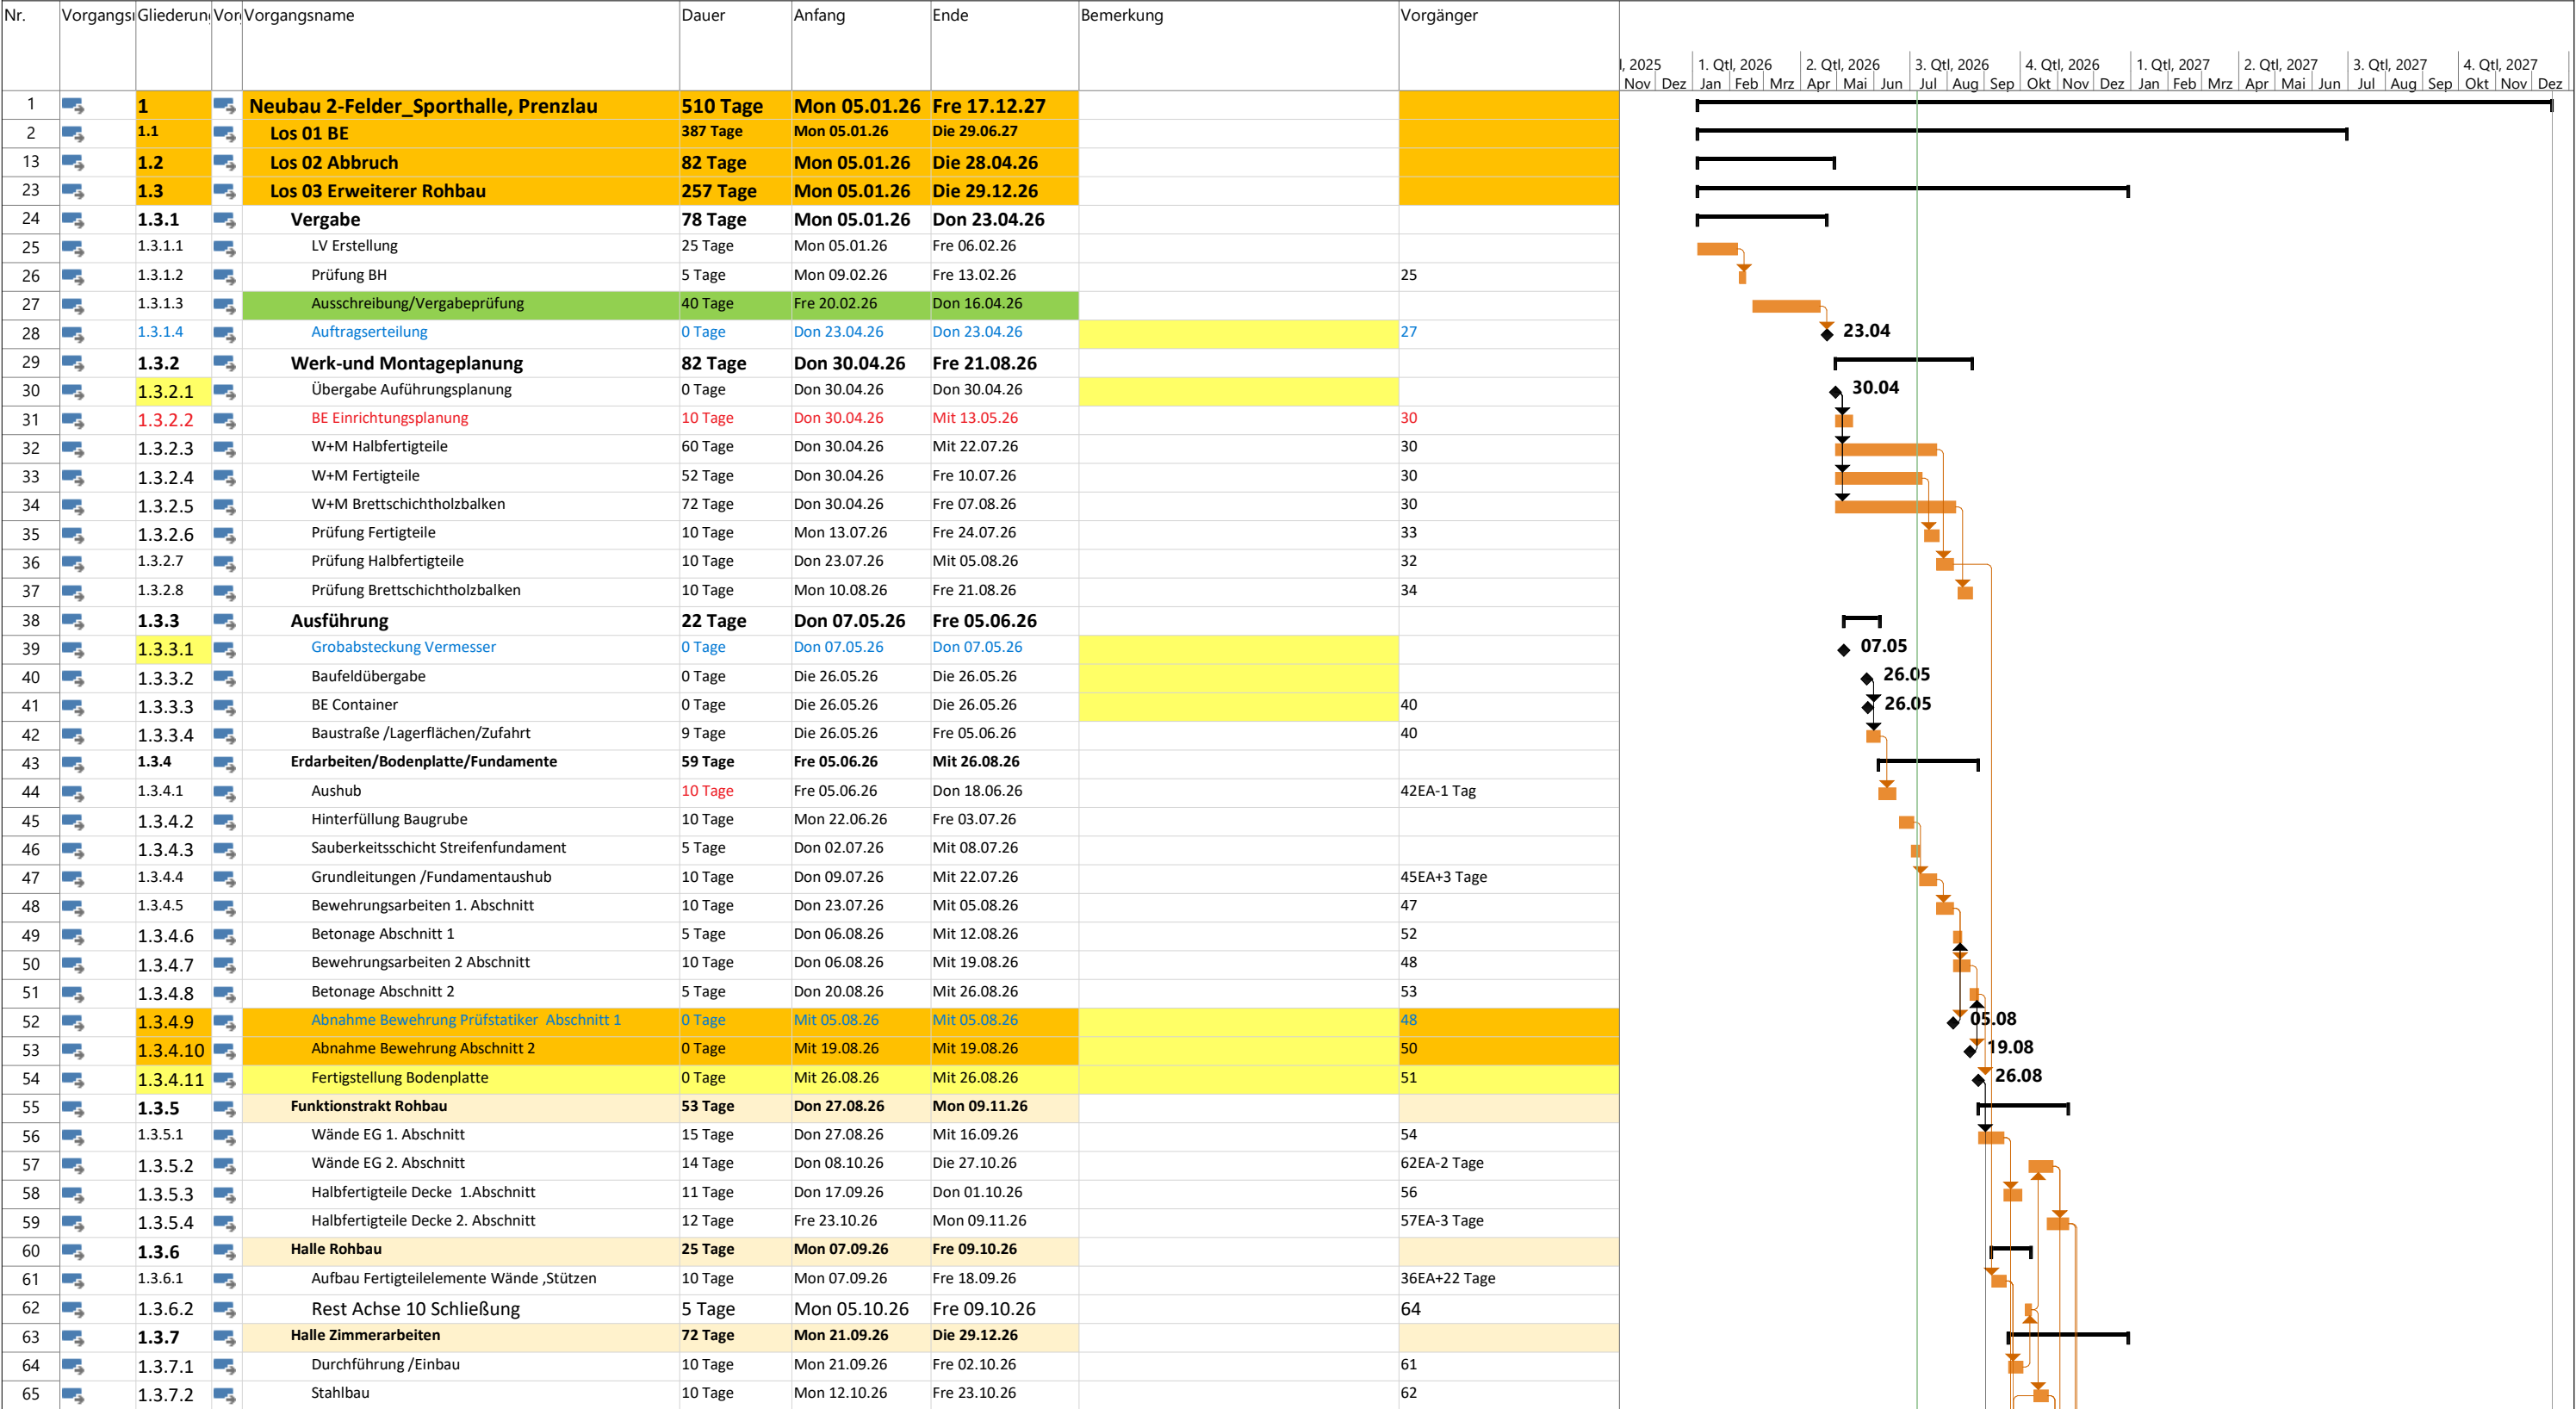

Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau
Datum: 07.07.2026
Index 8

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang


Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein

Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt

↓
—
—

Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

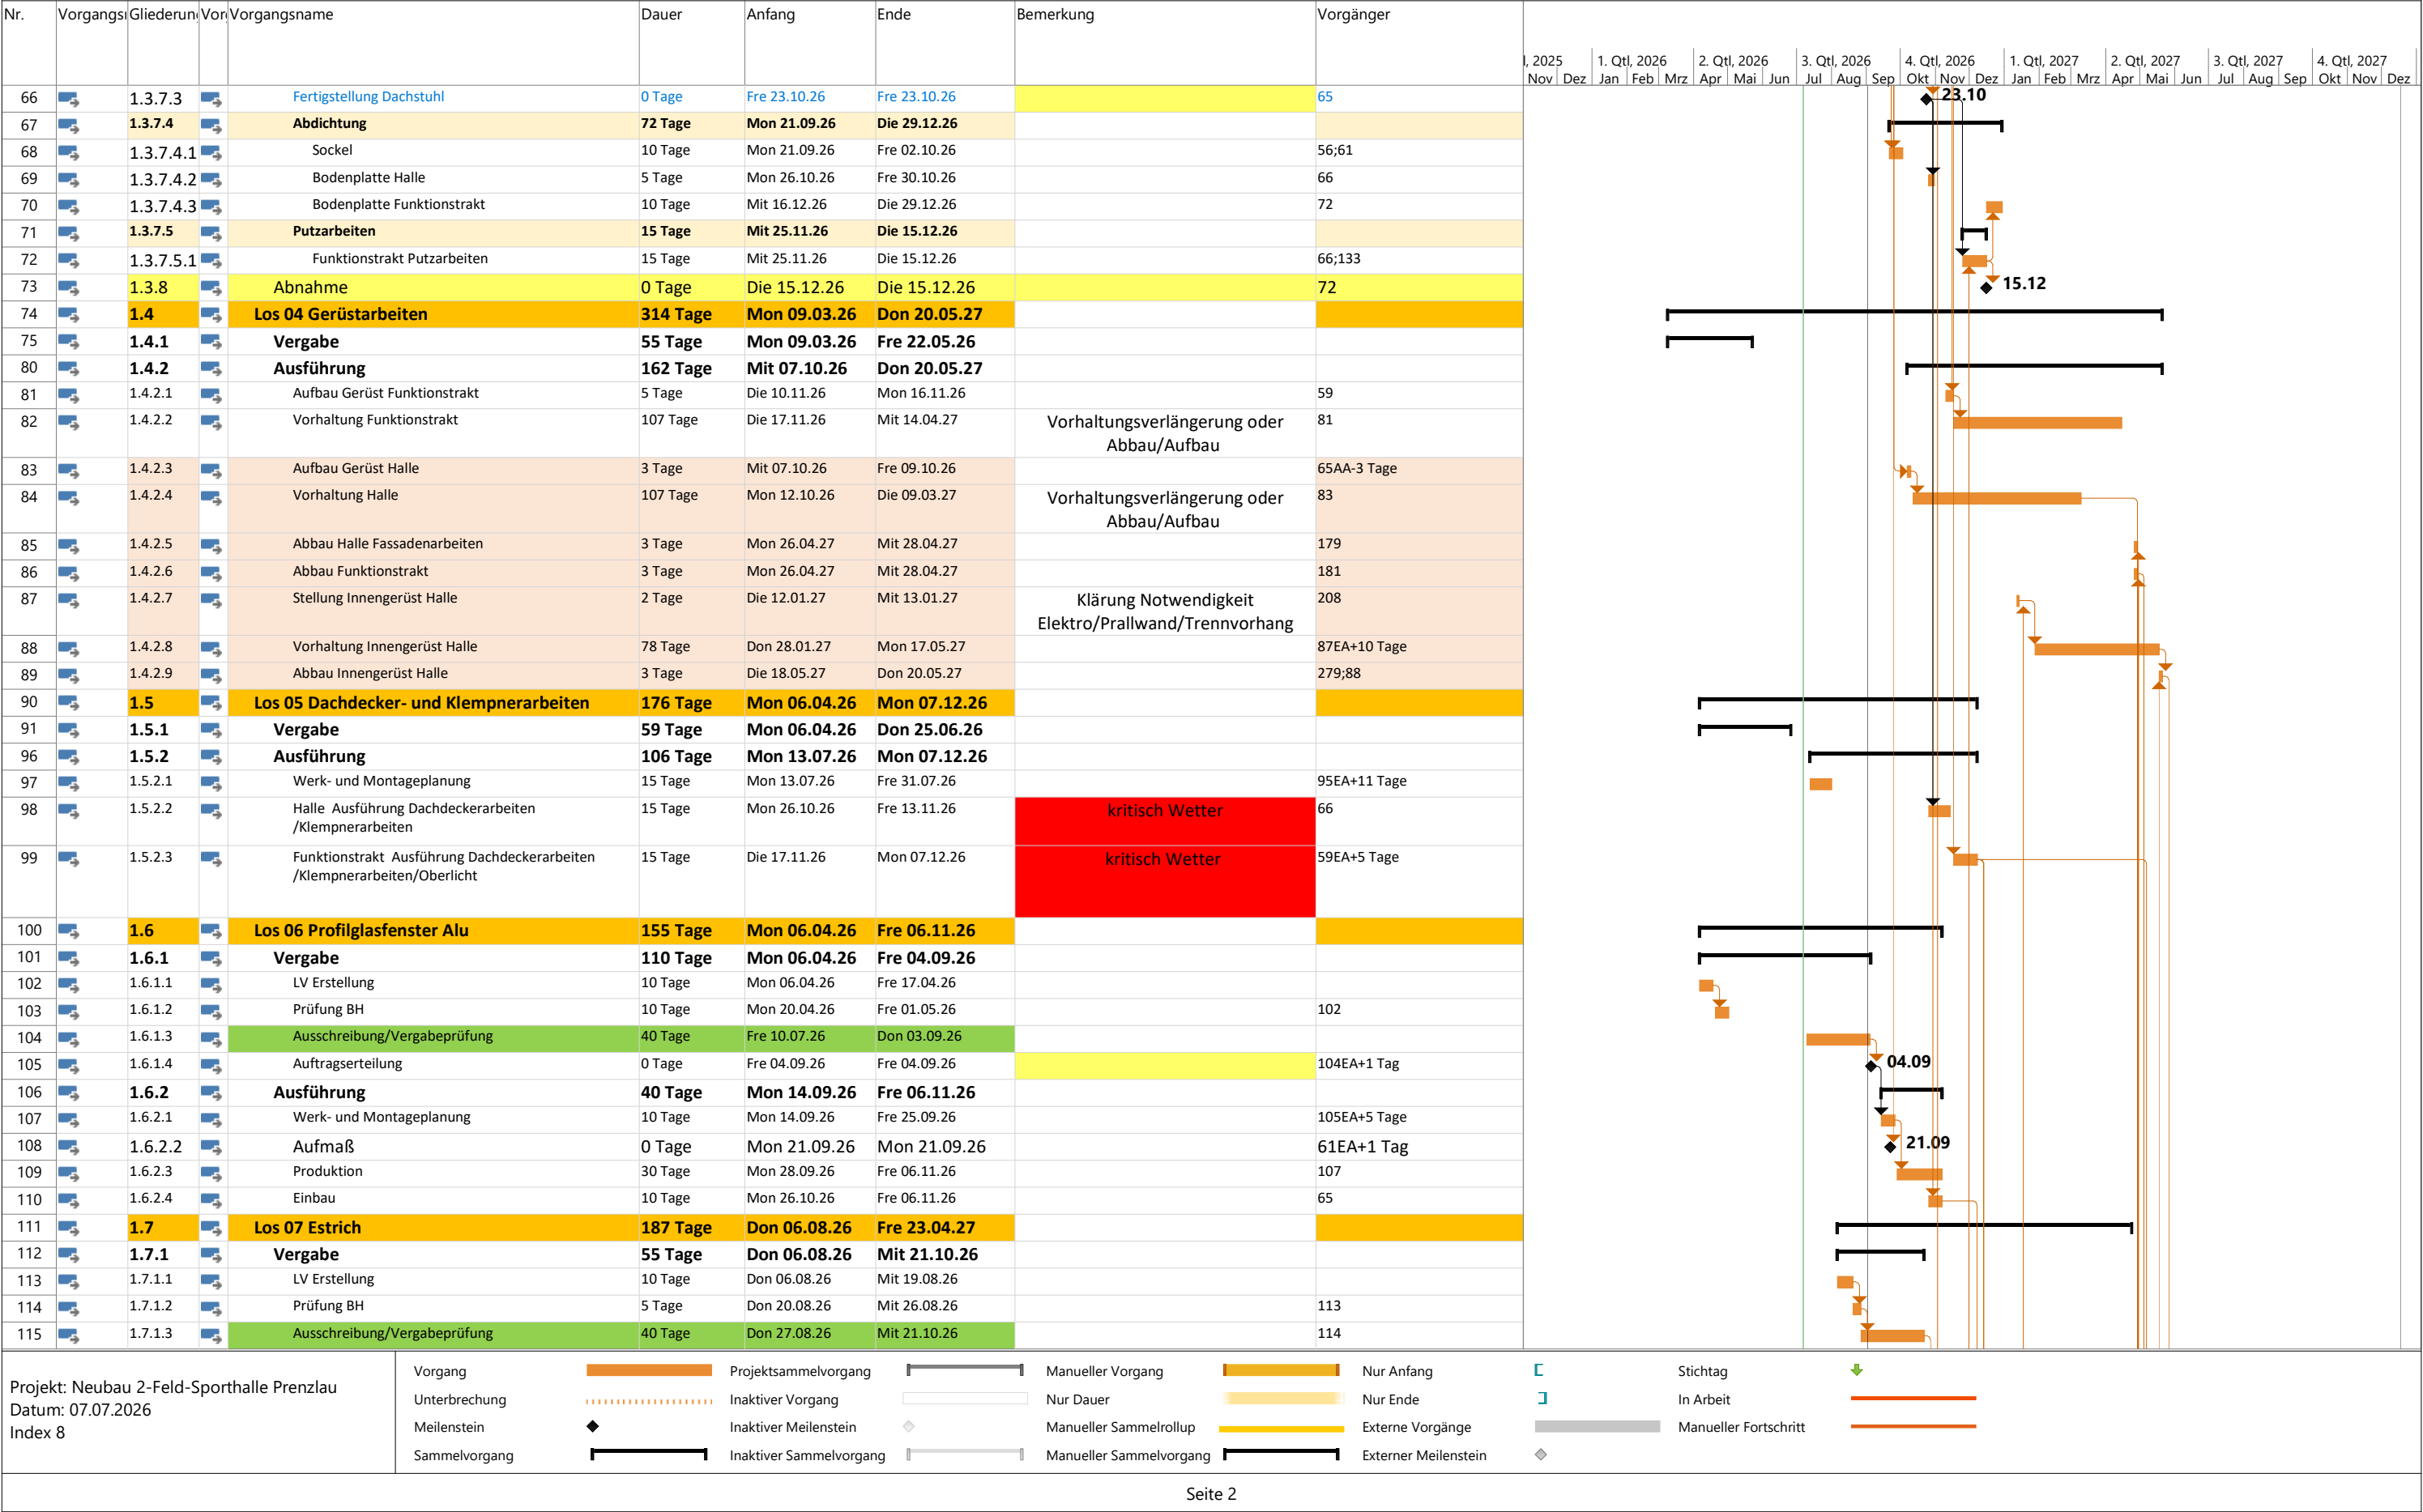

Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

Nr.	Vorgangs- Gliederung	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bemerkung	Vorgänger	2025												1. Qtl, 2026				2. Qtl, 2026				3. Qtl, 2026				4. Qtl, 2026				1. Qtl, 2027				2. Qtl, 2027				3. Qtl, 2027				4. Qtl, 2027								
									Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez											
116			1.7.1.4		Auftragserteilung	0 Tage	Mit 21.10.26	Mit 21.10.26																																																	
117			1.7.2		Ausführung	25 Tage	Mon 22.03.27	Fre 23.04.27																																																	
118			1.7.2.1		Beginn	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27																																																	
119			1.7.2.2		Aufheizen/Trocknung	20 Tage	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27																																																	
120			1.8		Los 08 Tischlerarbeiten (Fenster- Außentüren)	278 Tage	Mon 08.06.26	Mit 30.06.27																																																	
121			1.8.1		Vergabe	64 Tage	Mon 08.06.26	Don 03.09.26																																																	
122			1.8.1.1		LV Erstellung	15 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26																																																	
123			1.8.1.2		Prüfung BH	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26																																																	
124			1.8.1.3		Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Fre 10.07.26	Don 03.09.26																																																	
125			1.8.1.4		Auftragserteilung	0 Tage	Don 03.09.26	Don 03.09.26																																																	
126			1.8.2		Ausführung	58 Tage	Don 03.09.26	Die 24.11.26																																																	
127			1.8.2.1		Werk- und Montageplanung /Vorabstimmungen	10 Tage	Fre 04.09.26	Don 17.09.26																																																	
128			1.8.2.2		Aufmaß Abschnitt 1	0 Tage	Don 03.09.26	Don 03.09.26																																																	
129			1.8.2.3		Produktion	15 Tage	Fre 04.09.26	Don 24.09.26																																																	
130			1.8.2.4		Funktionstrakt Einbau Fenster Abschnitt 1	5 Tage	Fre 25.09.26	Don 01.10.26																																																	
131			1.8.2.5		Aufmaß Abschnitt 2	0 Tage	Die 27.10.26	Die 27.10.26																																																	
132			1.8.2.6		Produktion	15 Tage	Mit 28.10.26	Die 17.11.26																																																	
133			1.8.2.7		Funktionstrakt Einbau Fenster Abschnitt 2	5 Tage	Mit 18.11.26	Die 24.11.26																																																	
134			1.8.3		Außentüren	103 Tage	Mon 08.02.27	Mit 30.06.27																																																	
135			1.8.3.1		Werk-und Montageplanung	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27																																																	
136			1.8.3.2		Montagevorrichtung Fassade	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27																																																	
137			1.8.3.3		Einbau Außentüren + Windfang	5 Tage	Don 24.06.27	Mit 30.06.27																																																	
138			1.9		Los 09 Trockenbauarbeiten	160 Tage	Mon 03.08.26	Fre 12.03.27																																																	
139			1.9.1		Vergabe	65 Tage	Mon 03.08.26	Fre 30.10.26																																																	
140			1.9.1.1		LV Erstellung	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26																																																	
141			1.9.1.2		Prüfung BH	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26																																																	
142			1.9.1.3		Ausschreibung/Vergabeprüfung	45 Tage	Mon 31.08.26	Fre 30.10.26																																																	
143			1.9.2		Ausführung	95 Tage	Fre 30.10.26	Fre 12.03.27																																																	
144			1.9.2.1		Auftragserteilung	0 Tage	Fre 30.10.26	Fre 30.10.26																																																	
145			1.9.2.2		Funktionstrakt UK Wände / Decken	10 Tage	Die 08.12.26	Mon 21.12.26																																																	
146			1.9.2.3		Schließung Wände inkl. Spachtelung	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27																																																	
147			1.9.2.4		Schließung Decken	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27																																																	
148			1.10		Los 10 Sportbodenkonstruktion inkl Fußbodenheizung	174 Tage	Mon 23.11.26	Don 22.07.27																																																	
149			1.10.1		Vergabe	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26																																																	
150			1.10.1.1		LV Erstellung	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26																																																	
151			1.10.2		Prüfung BH	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26																																																	
152			1.10.3		Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 14.12.26	Fre 05.02.27																																																	
153			1.10.4		Ausführung	119 Tage	Fre 05.02.27	Don 22.07.27																																																	
154			1.10.4.1		Auftragserteilung	0 Tage	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27																																																	
155			1.10.4.2		Werk- Montageplanung/Bestellung	25 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27																																																	
156			1.10.4.3		Ausführung Dämmung Heizungssytsem	10 Tage	Fre 21.05.27	Don 03.06.27																																																	
157			1.10.4.4		Belag/Sockel	10 Tage	Fre 18.06.27	Don 01.07.27																																																	
158			1.10.4.5		Markierung	5 Tage	Fre 16.07.27	Don 22.07.27																																																	

Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau
Datum: 07.07.2026
Index 8

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
 Inaktiver Vorgang
 Inaktiver Meilenstein
 Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang
 Nur Dauer
 Manueller Sammelrollup
 Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein


Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Nur Anfang
 Nur Ende
 Externe Vorgänge
 Externer Meilenstein

Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

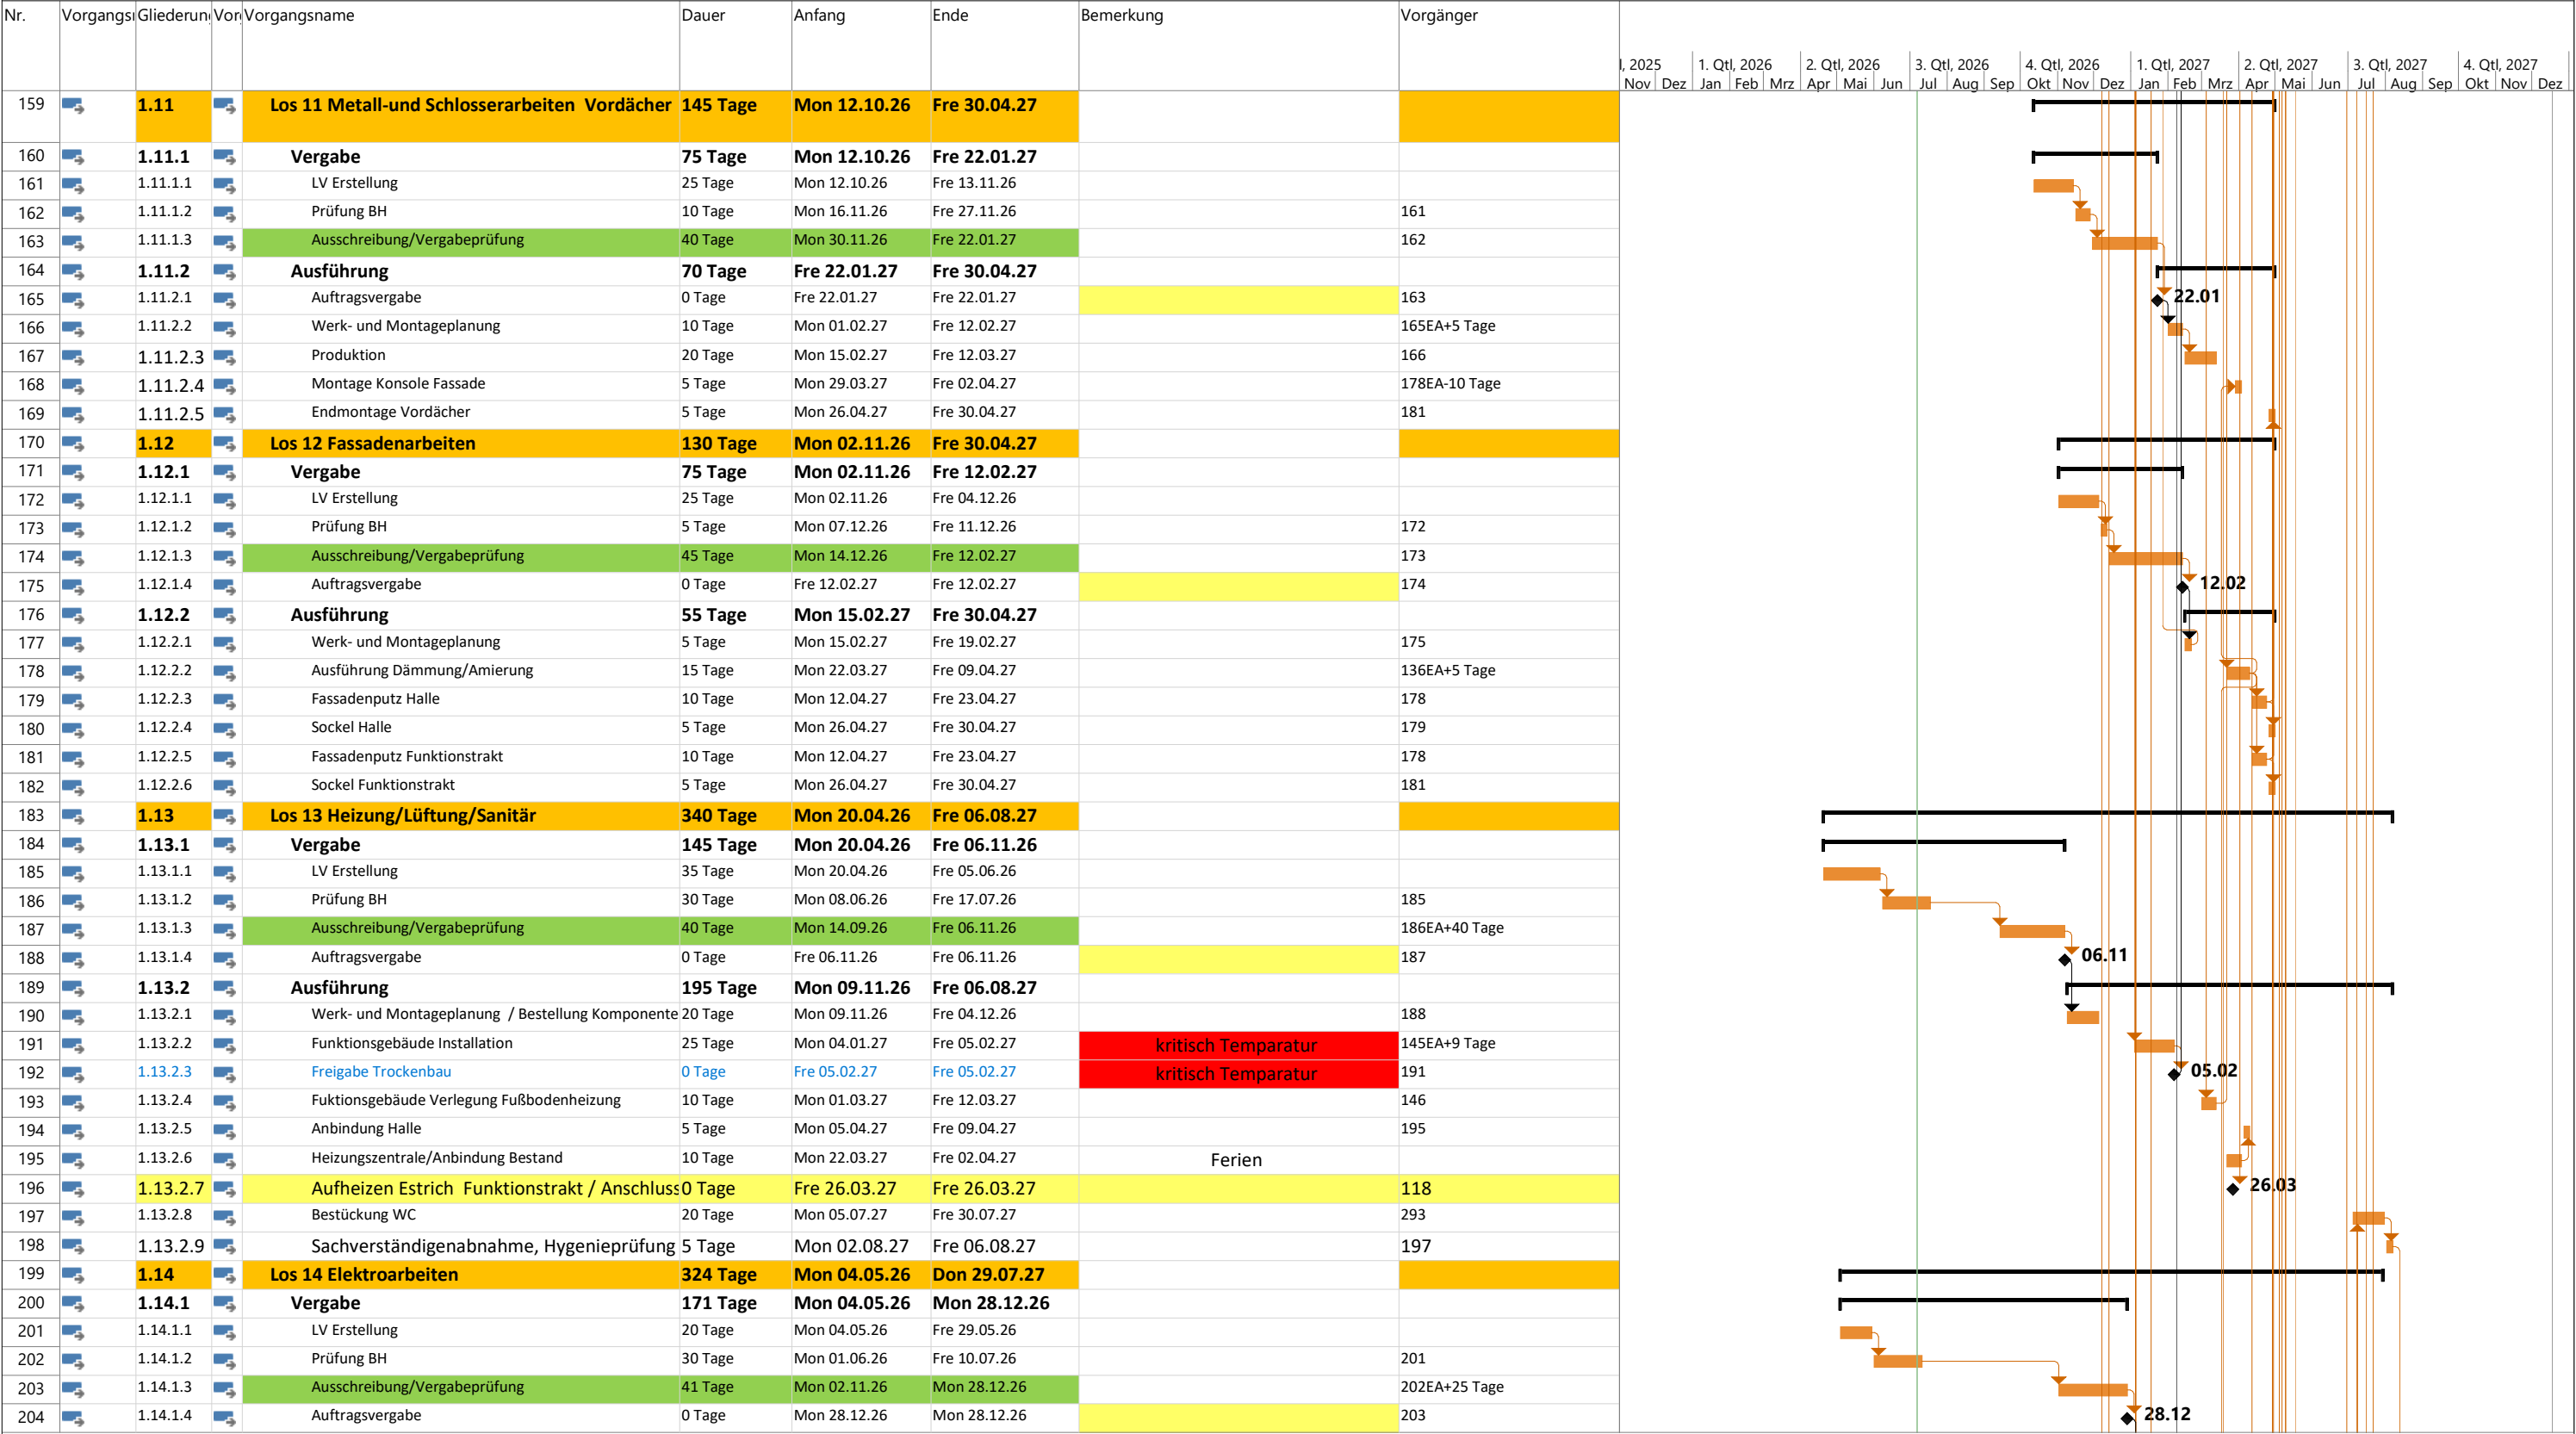

Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau
Datum: 07.07.2026
Index 8

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang


Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein

Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt

↓
—
—

Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

Nr.	Vorgangs- Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bemerkung	Vorgänger																									
								1. 2025 Nov Dez	1. Qtl, 2026 Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2026 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2026 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2026 Okt Nov	1. Qtl, 2027 Dez Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2027 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2027 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2027 Okt Nov Dez																
205	1.14.2	Ausführung	168 Tage	Die 08.12.26	Don 29.07.27																											
206	1.14.2.1	Werk- und Montageplanung / Bestellung Komponente	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27		204EA+5 Tage																									
207	1.14.2.2	Funktionsgtrakt Leitungsverlegung	20 Tage	Die 05.01.27	Mon 01.02.27	kritisch Temperatur	133;145EA+10 Tage																									
208	1.14.2.3	Halle Leitungsverlegung	25 Tage	Die 08.12.26	Mon 11.01.27	kritisch Temperatur	110;99																									
209	1.14.2.4	Funktionstrakt Leitungsverlegung, Leichtbauwände	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27	kritisch Temperatur	145EA+10 Tage																									
210	1.14.2.5	Freigabe Schließung TB Funktionstrakt	0 Tage	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27	kritisch Temperatur	209																									
211	1.14.2.6	Blitzschutzanlage + Außenbeleuchtung	20 Tage	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27		178EA-10 Tage																									
212	1.14.2.7	Hauptverteilung	15 Tage	Mon 05.04.27	Fre 23.04.27		213																									
213	1.14.2.8	Anschluss Bestand	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	Ferien																										
214	1.14.2.9	Ausführung Feinausbau Halle	20 Tage	Fre 02.07.27	Don 29.07.27		157																									
215	1.14.2.10	Ausführung Feinausbau Funktionstrakt	20 Tage	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27		283																									
216	1.15	Los 17 PV Anlage	194 Tage	Mon 07.09.26	Don 03.06.27																											
217	1.15.1	LV Erstellung	25 Tage	Mon 07.09.26	Fre 09.10.26																											
218	1.15.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26		217																									
219	1.15.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Fre 08.01.27	Don 04.03.27																											
220	1.15.4	Auftragsvergabe	0 Tage	Don 04.03.27	Don 04.03.27		219																									
221	1.15.5	Werk/Montageplanung	10 Tage	Fre 19.03.27	Don 01.04.27		220EA+10 Tage																									
222	1.15.6	Lieferzeit	25 Tage	Fre 02.04.27	Don 06.05.27		221																									
223	1.15.7	Aufbau Dach	10 Tage	Fre 07.05.27	Don 20.05.27		222;99																									
224	1.15.8	Anschluss Verteilung/Elektro	10 Tage	Fre 21.05.27	Don 03.06.27		223																									
225	1.16	Los 15 Prallwand	159 Tage	Mon 07.12.26	Don 15.07.27																											
226	1.16.1	Vergabe	55 Tage	Mon 07.12.26	Fre 19.02.27																											
227	1.16.1.1	LV Erstellung	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26																											
228	1.16.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 21.12.26	Fre 25.12.26		227																									
229	1.16.1.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 28.12.26	Fre 19.02.27		228																									
230	1.16.2	Ausführung	104 Tage	Fre 19.02.27	Don 15.07.27																											
231	1.16.2.1	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27		229																									
232	1.16.2.2	Werk/Montageplanung	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27		231																									
233	1.16.2.3	Einbau Halle	10 Tage	Fre 02.07.27	Don 15.07.27		157;277EA+12 Tage																									
234	1.17	Los 16 Ballschutz - und Trennvorhang	140 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.04.27																											
235	1.17.1	Vergabe	15 Tage	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26																											
236	1.17.1.1	LV Erstellung	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26																											
237	1.17.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26		236																									
238	1.17.2	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26		237																									
239	1.17.3	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26		238																									
240	1.17.4	Ausführung	85 Tage	Mon 21.12.26	Fre 16.04.27																											
241	1.17.4.1	Werk/Montageplanung	30 Tage	Mon 21.12.26	Fre 29.01.27		239																									
242	1.17.4.2	Lieferzeitraum	25 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.04.27		243EA-35 Tage																									
243	1.17.4.3	Einbau	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27		232EA+15 Tage																									
244	1.18	Los 18 Tischlerarbeiten Innentüren	190 Tage	Mon 28.09.26	Fre 18.06.27																											
245	1.18.1	Vergabe	60 Tage	Mon 28.09.26	Fre 18.12.26																											
246	1.18.1.1	LV Erstellung	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26																											
247	1.18.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26		246																									
248	1.18.1.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26		247																									
249	1.18.1.4	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26		248																									
250	1.18.2	Ausführung	120 Tage	Mon 04.01.27	Fre 18.06.27																											

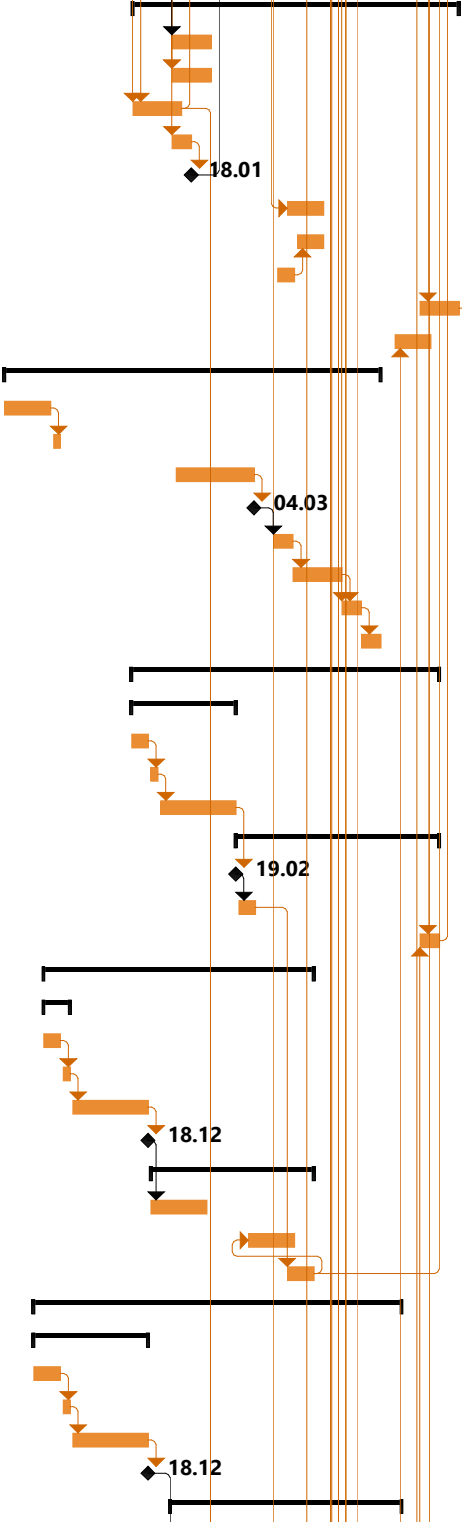


Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau
Datum: 07.07.2026
Index 8


Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang




Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang



Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang



Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein




Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt



Bauablaufplanung
Neubau 2-Feld-Sporthalle
Prenzlau

Nr.	Vorgangs- Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bemerkung	Vorgänger																								
								1. 2025 Nov Dez	1. Qtl, 2026 Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2026 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2026 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2026 Okt Nov Dez	1. Qtl, 2027 Jan Feb Mrz	2. Qtl, 2027 Apr Mai Jun	3. Qtl, 2027 Jul Aug Sep	4. Qtl, 2027 Okt Nov Dez															
251		1.18.2.1	Werk/Montageplanung	10 Tage	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27	249EA+10 Tage																								
252		1.18.2.2	Bestellung	25 Tage	Mon 18.01.27	Fre 19.02.27	251																								
253		1.18.2.3	Einbau Zargen	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	119EA-5 Tage																								
254		1.18.2.4	Einbau Türblätter	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	283																								
255		1.19	Los 19 Fliesen- und Plattenarbeiten	155 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.06.27																									
256		1.19.1	Vergabe	86 Tage	Mon 09.11.26	Mon 08.03.27																									
257		1.19.1.1	LV Erstellung	25 Tage	Mon 09.11.26	Fre 11.12.26																									
258		1.19.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	257																								
259		1.19.1.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	45 Tage	Die 05.01.27	Mon 08.03.27	258EA+11 Tage																								
260		1.19.1.4	Auftragsvergabe	0 Tage	Mon 08.03.27	Mon 08.03.27	259																								
261		1.19.2	Ausführung	69 Tage	Die 09.03.27	Fre 11.06.27																									
262		1.19.2.1	Werk/Montageplanung	10 Tage	Die 09.03.27	Mon 22.03.27	260																								
263		1.19.2.2	Bestellung	20 Tage	Die 23.03.27	Mon 19.04.27	262																								
264		1.19.2.3	Abdichtung, Vorbereitende Maßnahmen	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	147EA+20 Tage																								
265		1.19.2.4	Belag Wand	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27	253																								
266		1.19.2.5	Belag Boden	20 Tage	Mon 10.05.27	Fre 04.06.27	265;119																								
267		1.19.2.6	Verfugung	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	266																								
268		1.20	Los 20 Maler- und Bodenbelagsarbeiten	170 Tage	Mon 02.11.26	Fre 25.06.27																									
269		1.20.1	Vergabe	65 Tage	Mon 02.11.26	Fre 29.01.27																									
270		1.20.1.1	LV Erstellung	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26																									
271		1.20.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	270																								
272		1.20.1.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 07.12.26	Fre 29.01.27	271																								
273		1.20.1.4	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 29.01.27	Fre 29.01.27	272																								
274		1.20.2	Ausführung	105 Tage	Mon 01.02.27	Fre 25.06.27																									
275		1.20.2.1	Werk/Montageplanung	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	273																								
276		1.20.2.2	Wände	104 Tage	Die 02.02.27	Fre 25.06.27																									
277		1.20.2.2.1	Funktionstrakt Wände Spachteln, Anstrich	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27	147;273																								
278		1.20.2.2.	Wände WC Bereich	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27	267																								
279		1.20.2.2.3	Halle Wände oberer Bereich / Oberhalb Prallwand	15 Tage	Die 02.02.27	Mon 22.02.27	kritische Temperaturen/ Ausführung prüfen 208EA+15 Tage																								
280		1.20.2.3	Bodenbelagsarbeiten	90 Tage	Mon 08.02.27	Fre 11.06.27																									
281		1.20.2.3.1	Lieferzeit	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	275																								
282		1.20.2.3.2	Vorbereitend Maßnahmen	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27	119EA+10 Tage																								
283		1.20.2.3.3	Verlegung Bodenbelag, inkl Sockel Funktionstrakt	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	282																								
284		1.21	Los 21 Sanitärtrennwände	215 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.07.27																									
285		1.21.1	Vergabe	55 Tage	Mon 04.01.27	Fre 19.03.27																									
286		1.21.1.1	LV Erstellung	10 Tage	Mon 04.01.27	Fre 15.01.27																									
287		1.21.1.2	Prüfung BH	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	286																								
288		1.21.1.3	Ausschreibung/Vergabeprüfung	40 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.03.27	287																								
289		1.21.1.4	Auftragsvergabe	0 Tage	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27	288																								
290		1.21.2	Ausführung	75 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.07.27																									
291		1.21.2.1	Werk/Montageplanung	5 Tage	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27	289																								
292		1.21.2.2	Lieferzeitraum	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	291																								
293		1.21.2.3	Einbau	5 Tage	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	278;292;267																								
294		1.21.3	Los 22 Außenanlagen	208 Tage	Mon 07.09.26	Mit 23.06.27																									
295		1.21.3.1	Vergabe	61 Tage	Mon 07.09.26	Mon 30.11.26																									
296		1.21.3.1.1	LV Erstellung	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26																									

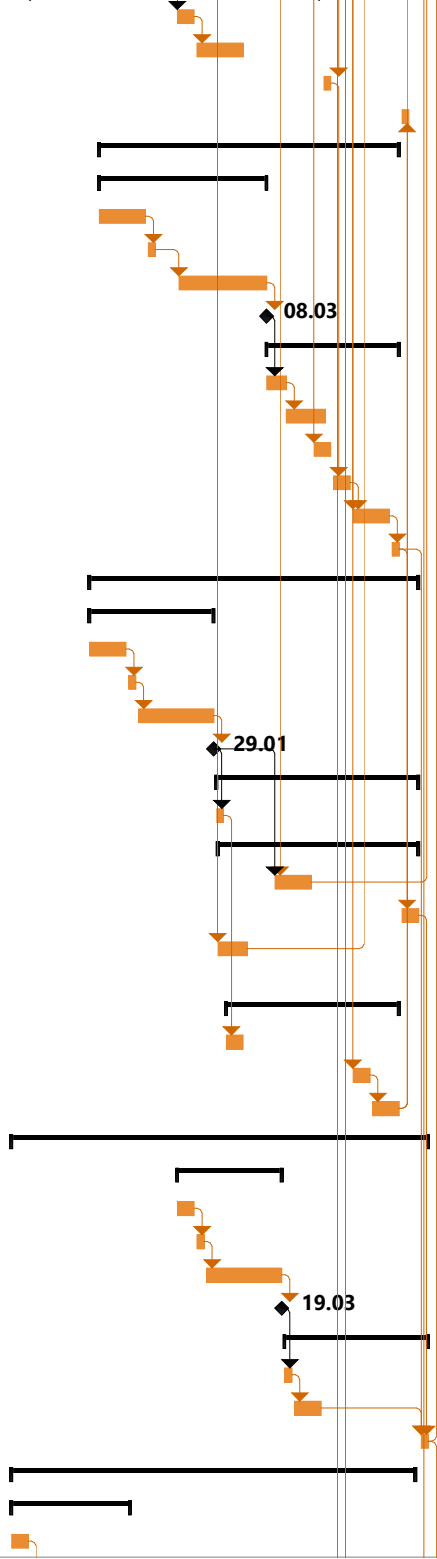

Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau
Datum: 07.07.2026
Index 8

Vorgang
Unterbrechung
Meilenstein
Sammelvorgang

Projektsammelvorgang
Inaktiver Vorgang
Inaktiver Meilenstein
Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang
Nur Dauer
Manueller Sammelrollup
Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang
Nur Ende
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein

Stichtag
In Arbeit
Manueller Fortschritt

↓
—
—

Bauablaufplanung

Neubau 2-Feld-Sporthalle

Prenzlau

Nr.	Vorgangs- Gliederung	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Bemerkung	Vorgänger	Gantt-Diagramm																									
								3. Qtl, 2025		1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027			4. Qtl, 2027		
								Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
297		1.21.3.1.2		Prüfung BH	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26																										
298		1.21.3.1.3		Ausschreibung/Vergabeprüfung	46 Tage	Mon 28.09.26	Mon 30.11.26																										
299		1.21.3.1.4		Auftragsvergabe	0 Tage	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26																										
300		1.21.3.2		Ausführung	103 Tage	Mon 01.02.27	Mit 23.06.27																										
301		1.21.3.2.1		Werk und Montageplanung	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27																										
302		1.21.3.2.2		Umsetzung	40 Tage	Don 29.04.27	Mit 23.06.27																										
303		1.22		Lospaket 3 Einrichtung/Ausstattung	185 Tage	Mon 05.04.27	Fre 17.12.27																										
304		1.22.1		Ausschreibung	55 Tage	Mon 05.04.27	Fre 18.06.27																										
305		1.22.2		Umsetzung	120 Tage	Mon 21.06.27	Fre 03.12.27																										
306		1.22.3		Behördliche Abnahmen	55 Tage	Fre 18.06.27	Fre 03.09.27																										
307		1.22.3.1		Sicherheitsbeleuchtung/BMA	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27																										
308		1.22.3.2		GEG	20 Tage	Mon 12.07.27	Fre 06.08.27																										
309		1.22.3.3		Brandschutz	20 Tage	Mon 09.08.27	Fre 03.09.27																										
310		1.22.3.4		Statik	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27																										
311		1.22.3.5		Hygiene	25 Tage	Mon 21.06.27	Fre 23.07.27																										
312		1.22.3.6		Schornsteinfeger	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27																										
313		1.22.3.7		Bauordnungsamt	0 Tage	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27																										
314		1.22.4		Fertigstellung /Einzug	10 Tage	Mon 06.12.27	Fre 17.12.27																										
315		1.22.5		Nutzungsaufnahme	0 Tage	Fre 17.12.27	Fre 17.12.27																										
316		1.22.6		Abnahme KG 300	0 Tage	Fre 02.07.27	Fre 02.07.27																										
317		1.22.7		Abnahme KG 400	0 Tage	Fre 06.08.27	Fre 06.08.27																										
318		1.22.8		Abnahme KG 500	0 Tage	Mit 23.06.27	Mit 23.06.27																										

Projekt: Neubau 2-Feld-Sporthalle Prenzlau Datum: 07.07.2026 Index 8	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
