


INF 6670 VZM Umbau Steril.Abt. und Unit Dose

RAHMENTERMINPLANStand 03.12.2025 (**Vorabzug**)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	H2	2026	H1	H2	2027	H1	H2	2028	H1	H2
1	INF 6670 VZM Umbau Sterilabteilung														
2	Planung / Ausführung	655 Tage	Mit 12.11.25	Fre 14.07.28											
3	Vorbereitung Ausschreibung Generalplaner	50 Tage	Mit 12.11.25	Mit 21.01.26											
4	Vergabe Fachplanung (Brandschutz, Schadstoffe, Statik)	30 Tage	Don 22.01.26	Mit 04.03.26 3											
5	Vergabe Generalplaner	90 Tage	Don 22.01.26	Mit 03.06.26 3											
6	LPH 1 - 3 (Grundlageermittlung + Vorplanung + Entwurfsplanung)	80 Tage	Fre 12.06.26	Don 01.10.26 5EA+5 Tage											
7	LPH 4 (Genehmigungsplanung / Bauantrag)	90 Tage	Fre 16.10.26	Mon 08.03.27 6EA+10 Tage											
8	LPH 5 (Ausführungsplanung)	60 Tage	Fre 16.10.26	Mon 25.01.27 6EA+10 Tage											
9	Vergabe Fachplanung (SiGeKo)	15 Tage	Fre 02.10.26	Don 22.10.26 8AA-10 Tage											
10	LPH 6 - 7 (Ausschreibung + Vergabe)	90 Tage	Die 26.01.27	Mon 07.06.27 8											
11	LPH 8 (Objektüberwachung / Bauausführung + Qualifizierung und Inbetriebnahme)	330 Tage	Die 12.01.27	Die 16.05.28 8EA-10 Tage											
12	LPH 9 (Dokumentation)	30 Tage	Don 01.06.28	Fre 14.07.28 11EA+10 Tage											
13															
14	INF 6667 ZHAIL Unit Dose Versorgungseinheit														
15	Planung / Ausführung	495 Tage	Mit 12.11.25	Die 09.11.27											
16	Vorbereitung Ausschreibung Generalplaner	50 Tage	Mit 12.11.25	Mit 21.01.26											
17	Vergabe Fachplanung (Brandschutz, Statik)	30 Tage	Don 22.01.26	Mit 04.03.26 16											
18	Vergabe Generalplaner	90 Tage	Don 22.01.26	Mit 03.06.26 16											
19	LPH 1 - 3 (Grundlageermittlung + Vorplanung + Entwurfsplanung)	50 Tage	Fre 12.06.26	Don 20.08.26 18EA+5 Tage											
20	LPH 4 (Genehmigungsplanung / Bauantrag)	90 Tage	Fre 04.09.26	Mon 25.01.27 19EA+10 Tage											
21	LPH 5 (Ausführungsplanung)	50 Tage	Fre 04.09.26	Don 12.11.26 19EA+10 Tage											
22	Vergabe Fachplanung (SiGeKo)	15 Tage	Fre 21.08.26	Don 10.09.26 21AA-10 Tage											
23	LPH 6 - 7 (Ausschreibung + Vergabe)	90 Tage	Fre 13.11.26	Mit 07.04.27 21											
24	LPH 8 (Objektüberwachung / Bauausführung + Qualifizierung und Inbetriebnahme)	210 Tage	Fre 30.10.26	Mon 13.09.27 21EA-10 Tage											
25	LPH 9 (Dokumentation)	30 Tage	Die 28.09.27	Die 09.11.27 24EA+10 Tage											

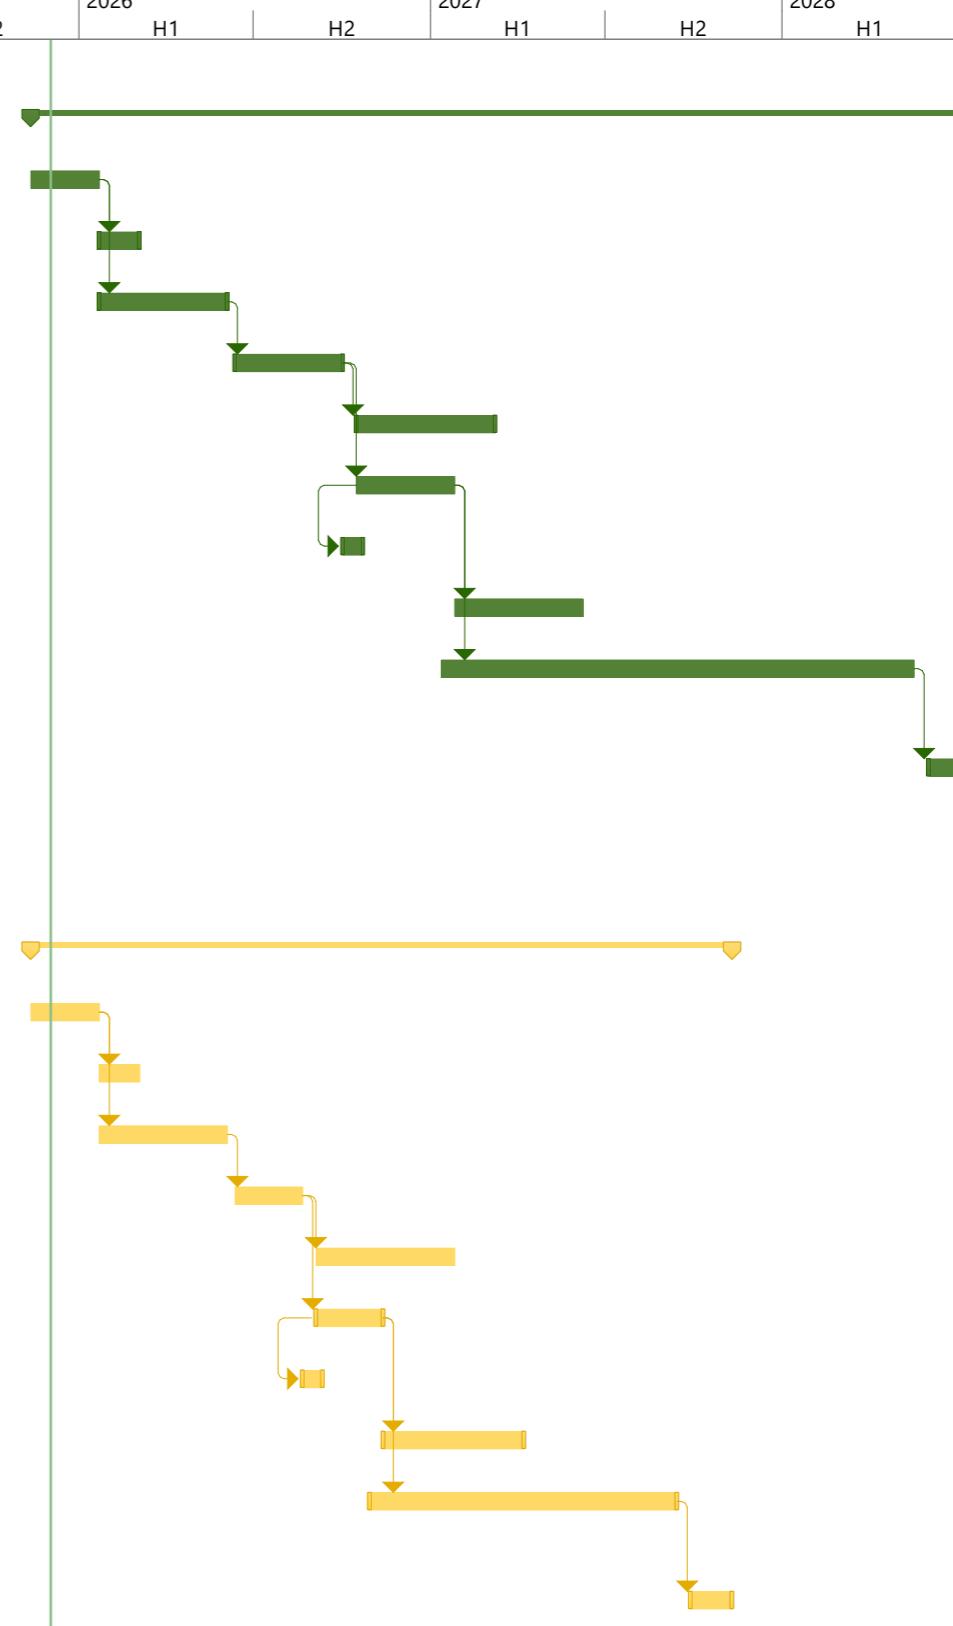

RAHMENTERMINPLAN
Stand 03.12.2025 (**Vorabzug**)

