

Nr.	 Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	1 GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald	468 Tage	Mo 01.09.25	Mi 30.06.27	
2	1.1 Gebäudehülle	423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27	
3	1.1.1 BE 1_Baustelleneinrichtung 1 (BL Trapez/BMU)	423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27	
4	 1.1.1.1 Bauzaun, Bauschild	5 Tage	Mo 01.09.25	Fr 05.09.25	
5	 1.1.1.2 Standzeit bis Rückbau Bauzaun	414 Tage	Mo 01.09.25	Do 15.04.27	
6	 1.1.1.3 Containerstellung und Einrichtung Conatiner Bauleitung , Sanitär- und Duschen	3 Tage	Mo 01.09.25	Mi 03.09.25	
7	 1.1.1.4 Standzeit bis Rückbau Conatiner Bauleitunge , Sanitär- und Duschen	420 Tage	Do 04.09.25	Mi 28.04.27	6
8	1.1.2 BE 2_Baustelleneinrichtung 2 (BL Gtec/GmG)	340 Tage	Mo 01.09.25	Fr 01.01.27	
9	 1.1.2.1 Einrichtung Bauwasser	320 Tage	Mo 01.09.25	Fr 04.12.26	
10	 1.1.2.2 Einrichtung Baustromverteiler usw.	335 Tage	Mo 08.09.25	Fr 01.01.27	4
11	1.1.3 ROH_ Erdbau, Grundleitungen, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten	285 Tage	Mo 08.09.25	Fr 23.10.26	
12	1.1.3.1 Erdbau inkl. Erdbau Sohle und Grundleitungen Gebäude/Containerversorgung	25 Tage	Mo 08.09.25	Fr 10.10.25	4
13	1.1.3.2 Sohle_ Schalung, Dämmung, Bewehrung, Beton, Blitzschutzeinbauten	20 Tage	Mo 13.10.25	Fr 07.11.25	12
14	1.1.3.3 Wände EG	20 Tage	Mo 10.11.25	Fr 05.12.25	13
15	1.1.3.4 Stahlbetondecke zum 1. OG	15 Tage	Mo 08.12.25	Fr 06.03.26	14
16	1.1.3.5 1.BA Achse 7-13 (Beschleunigung nach SW)	80 Tage	Mo 23.02.26	Fr 12.06.26	
17	1.1.3.5.1 1.OG	30 Tage	Mo 23.02.26	Fr 03.04.26	
18	 1.1.3.5.1.1 Wände 4 Takte	15 Tage	Mo 23.02.26	Fr 13.03.26	
19	 1.1.3.5.1.2 Schwerlastgerüst Kragdecke	5 Tage	Mo 09.03.26	Fr 13.03.26	
20	1.1.3.5.1.3 Schalung Decke	10 Tage	Mo 16.03.26	Fr 27.03.26	18
21	1.1.3.5.1.4 Bewehrung Decke	6 Tage	Do 26.03.26	Do 02.04.26	20EA-2 Tage
22	1.1.3.5.1.5 Beton Decke	1 Tag	Fr 03.04.26	Fr 03.04.26	21
23	1.1.3.5.2 2.OG	50 Tage	Mo 06.04.26	Fr 12.06.26	
24	1.1.3.5.2.1 Wände 4 Takte	15 Tage	Mo 06.04.26	Fr 24.04.26	22
25	1.1.3.5.2.2 Schalung Decke Achse C-F	10 Tage	Mo 27.04.26	Fr 08.05.26	24
26	1.1.3.5.2.3 Bewehrung Decke Achse C-F	5 Tage	Mo 11.05.26	Fr 15.05.26	25
27	1.1.3.5.2.4 Beton Decke Achse C-F	1 Tag	Mo 18.05.26	Mo 18.05.26	26
28	1.1.3.5.2.5 Wand Achse C, Stahlträger+Schalung Decke Achse A-C	10 Tage	Di 19.05.26	Mo 01.06.26	27
29	1.1.3.5.2.6 Bewehrung Decke Achse A-C	4 Tage	Di 02.06.26	Fr 05.06.26	28
30	1.1.3.5.2.7 Beton Decke Achse A-C	1 Tag	Mo 08.06.26	Mo 08.06.26	29
31	1.1.3.5.2.8 Attika	4 Tage	Di 09.06.26	Fr 12.06.26	30
32	1.1.3.6 2.BA Achse 1-7 (Beschleunigung nach SW)	80 Tage	Mo 16.03.26	Fr 03.07.26	
33	1.1.3.6.1 1.OG	30 Tage	Mo 16.03.26	Fr 24.04.26	
34	1.1.3.6.1.1 Wände 4 Takte	15 Tage	Mo 16.03.26	Fr 03.04.26	18
35	 1.1.3.6.1.2 Schwerlastgerüst Kragdecke	5 Tage	Mo 30.03.26	Fr 03.04.26	
36	1.1.3.6.1.3 Schalung Decke	10 Tage	Mo 06.04.26	Fr 17.04.26	34
37	1.1.3.6.1.4 Bewehrung Decke	6 Tage	Do 16.04.26	Do 23.04.26	36EA-2 Tage
38	1.1.3.6.1.5 Beton Decke	1 Tag	Fr 24.04.26	Fr 24.04.26	37
39	1.1.3.6.2 2.OG	50 Tage	Mo 27.04.26	Fr 03.07.26	
40	1.1.3.6.2.1 Wände 4 Takte	15 Tage	Mo 27.04.26	Fr 15.05.26	38
41	1.1.3.6.2.2 Schalung Decke Achse C-F	10 Tage	Mo 18.05.26	Fr 29.05.26	40
42	1.1.3.6.2.3 Bewehrung Decke Achse C-F	5 Tage	Mo 01.06.26	Fr 05.06.26	41
43	1.1.3.6.2.4 Beton Decke Achse C-F	1 Tag	Mo 08.06.26	Mo 08.06.26	42
44	1.1.3.6.2.5 Wand Achse C, Stahlträger+Schalung Decke Achse A-C	10 Tage	Di 09.06.26	Mo 22.06.26	43
45	1.1.3.6.2.6 Bewehrung Decke Achse A-C	4 Tage	Di 23.06.26	Fr 26.06.26	44
46	1.1.3.6.2.7 Beton Decke Achse A-C	1 Tag	Mo 29.06.26	Mo 29.06.26	45
47	1.1.3.6.2.8 Attika	4 Tage	Di 30.06.26	Fr 03.07.26	46
48	1.1.3.7 Blitzschutzarbeiten begleitend Rohbauarbeiten (im Bauhauptgewerk als Leistung enthalt	110 Tage	Mo 13.10.25	Fr 27.03.26	12
49	1.1.3.8 Bau NEAgebäude_ Erdbau- und Rohbauarbeiten	20 Tage	Mo 06.07.26	Fr 31.07.26	47
50	1.1.3.9 Blitzschutz auf Dachdeckung (Fangstangen usw.)	10 Tage	Mo 12.10.26	Fr 23.10.26	77
51	1.1.4 GER_ Gerüstbauarbeiten	296 Tage	Mo 10.11.25	Mo 11.01.27	
52	1.1.4.1 Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl.Auf- und Umbauarbeiten	100 Tage	Mo 10.11.25	Fr 10.04.26	13
53	1.1.4.2 Gerüstbauarbeiten, Ausleger abschnittsweise für Fassadenarbeiten entfernen	60 Tage	Mo 13.04.26	Fr 03.07.26	52
54	1.1.4.3 Rückbau Fassadengerüste	8 Tage	Do 31.12.26	Mo 11.01.27	89;77;78
55	1.1.5 MET_FES_Fenster, Pfostenriegelfassaden, Dachoberlichter	260 Tage	Mo 20.10.25	Fr 30.10.26	
56	 1.1.5.1 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrungsplanung inkl Prüfung Trapez A	80 Tage	Mo 20.10.25	Fr 20.02.26	
57	1.1.5.2 Montage Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen	25 Tage	Mo 06.07.26	Fr 07.08.26	47
58	 1.1.5.3 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden EG	3 Tage	Mo 09.03.26	Do 12.03.26	59AE
59	1.1.5.4 Fertigung Fenster EG	35 Tage	Do 12.03.26	Do 30.04.26	62AE
60	 1.1.5.5 Montage Fenster EG	20 Tage	Do 02.07.26	Mi 29.07.26	46EA+2 Tage
61	1.1.5.6 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 1	3 Tage	Mo 27.04.26	Do 30.04.26	62AE
62	1.1.5.7 Fertigung Fenster OG 1	35 Tage	Do 30.04.26	Do 18.06.26	65AE
63	1.1.5.8 Montage Fenster OG 1	20 Tage	Do 16.07.26	Mi 12.08.26	60EA-10 Tage
64	1.1.5.9 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 2	3 Tage	Do 06.08.26	Mo 10.08.26	65
65	1.1.5.10 Fertigung Fenster OG 2	35 Tage	Do 18.06.26	Do 06.08.26	66AE
66	1.1.5.11 Montage Fenster OG 2	15 Tage	Do 06.08.26	Mi 26.08.26	63EA-5 Tage
67	 1.1.5.12 Montage P-R-Fassaden 2.OG, 1.OG, EG	50 Tage	Do 30.07.26	Mi 07.10.26	82AA
68	 1.1.5.13 Montage Attika	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26	
69	 1.1.5.14 Montage Windfang	10 Tage	Mo 21.09.26	Fr 02.10.26	68
70	 1.1.5.15 Montage Türen	10 Tage	Do 16.07.26	Do 30.07.26	82AE
71	1.1.5.16 Restleistungen	20 Tage	Mo 05.10.26	Fr 30.10.26	69
72	1.1.6 Dachdeckerarbeiten	151 Tage	Mi 03.06.26	Mi 30.12.26	
73	1.1.6.1 Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mi 03.06.26	Mi 17.06.26	75AE
74	1.1.6.2 Einbau RA Elemente	3 Tage	Di 30.06.26	Do 02.07.26	46

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
75		1.1.6.3 Abdichtung Dach (Notdach)	15 Tage	Mi 17.06.26	Di 07.07.26	31EA+2 Tage
76		1.1.6.4 Anarbeitung Oberlichter	5 Tage	Mo 10.08.26	Fr 14.08.26	75;57
77		1.1.6.5 Dämmung,Gründachaufbau, Sekuranten, sonstige Einbauen	40 Tage	Mo 17.08.26	Fr 09.10.26	76
78		1.1.6.6 Attikableche und Unterkonstruktion	10 Tage	Do 17.12.26	Mi 30.12.26	77;89EA-5 Tage
79		1.1.7 Verblendmauerwerksarbeiten	168 Tage	Mo 02.03.26	Mi 21.10.26	
80		1.1.7.1 Werkplanung, Statik, Prüfung	20 Tage	Mo 02.03.26	Fr 27.03.26	
81		1.1.7.2 Materiallauf	20 Tage	Do 02.07.26	Do 30.07.26	82AE
82		1.1.7.3 UK, Dämmung+ Verblend EG	30 Tage	Do 30.07.26	Mi 09.09.26	60
83		1.1.7.4 UK, Dämmung+ Verblend OG 1	30 Tage	Do 10.09.26	Mi 21.10.26	63;82
84		1.1.8 Hinterlüftete Fassade 2. Obergeschoss und Fassade Haupttreppenhaus	213 Tage	Mo 02.03.26	Mi 23.12.26	
85		1.1.8.1 Werkplanung, Statik, Prüfung	40 Tage	Mo 02.03.26	Fr 24.04.26	
86		1.1.8.2 Aufmaß, Übernahme in WP	15 Tage	Do 27.08.26	Mi 16.09.26	87AE;66
87		1.1.8.3 Materiallauf	20 Tage	Do 10.09.26	Mi 07.10.26	88AE+5 Tage
88		1.1.8.4 Unterkonstruktionen+Dämmung 2. Obergeschoss 4 Fassaden, 1 Geschoss + Haupttrepp	30 Tage	Do 01.10.26	Mi 11.11.26	66;83EA-15 Tage
89		1.1.8.5 Blechbekleidung alle Fassaden 2. OG + Treppenhaus	30 Tage	Do 12.11.26	Mi 23.12.26	88
90		1.1.9 Baudicht	1 Tag	Do 27.08.26	Do 27.08.26	75;66;74;57
91						
92		1.2 Gebäudeausbau	237 Tage	Mi 03.06.26	Do 29.04.27	
93		1.2.1 2.Obergeschoss	135 Tage	Fr 28.08.26	Do 04.03.27	
94		1.2.1.1 Hochbau 2.OG 1 (BL Trapez/BMU)	15 Tage	Fr 28.08.26	Do 17.09.26	
95		1.2.1.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Fr 28.08.26	Do 17.09.26	90
96		1.2.1.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	31 Tage	Di 08.09.26	Di 20.10.26	
97		1.2.1.2.1 Sanitär	3 Tage	Di 08.09.26	Do 10.09.26	142
98		1.2.1.2.2 Heizung	2 Tage	Fr 11.09.26	Mo 14.09.26	143
99		1.2.1.2.3 Lüftung	6 Tage	Di 13.10.26	Di 20.10.26	144
100		1.2.1.2.4 Elektro Trassenbau	3 Tage	Fr 11.09.26	Di 15.09.26	145
101		1.2.1.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	3 Tage	Mo 21.09.26	Mi 23.09.26	146
102		1.2.1.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Mi 30.09.26	Di 06.10.26	147
103		1.2.1.3 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG)	128 Tage	Di 08.09.26	Do 04.03.27	
104		1.2.1.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Di 08.09.26	Mo 21.09.26	95EA-8 Tage
105		1.2.1.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Fr 18.09.26	Mo 05.10.26	95
106		1.2.1.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Fr 18.09.26	Do 15.10.26	95
107		1.2.1.3.4 Trassenbau Doppelboden	20 Tage	Di 08.09.26	Mo 05.10.26	95EA-8 Tage
108		1.2.1.3.5 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 2.OG (Schächte inkl. Stahlebenen)	50 Tage	Fr 27.11.26	Do 04.02.27	113
109		1.2.1.3.6 Dachaufbauten	20 Tage	Fr 05.02.27	Do 04.03.27	108
110		1.2.1.4 Hochbau 2.OG 2 (BL Trapez/BMU)	133 Tage	Di 01.09.26	Do 04.03.27	
111		1.2.1.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Fr 16.10.26	Do 05.11.26	104EA-5 Tage;105
112		1.2.1.4.2 DOP- Doppel- und Hohlrumböden_ Einzeichnen Raster auf Rohböden	5 Tage	Di 08.09.26	Mo 14.09.26	107AA
113		1.2.1.4.3 DOP_ Doppel- und Holraumböden	20 Tage	Fr 30.10.26	Do 26.11.26	111EA-5 Tage
114		1.2.1.4.4 EST_nur Duschbereiche	5 Tage	Fr 27.11.26	Do 03.12.26	113;106;115
115		1.2.1.4.5 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Di 22.09.26	Mo 05.10.26	104
116		1.2.1.4.6 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	10 Tage	Fr 04.12.26	Do 17.12.26	114
117		1.2.1.4.7 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlfassungsargen	10 Tage	Fr 27.11.26	Do 10.12.26	111;113
118		1.2.1.4.8 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Fr 27.11.26	Di 08.12.26	111;113
119		1.2.1.4.9 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Fr 27.11.26	Di 08.12.26	111;113
120		1.2.1.4.10 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Fr 27.11.26	Do 24.12.26	113
121		1.2.1.4.11 Maler	118 Tage	Di 01.09.26	Do 11.02.27	
122		1.2.1.4.11.1 staubbindende Anstriche Decke/Wände HT-Räume	5 Tage	Do 08.10.26	Mi 14.10.26	67
123		1.2.1.4.11.2 Bodenanstrich HT-Räume (so spät wie möglich)	5 Tage	Fr 05.02.27	Do 11.02.27	108
124		1.2.1.4.11.3 staubbindender Anstrich vor Doppelböden	5 Tage	Di 01.09.26	Di 08.09.26	107AE
125		1.2.1.4.11.4 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich	15 Tage	Fr 25.12.26	Do 14.01.27	111;120
126		1.2.1.4.12 BOD_Bodenleger	15 Tage	Fr 08.01.27	Do 28.01.27	111EA+20 Tage;11
127		1.2.1.4.13 TIS_Tischlereinbauten (3 Stück Akustikwände)	25 Tage	Fr 27.11.26	Do 31.12.26	113
128		1.2.1.4.14 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Fr 15.01.27	Do 21.01.27	125
129		1.2.1.4.15 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff	5 Tage	Fr 29.01.27	Do 04.02.27	125;126
130		1.2.1.4.16 Endreinigung 2. Obergeschoss	5 Tage	Fr 26.02.27	Do 04.03.27	133;134;135;126;1
131		1.2.1.5 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG)	103 Tage	Di 06.10.26	Do 25.02.27	
132		1.2.1.5.1 RLT_ Endausbau	20 Tage	Fr 29.01.27	Do 25.02.27	126
133		1.2.1.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Fr 29.01.27	Do 25.02.27	126
134		1.2.1.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Fr 29.01.27	Do 25.02.27	126
135		1.2.1.5.4 HLSE_Endausbau	20 Tage	Fr 29.01.27	Do 25.02.27	126
136		1.2.1.5.5 Klimadecken	30 Tage	Fr 27.11.26	Do 07.01.27	113
137		1.2.1.5.6 ELT- Ausbau Serverräume	50 Tage	Di 06.10.26	Mo 14.12.26	112;107
138		1.2.2 1.Obergeschoss	123 Tage	Do 03.09.26	Mo 22.02.27	
139		1.2.2.1 Hochbau 1.OG 1 (BL Trapez/BMU)	15 Tage	Fr 18.09.26	Do 08.10.26	
140		1.2.2.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Fr 18.09.26	Do 08.10.26	95
141		1.2.2.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	28 Tage	Do 03.09.26	Mo 12.10.26	
142		1.2.2.2.1 Sanitär	3 Tage	Do 03.09.26	Mo 07.09.26	185
143		1.2.2.2.2 Heizung	3 Tage	Di 08.09.26	Do 10.09.26	186
144		1.2.2.2.3 Lüftung	7 Tage	Fr 02.10.26	Mo 12.10.26	187
145		1.2.2.2.4 Elektro Trassenbau	1 Tag	Do 10.09.26	Do 10.09.26	188
146		1.2.2.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	3 Tage	Mi 16.09.26	Fr 18.09.26	189
147		1.2.2.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Mi 23.09.26	Di 29.09.26	190
148		1.2.2.3 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG)	75 Tage	Di 29.09.26	Mo 11.01.27	

Nr.	 Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
149	1.2.2.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Di 29.09.26	Mo 12.10.26	140EA-8 Tage
150	1.2.2.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Fr 09.10.26	Mo 26.10.26	140
151	1.2.2.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Fr 09.10.26	Do 05.11.26	140
152	1.2.2.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung	30 Tage	Di 29.09.26	Mo 09.11.26	140EA-8 Tage
153	1.2.2.3.5 ELT mit Bodentanks	12 Tage	Di 29.09.26	Mi 14.10.26	140EA-8 Tage
154	1.2.2.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 1.OG (Schächte inkl. Stahlebenen)	20 Tage	Di 15.12.26	Mo 11.01.27	158
155	1.2.2.4 Hochbau 1.OG 2 (BL Trapez/BMU)	95 Tage	Di 13.10.26	Mo 22.02.27	
156	1.2.2.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Di 03.11.26	Mo 23.11.26	150EA-5 Tage;152
157	1.2.2.4.2 EST_Estrich	15 Tage	Di 17.11.26	Mo 07.12.26	156EA-5 Tage;152
158	1.2.2.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit	5 Tage	Di 08.12.26	Mo 14.12.26	157
159	1.2.2.4.4 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Di 13.10.26	Mo 26.10.26	149
160	1.2.2.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	15 Tage	Di 12.01.27	Mo 01.02.27	158EA+20 Tage
161	1.2.2.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlfassungsargen	10 Tage	Di 15.12.26	Mo 28.12.26	156;159;158
162	1.2.2.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Di 15.12.26	Do 24.12.26	158
163	1.2.2.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Di 15.12.26	Do 24.12.26	158
164	1.2.2.4.9 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Di 15.12.26	Mo 11.01.27	158
165	1.2.2.4.10 Maler	78 Tage	Do 15.10.26	Mo 01.02.27	
166	1.2.2.4.10.1 staubbindende Anstriche Decke/Wände HT-Räume	5 Tage	Do 15.10.26	Mi 21.10.26	122
167	1.2.2.4.10.2 Bodenanstich HT-Räume (so spät wie möglich)	5 Tage	Di 12.01.27	Mo 18.01.27	154
168	1.2.2.4.10.3 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstich	15 Tage	Di 12.01.27	Mo 01.02.27	164
169	1.2.2.4.11 BOD_Bodenleger	15 Tage	Fr 29.01.27	Do 18.02.27	156;158EA+25 Tag
170	1.2.2.4.12 TIS_Tischlereinbauten	8 Tage	Fr 05.02.27	Di 16.02.27	169EA-10 Tage
171	1.2.2.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Di 02.02.27	Mo 08.02.27	168
172	1.2.2.4.14 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff	5 Tage	Di 02.02.27	Mo 08.02.27	168
173	1.2.2.4.15 Endreinigung 1. Obergeschoss	5 Tage	Di 16.02.27	Mo 22.02.27	176;177;179;168
174	1.2.2.5 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG)	38 Tage	Do 31.12.26	Mo 22.02.27	
175	1.2.2.5.1 RLT-_Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	164EA+5 Tage
176	1.2.2.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	164EA+5 Tage
177	1.2.2.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	164EA+5 Tage
178	1.2.2.5.4 Klimadecken	30 Tage	Di 12.01.27	Mo 22.02.27	164
179	1.2.2.5.5 HLSE_Endausbau	20 Tage	Do 31.12.26	Mi 27.01.27	164EA-8 Tage
180	1.2.3 Erdgeschoss	205 Tage	Mi 03.06.26	Di 16.03.27	
181	1.2.3.1 Hochbau EG 1 (BL Trapez/BMU)	107 Tage	Mi 03.06.26	Do 29.10.26	
182	1.2.3.1.1 DCH_Abklebung Sohle	10 Tage	Mi 03.06.26	Mi 17.06.26	75AE
183	1.2.3.1.2 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Fr 09.10.26	Do 29.10.26	182EA-5 Tage;140
184	1.2.3.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	25 Tage	Fr 28.08.26	Do 01.10.26	
185	1.2.3.2.1 Sanitär	4 Tage	Fr 28.08.26	Mi 02.09.26	90
186	1.2.3.2.2 Heizung	3 Tage	Do 03.09.26	Mo 07.09.26	185
187	1.2.3.2.3 Lüftung	7 Tage	Mi 23.09.26	Do 01.10.26	190
188	1.2.3.2.4 Elektro Trassenbau	2 Tage	Di 08.09.26	Mi 09.09.26	186
189	1.2.3.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	4 Tage	Do 10.09.26	Di 15.09.26	188
190	1.2.3.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Mi 16.09.26	Di 22.09.26	189
191	1.2.3.3 HLSE Grundausbau (BL Gtec/GmG) von oben nach unten	162 Tage	Mi 17.06.26	Do 28.01.27	
192	1.2.3.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Fr 30.10.26	Do 12.11.26	183
193	 1.2.3.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Do 01.10.26	Fr 16.10.26	183
194	1.2.3.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Fr 30.10.26	Do 26.11.26	183
195	1.2.3.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung	20 Tage	Mi 17.06.26	Di 14.07.26	182
196	1.2.3.3.5 ELT mit Bodentanks	15 Tage	Mi 17.06.26	Di 07.07.26	182
197	1.2.3.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte EG (Schächte inkl. Stahlebenen)	20 Tage	Fr 01.01.27	Do 28.01.27	201
198	1.2.3.4 Hochbau EG 2 (BL Trapez/BMU)	104 Tage	Do 22.10.26	Di 16.03.27	
199	1.2.3.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Fr 20.11.26	Do 10.12.26	193EA-5 Tage;194
200	1.2.3.4.2 EST_Estrich	15 Tage	Fr 04.12.26	Do 24.12.26	182EA-5 Tage;199
201	1.2.3.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit	5 Tage	Fr 25.12.26	Do 31.12.26	200
202	1.2.3.4.4 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Fr 13.11.26	Do 26.11.26	192
203	1.2.3.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	15 Tage	Fr 29.01.27	Do 18.02.27	201EA+20 Tage
204	1.2.3.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlfassungsargen	10 Tage	Fr 08.01.27	Do 21.01.27	201EA+5 Tage
205	1.2.3.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Fr 08.01.27	Di 19.01.27	201EA+5 Tage
206	1.2.3.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Fr 08.01.27	Di 19.01.27	201EA+5 Tage
207	1.2.3.4.9 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Fr 01.01.27	Do 28.01.27	201
208	1.2.3.4.10 Maler	86 Tage	Do 22.10.26	Do 18.02.27	
209	1.2.3.4.10.1 staubbindende Anstriche Decke/Wände HT-Räume	5 Tage	Do 22.10.26	Mi 28.10.26	166
210	1.2.3.4.10.2 Bodenanstich HT-Räume (so spät wie möglich)	5 Tage	Fr 29.01.27	Do 04.02.27	197
211	1.2.3.4.10.3 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstich	15 Tage	Fr 29.01.27	Do 18.02.27	207
212	1.2.3.4.11 BOD_Bodenleger	15 Tage	Fr 05.02.27	Do 25.02.27	200EA+30 Tage
213	1.2.3.4.12 TIS_Tischlereinbauten	8 Tage	Fr 26.02.27	Di 09.03.27	212
214	1.2.3.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Fr 19.02.27	Do 25.02.27	211
215	1.2.3.4.14 TRO_Einbau Türblätter_ Holzwerkstofftüren	5 Tage	Fr 26.02.27	Do 04.03.27	211;212
216	1.2.3.4.15 END- Endreinigung Erdgeschoss	5 Tage	Mi 10.03.27	Di 16.03.27	219;220;222;211;2
217	1.2.3.5 HLSE Endausbau EG (BL Gtec/GmG)	32 Tage	Fr 01.01.27	Mo 15.02.27	
218	1.2.3.5.1 RLT-_Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	207EA-8 Tage
219	1.2.3.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	207EA-8 Tage
220	1.2.3.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	207EA-8 Tage
221	1.2.3.5.4 Klimadecken	30 Tage	Fr 01.01.27	Do 11.02.27	201
222	1.2.3.5.5 HLSE_Endausbau	20 Tage	Di 19.01.27	Mo 15.02.27	207EA-8 Tage


Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
223		1.2.4 Treppen / Aufzug / sonstiges	176 Tage	Do 27.08.26	Do 29.04.27	
224		1.2.4.1 Treppenhaus	156 Tage	Do 24.09.26	Do 29.04.27	
225		1.2.4.1.1 Geländer-Schlosser (evtl. auch vor P-R-Fassade? 1.1.5.12)	25 Tage	Do 24.09.26	Mi 28.10.26	231
226		1.2.4.1.2 Maler (Geländer)	15 Tage	Fr 05.03.27	Do 25.03.27	232
227		1.2.4.1.3 Stufen-Podeste Betonwerkstein (so spät wie möglich)	15 Tage	Fr 26.03.27	Do 15.04.27	226
228		1.2.4.1.4 Handläufe	10 Tage	Fr 16.04.27	Do 29.04.27	227
229		1.2.4.1.5 Betonwerkstein Aufzugskabiene	2 Tage	Mo 01.02.27	Di 02.02.27	238
230		1.2.4.2 Treppenhaus 2	151 Tage	Do 27.08.26	Do 25.03.27	
231		1.2.4.2.1 Geländer-Schlosser	20 Tage	Do 27.08.26	Mi 23.09.26	66
232		1.2.4.2.2 Maler (Geländer)	10 Tage	Fr 19.02.27	Do 04.03.27	211
233		1.2.4.2.3 Stufen-Podeste Bodenbelag	10 Tage	Fr 05.03.27	Do 18.03.27	232
234		1.2.4.2.4 Handläufe	5 Tage	Fr 19.03.27	Do 25.03.27	172;233
235		1.2.4.3 Aufzug	67 Tage	Do 29.10.26	Fr 29.01.27	
236		1.2.4.3.1 Schienenkonstruktion (Anstriche)	10 Tage	Do 29.10.26	Mi 11.11.26	225
237		1.2.4.3.2 Alu-Glasverkleidung, Portale	15 Tage	Do 12.11.26	Mi 02.12.26	236
238		1.2.4.3.3 Kabiene (gemäß Aufzugsbau)	10 Tage	Mo 18.01.27	Fr 29.01.27	
239		1.2.4.4 sonstiges	2 Tage	Mo 11.01.27	Di 12.01.27	
240		1.2.4.4.1 Schlosserarbeiten (Handlauf zum Dach, Steigleiter Dach, Leitern+ +)	2 Tage	Mo 11.01.27	Di 12.01.27	
241						
242		1.3 Bau Freianlagen inkl. offene Kleingaragen	238 Tage	Mo 03.08.26	Mi 30.06.27	
243		1.3.1 Bau zwei offene Kleingaragen inkl. Fundamente (BL Trapez/BMU)	20 Tage	Mo 03.08.26	Fr 28.08.26	
244		1.3.2 Freianlagen_Oberbau_Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)	109 Tage	Mo 03.08.26	Do 31.12.26	
245		1.3.3 Freianlagen_Pflanzungen (BL Neuhaus &Partner)	67 Tage	Mo 01.03.27	Di 01.06.27	244
246		1.3.4 Freianlagen_Ausstattung_Zäune (BL Neuhaus &Partner)	45 Tage	Mo 05.10.26	Fr 04.12.26	
247		1.3.5 Freianlagen_Oberbau_Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)_PARKPLATZ_2. Phase	70 Tage	Do 25.03.27	Mi 30.06.27	244
248						
249		1.4 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss	124 Tage	Mo 26.10.26	Do 15.04.27	
250		1.4.1 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss	10 Tage	Mo 26.10.26	Fr 06.11.26	173
251		1.4.2 Inbetriebnahmen HLSE	10 Tage	Fr 26.02.27	Do 11.03.27	137;135;133;132
252		1.4.3 Abnahme Brandschutz usw., Mängelbegehungen Gewerke	10 Tage	Fr 05.03.27	Do 18.03.27	130
253		1.4.4 lose Möblierung (BL AG)	10 Tage	Mi 17.03.27	Di 30.03.27	173;130EA-5 Tage
254		1.4.5 Mängelbeseitigung, Restarbeiten alle Gewerke	20 Tage	Fr 19.03.27	Do 15.04.27	252
255						
256		1.5 Einzug Büros EG und 1. OG, bei Bedarf Bezug Büros 2. OG (Ohne Leitstellen !)	1 Tag	Fr 16.04.27	Fr 16.04.27	254
257						
258		2 Leitstellensystemtechnik	179 Tage	Fr 05.03.27	Mi 10.11.27	
259		2.1 Einbau und Inbetriebnahmen Systemtechnik inkl Probebetrieb/Testphase>EG- 2. Obergschoss (E	110 Tage	Fr 05.03.27	Do 05.08.27	130
260		2.2 Lieferung Möblierung Leitstellen (BL Awades)	40 Tage	Fr 05.03.27	Do 29.04.27	130
261		2.3 Inbetriebnahme Leitstellentechnik_Umzug zum operativen Betrieb (BL Awades)	10 Tage	Mi 07.07.27	Di 20.07.27	
262		2.4 Umzug und Inbetriebnahme bestehender Systemkomponenten / Schulungs- Redundanzbereich	80 Tage	Mi 21.07.27	Di 09.11.27	
263						
264		2.5 Projekt Ende/alle Gebäudeteile/Freiagen/Betrieb Technik übergeben (	1 Tag	Mi 10.11.27	Mi 10.11.27	262





März 2026				April 2026					2. Qtl. 2026 Mai 2026			Juni 2026				Juli 2026						
KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32

[illegible]

Restleistungen

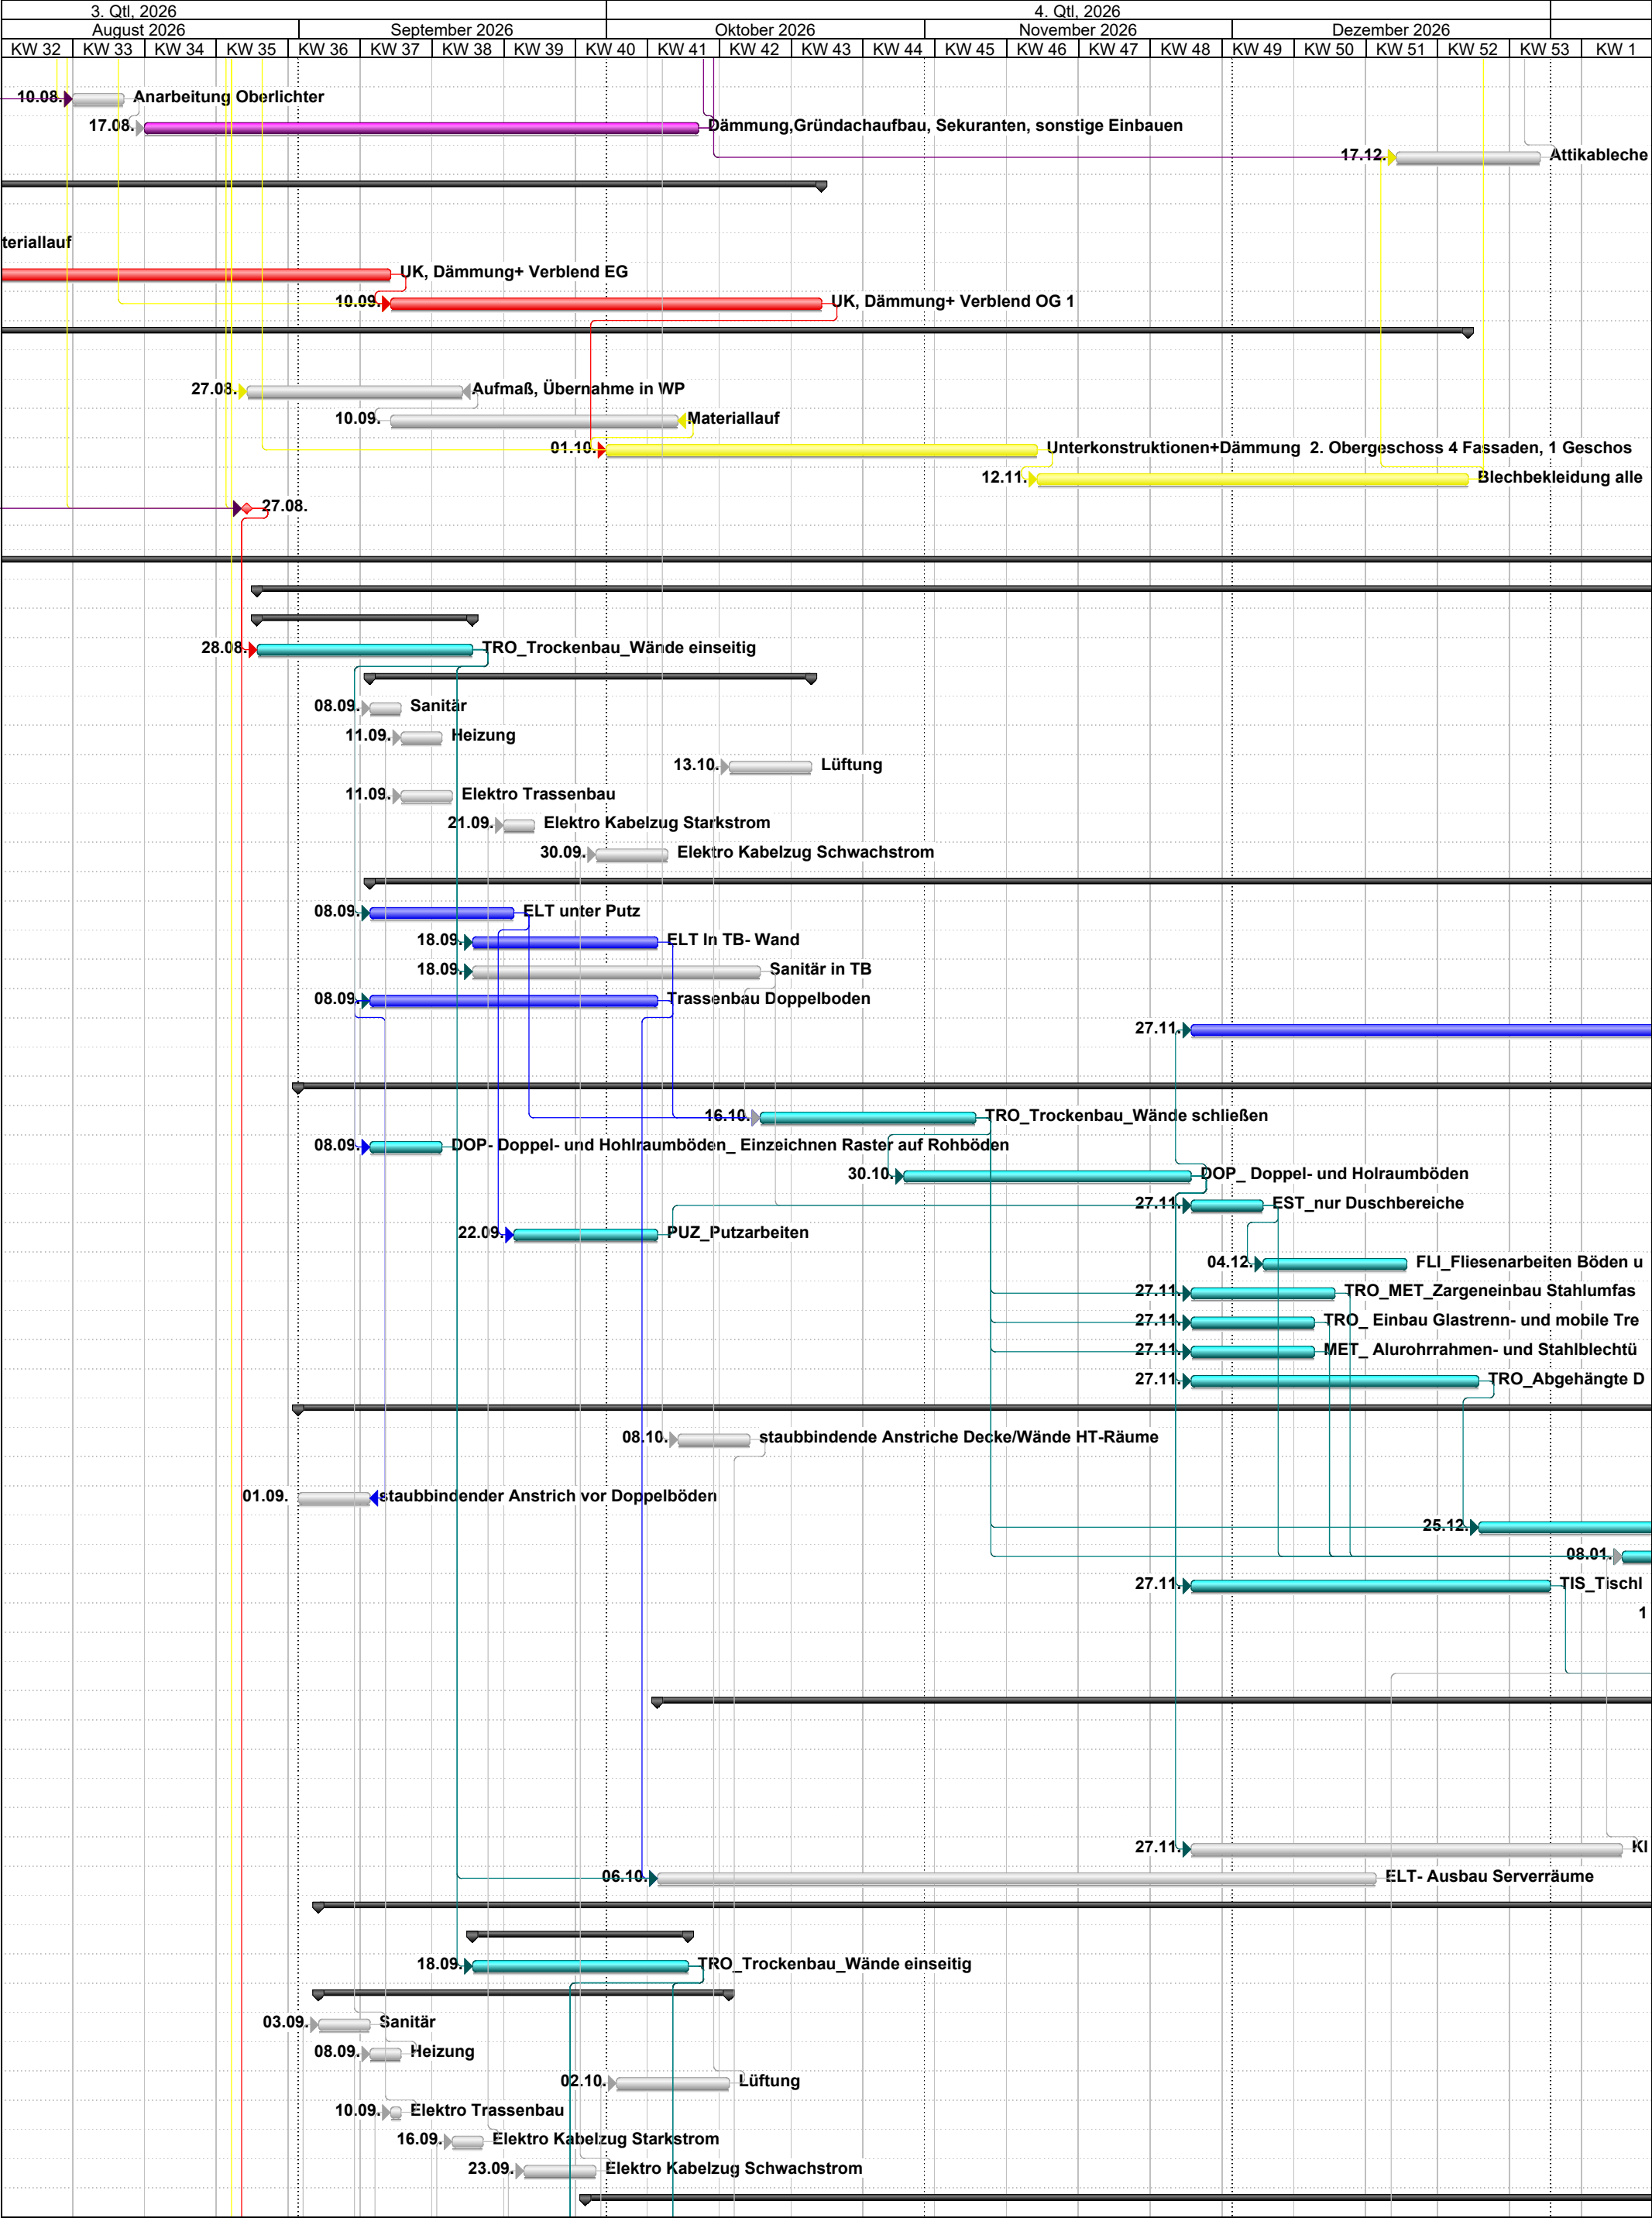



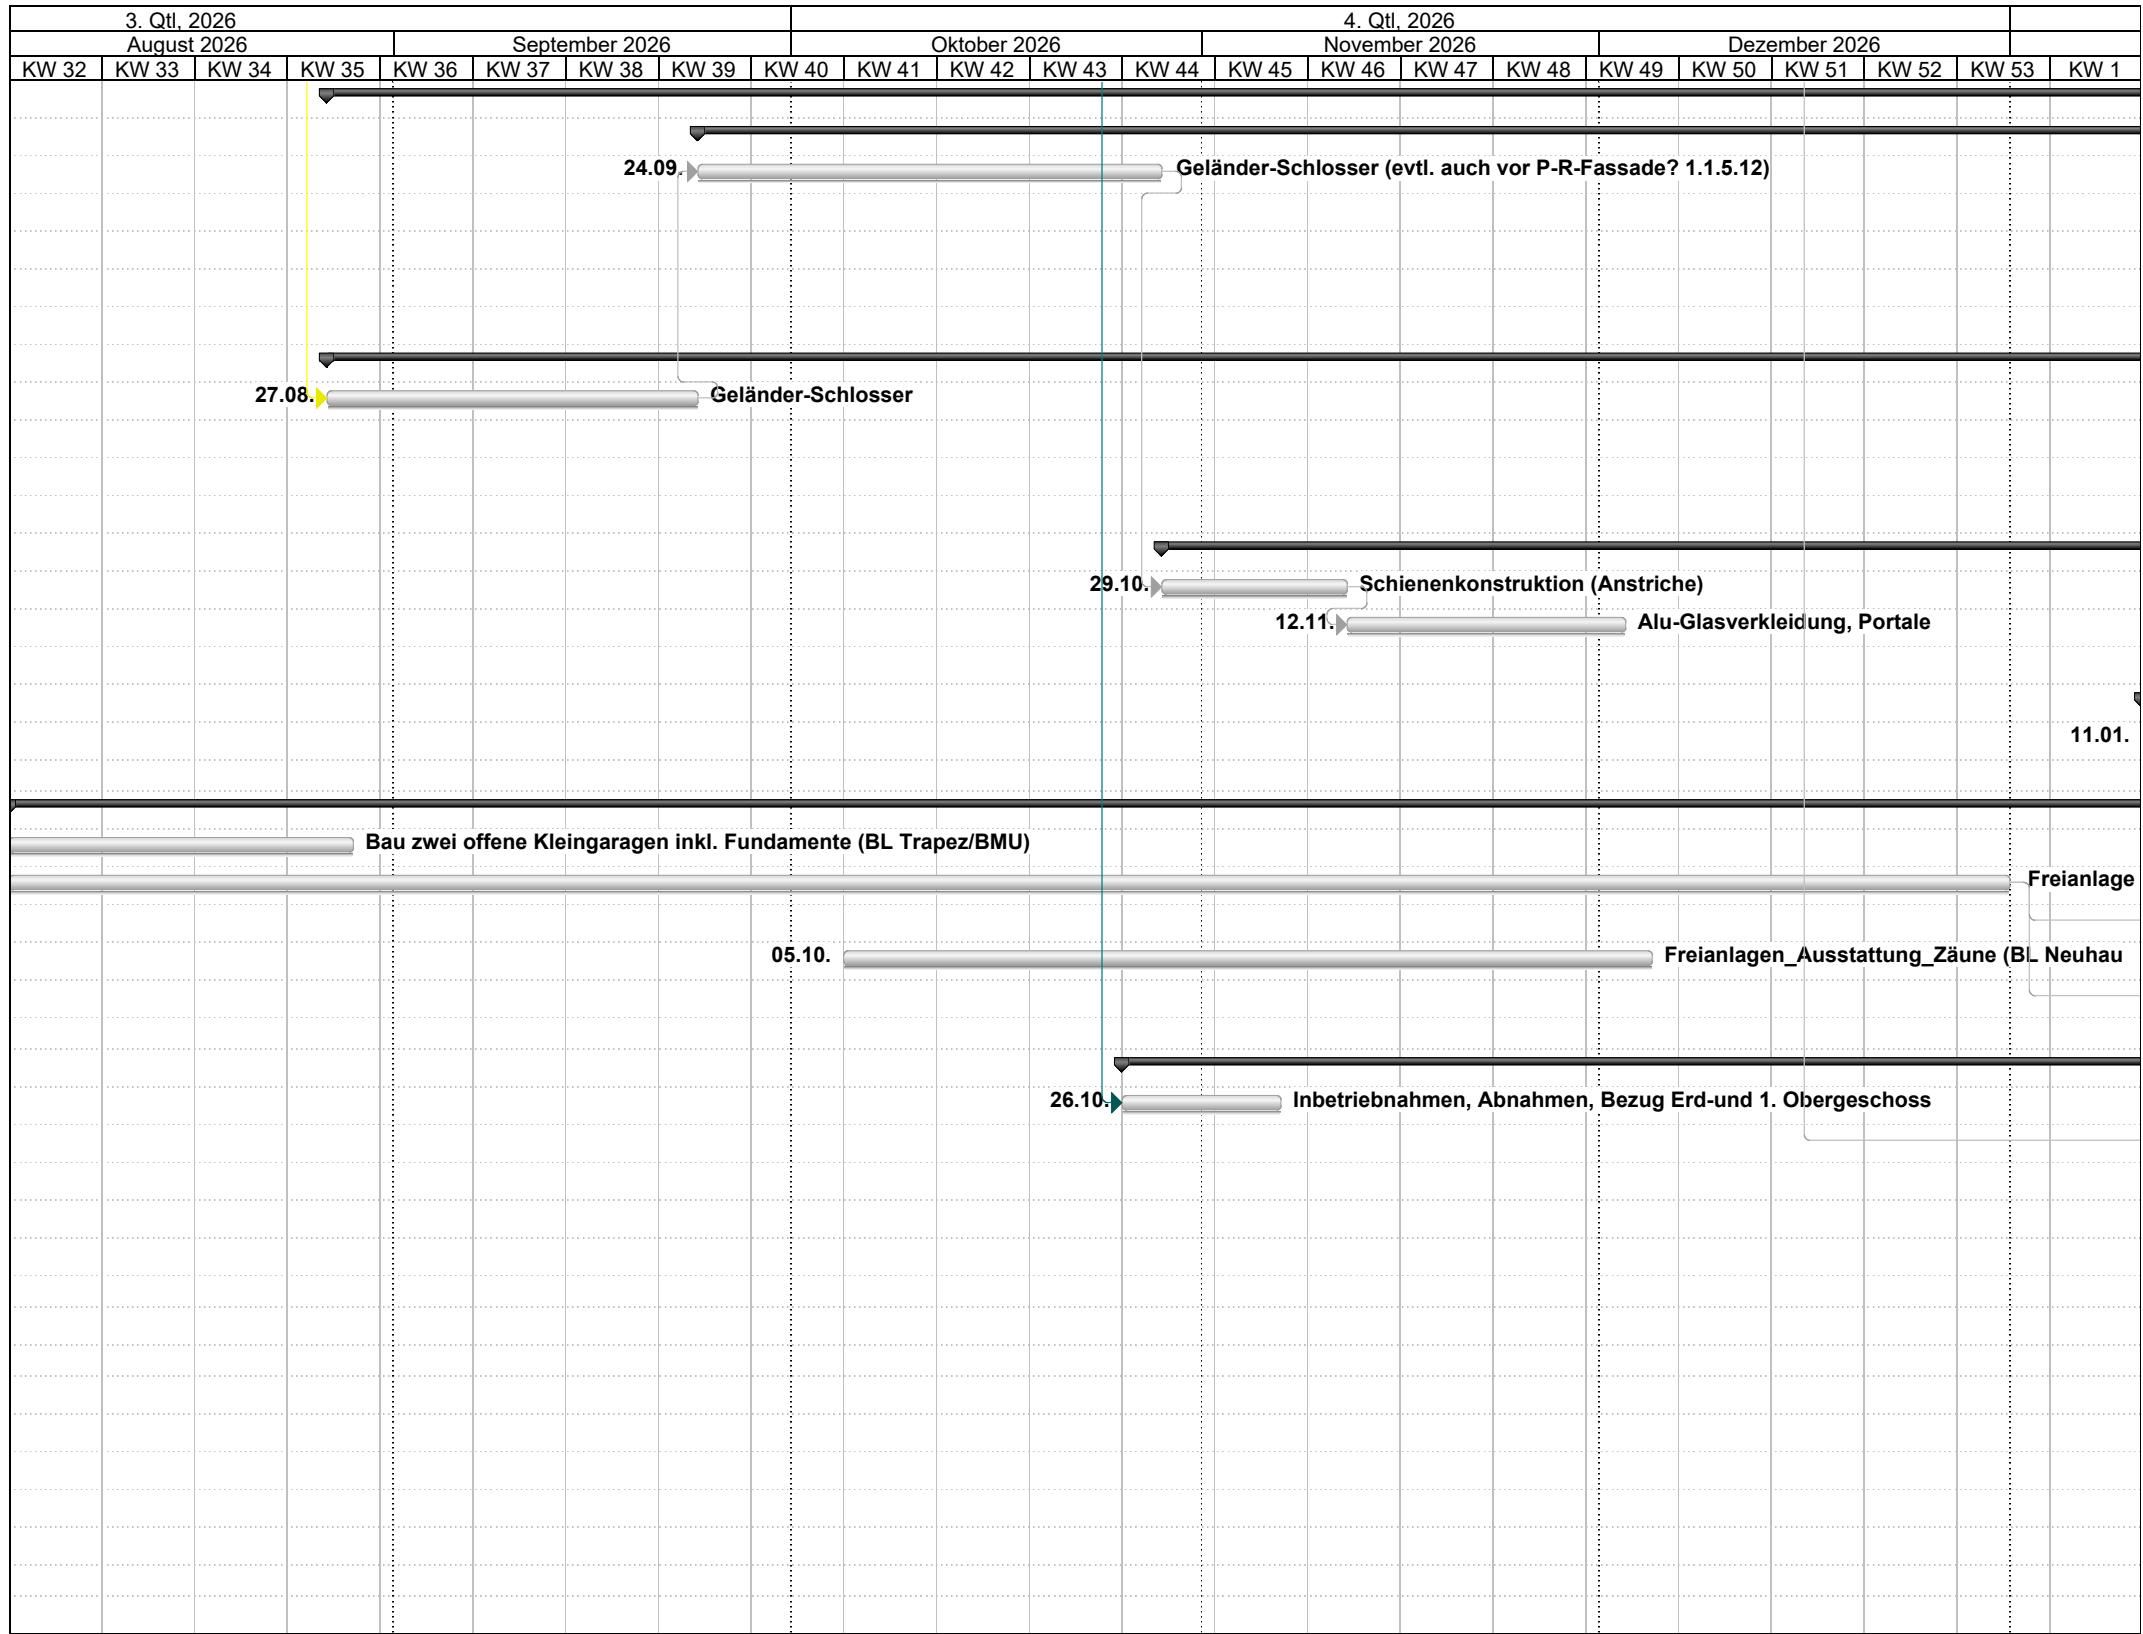

inrichtung Baustromverteiler usw.







Sanitär- und Duschen

[illegible]

[illegible]

[illegible]
