



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	
						K
1	1 GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald	468 Tage	Mo 01.09.25	Mi 30.06.27		
2	1.1 Gebäudehülle	423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27		
3	1.1.1 BE 1_Baustelleneinrichtung 1 (BL Trapez/BMU)	423 Tage	Mo 01.09.25	Mi 28.04.27		
4	 1.1.1.1 Bauzaun, Bauschild	5 Tage	Mo 01.09.25	Fr 05.09.25		
5	 1.1.1.2 Standzeit bis Rückbau Bauzaun	414 Tage	Mo 01.09.25	Do 15.04.27		
6	 1.1.1.3 Containerstellung und Einrichtung Conatiner Bauleitung , Sanitär- und Duschen	3 Tage	Mo 01.09.25	Mi 03.09.25		
7	 1.1.1.4 Standzeit bis Rückbau Conatiner Bauleitunge , Sanitär- und Duschen	420 Tage	Do 04.09.25	Mi 28.04.27 6		
8	1.1.2 BE 2_Baustelleneinrichtung 2 (BL Gtec/GmG)	340 Tage	Mo 01.09.25	Fr 01.01.27		
9	 1.1.2.1 Einrichtung Bauwasser	320 Tage	Mo 01.09.25	Fr 04.12.26		
10	 1.1.2.2 Einrichtung Baustromverteiler usw.	335 Tage	Mo 08.09.25	Fr 01.01.27 4		
11	1.1.3 ROH_ Erdbau, Grundleitungen, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten	248 Tage	Mo 08.09.25	Mi 02.09.26		
12	1.1.3.1 Erdbau inkl. Erdbau Sohle und Grundleitungen Gebäude/Containerversorgung	25 Tage	Mo 08.09.25	Fr 10.10.25 4		
13	1.1.3.2 Sohle_ Schalung, Dämmung, Bewehrung, Beton, Blitzschutzeinbauten	20 Tage	Mo 13.10.25	Fr 07.11.25 12		
14	1.1.3.3 Wände EG	20 Tage	Mo 10.11.25	Fr 05.12.25 13		
15	1.1.3.4 Stahlbetondecke zum 1. OG	20 Tage	Mo 08.12.25	Fr 16.01.26 14		
16	1.1.3.5 Wände 1. OG	20 Tage	Mo 19.01.26	Fr 13.02.26 15		
17	1.1.3.6 Stahlbetondecke zum 2. OG	30 Tage	Mo 16.02.26	Fr 27.03.26 16		
18	1.1.3.7 Wände 2. OG	20 Tage	Mo 30.03.26	Fr 24.04.26 17		
19	1.1.3.8 Stahlbetondecke Dach inkl. Stahlbauarbeiten	25 Tage	Mo 27.04.26	Fr 29.05.26 18		
20	1.1.3.9 Blitzschutzarbeiten begleitend Rohbauarbeiten (im Bauhauptgewerk als Leistung enthalt	110 Tage	Mo 13.10.25	Fr 27.03.26 12		
21	1.1.3.10 Bau NEAgebäude_ Erdbau- und Rohbauarbeiten	20 Tage	Mo 01.06.26	Fr 26.06.26 19		
22	1.1.3.11 Blitzschutz auf Dachdeckung (Fangstangen usw.)	10 Tage	Do 20.08.26	Mi 02.09.26 48		
23	1.1.4 GER_Gerüstbauarbeiten	268 Tage	Mo 10.11.25	Mi 02.12.26		
24	1.1.4.1 Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl.Auf- und Umbauarbeiten	100 Tage	Mo 10.11.25	Fr 10.04.26 13		
25	1.1.4.2 Gerüstbauarbeiten, Ausleger abschnittsweise für Fassadenarbeiten entfernen	60 Tage	Mo 13.04.26	Fr 03.07.26 24		
26	1.1.4.3 Rückbau Fassadengerüste	8 Tage	Mo 23.11.26	Mi 02.12.26 57;48;49		
27	1.1.5 MET_FES_Fenster, Pfostenriegelfassaden, Dachoberlichter	270 Tage	Mo 20.10.25	Fr 13.11.26		
28	 1.1.5.1 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrungsplanung inkl Prüfung Trapez Ar	80 Tage	Mo 20.10.25	Fr 20.02.26		
29	1.1.5.2 Montage Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen	25 Tage	Mo 01.06.26	Fr 03.07.26 19		
30	 1.1.5.3 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden EG	3 Tage	Mi 04.03.26	Mo 09.03.26 31AE		
31	1.1.5.4 Fertigung Fenster EG	35 Tage	Mo 09.03.26	Mo 27.04.26 34AE		
32	 1.1.5.5 Montage Fenster EG	20 Tage	Mo 29.06.26	Fr 24.07.26 19EA+5 Tage		
33	1.1.5.6 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 1	3 Tage	Mi 22.04.26	Mo 27.04.26 34AE		
34	1.1.5.7 Fertigung Fenster OG 1	35 Tage	Mo 27.04.26	Mo 15.06.26 37AE		
35	1.1.5.8 Montage Fenster OG 1	20 Tage	Mo 13.07.26	Fr 07.08.26 32EA-10 Tage		
36	1.1.5.9 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 2	3 Tage	Mo 03.08.26	Mi 05.08.26 37		
37	1.1.5.10 Fertigung Fenster OG 2	35 Tage	Mo 15.06.26	Mo 03.08.26 38AE		
38	1.1.5.11 Montage Fenster OG 2	15 Tage	Mo 03.08.26	Fr 21.08.26 35EA-5 Tage		
39	 1.1.5.12 Montage P-R-Fassaden 2.OG, 1.OG, EG	50 Tage	Mo 20.07.26	Fr 25.09.26		
40	 1.1.5.13 Montage Attika	10 Tage	Mo 07.09.26	Fr 18.09.26		
41	 1.1.5.14 Montage Windfang	10 Tage	Mo 21.09.26	Fr 02.10.26 40		
42	 1.1.5.15 Montage Türen	10 Tage	Mo 05.10.26	Fr 16.10.26 41		
43	1.1.5.16 Restleistungen	20 Tage	Mo 19.10.26	Fr 13.11.26 42		
44						
45	1.1.6 Dachdeckerarbeiten	125 Tage	Mo 01.06.26	Fr 20.11.26		
46	1.1.6.1 Einbau RA Elemente	3 Tage	Mo 01.06.26	Mi 03.06.26 19		
47	1.1.6.2 Abdichtung Dach	15 Tage	Do 04.06.26	Mi 24.06.26 46		
48	1.1.6.3 Dämmung,Gründachaufbau, Sekuranten, sonstige Einbauen,	40 Tage	Do 25.06.26	Mi 19.08.26 47		
49	1.1.6.4 Attikableche und Unterkonstruktion	10 Tage	Mo 09.11.26	Fr 20.11.26 48;57EA-5 Tage		
50						
51	1.1.7 Verblendmauerwerksarbeiten	60 Tage	Mo 27.07.26	Fr 16.10.26		
52	1.1.7.1 UK, Dämmung+ Verblend EG	30 Tage	Mo 27.07.26	Fr 04.09.26 14;32		
53	1.1.7.2 UK, Dämmung+ Verblend OG 1	30 Tage	Mo 07.09.26	Fr 16.10.26 16;35;52		
54						
55	1.1.8 Hinterlüftete Fassade 2. Obergeschoss und Fassade Haupttreppenhaus	60 Tage	Mo 24.08.26	Fr 13.11.26		
56	1.1.8.1 Unterkonstruktionen+Dämmung 2. Obergeschoss 4 Fassaden, 1 Geschoss + Haupttrepp	30 Tage	Mo 24.08.26	Fr 02.10.26 38		
57	1.1.8.2 Blechbekleidung alle Fassaden 2. OG + Treppenhaus	30 Tage	Mo 05.10.26	Fr 13.11.26 56		
58	1.1.9 Baudicht	1 Tag	Mo 24.08.26	Mo 24.08.26 47;38;46;29		
59						
60	1.2 Gebäudeausbau	211 Tage	Mo 06.07.26	Mo 26.04.27		
61	1.2.1 2.Obergeschoss	135 Tage	Di 25.08.26	Mo 01.03.27		
62	1.2.1.1 Hochbau 2.OG 1 (BL Trapez/BMU)	15 Tage	Di 25.08.26	Mo 14.09.26		
63	1.2.1.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Di 25.08.26	Mo 14.09.26 58		
64	1.2.1.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	31 Tage	Do 03.09.26	Do 15.10.26		
65	1.2.1.2.1 Sanitär	3 Tage	Do 03.09.26	Mo 07.09.26 106		
66	1.2.1.2.2 Heizung	2 Tage	Di 08.09.26	Mi 09.09.26 107		
67	1.2.1.2.3 Lüftung	6 Tage	Do 08.10.26	Do 15.10.26 108		
68	1.2.1.2.4 Elektro Trassenbau	3 Tage	Di 08.09.26	Do 10.09.26 109		
69	1.2.1.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	3 Tage	Mi 16.09.26	Fr 18.09.26 110		
70	1.2.1.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Fr 25.09.26	Do 01.10.26 111		
71	1.2.1.3 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG)	128 Tage	Do 03.09.26	Mo 01.03.27		
72	1.2.1.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Do 03.09.26	Mi 16.09.26 63EA-8 Tage		
73	1.2.1.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Di 15.09.26	Mi 30.09.26 63		
74	1.2.1.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Di 15.09.26	Mo 12.10.26 63		
75	1.2.1.3.4 Trassenbau Doppelboden	20 Tage	Do 03.09.26	Mi 30.09.26 63EA-8 Tage		
76	1.2.1.3.5 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 2.OG (Schächte inkl. Stahlebenen)	50 Tage	Di 24.11.26	Mo 01.02.27 81		

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	
						K
77	1.2.1.3.6 Dachaufbauten	20 Tage	Di 02.02.27	Mo 01.03.27	76	
78	1.2.1.4 Hochbau 2.OG 2 (BL Trapez/BMU)	128 Tage	Do 03.09.26	Mo 01.03.27		
79	1.2.1.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Di 13.10.26	Mo 02.11.26	72EA-5 Tage;73EA	
80	1.2.1.4.2 DOP- Doppel- und Hohlraumböden_ Einzeichnen Raster auf Rohböden	5 Tage	Do 03.09.26	Mi 09.09.26	75AA	
81	1.2.1.4.3 DOP_ Doppel- und Holraumböden	20 Tage	Di 27.10.26	Mo 23.11.26	79EA-5 Tage	
82	1.2.1.4.4 EST_nur Duschbereiche	5 Tage	Di 24.11.26	Mo 30.11.26	81;74;83	
83	1.2.1.4.5 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Do 17.09.26	Mi 30.09.26	72	
84	1.2.1.4.6 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	10 Tage	Di 01.12.26	Mo 14.12.26	82	
85	1.2.1.4.7 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlfassungsargen	10 Tage	Di 24.11.26	Mo 07.12.26	79;81	
86	1.2.1.4.8 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Di 24.11.26	Do 03.12.26	79;81	
87	1.2.1.4.9 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Di 24.11.26	Do 03.12.26	79;81	
88	1.2.1.4.10 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Di 24.11.26	Mo 21.12.26	81	
89	1.2.1.4.11 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich	15 Tage	Di 22.12.26	Mo 11.01.27	79;88	
90	1.2.1.4.12 BOD_Bodenleger	15 Tage	Di 05.01.27	Mo 25.01.27	79EA+20 Tage;82;	
91	1.2.1.4.13 TIS_Tischlereinbauten (3 Stück Akustikwände)	25 Tage	Di 24.11.26	Mo 28.12.26	81	
92	1.2.1.4.14 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Di 12.01.27	Mo 18.01.27	89	
93	1.2.1.4.15 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff	5 Tage	Di 26.01.27	Mo 01.02.27	89;90	
94	1.2.1.4.16 Endreinigung 2. Obergeschoss	5 Tage	Di 23.02.27	Mo 01.03.27	97;98;99;90;89;91;	
95	1.2.1.5 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG)	103 Tage	Do 01.10.26	Mo 22.02.27		
96	1.2.1.5.1 RLT-_Endausbau	20 Tage	Di 26.01.27	Mo 22.02.27	90	
97	1.2.1.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Di 26.01.27	Mo 22.02.27	90	
98	1.2.1.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Di 26.01.27	Mo 22.02.27	90	
99	1.2.1.5.4 HLSE_Endausbau	20 Tage	Di 26.01.27	Mo 22.02.27	90	
100	1.2.1.5.5 Klimadecken	30 Tage	Di 24.11.26	Mo 04.01.27	81	
101	1.2.1.5.6 ELT- Ausbau Serverräume	50 Tage	Do 01.10.26	Mi 09.12.26	80;75	
102	1.2.2 1.Obergeschoss	123 Tage	Mo 31.08.26	Mi 17.02.27		
103	1.2.2.1 Hochbau 1.OG 1 (BL Trapez/BMU)	15 Tage	Di 15.09.26	Mo 05.10.26		
104	1.2.2.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Di 15.09.26	Mo 05.10.26	63	
105	1.2.2.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	28 Tage	Mo 31.08.26	Mi 07.10.26		
106	1.2.2.2.1 Sanitär	3 Tage	Mo 31.08.26	Mi 02.09.26	146	
107	1.2.2.2.2 Heizung	3 Tage	Do 03.09.26	Mo 07.09.26	147	
108	1.2.2.2.3 Lüftung	7 Tage	Di 29.09.26	Mi 07.10.26	148	
109	1.2.2.2.4 Elektro Trassenbau	1 Tag	Mo 07.09.26	Mo 07.09.26	149	
110	1.2.2.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	3 Tage	Fr 11.09.26	Di 15.09.26	150	
111	1.2.2.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Fr 18.09.26	Do 24.09.26	151	
112	1.2.2.3 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG)	75 Tage	Do 24.09.26	Mi 06.01.27		
113	1.2.2.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Do 24.09.26	Mi 07.10.26	104EA-8 Tage	
114	1.2.2.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Di 06.10.26	Mi 21.10.26	104	
115	1.2.2.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Di 06.10.26	Mo 02.11.26	104	
116	1.2.2.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung	30 Tage	Do 24.09.26	Mi 04.11.26	104EA-8 Tage	
117	1.2.2.3.5 ELT mit Bodentanks	12 Tage	Do 24.09.26	Fr 09.10.26	104EA-8 Tage	
118	1.2.2.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 1.OG (Schächte inkl. Stahlebenen)	20 Tage	Do 10.12.26	Mi 06.01.27	122	
119	1.2.2.4 Hochbau 1.OG 2 (BL Trapez/BMU)	95 Tage	Do 08.10.26	Mi 17.02.27		
120	1.2.2.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Do 29.10.26	Mi 18.11.26	114EA-5 Tage;116	
121	1.2.2.4.2 EST_Estrich	15 Tage	Do 12.11.26	Mi 02.12.26	120EA-5 Tage;116;	
122	1.2.2.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit	5 Tage	Do 03.12.26	Mi 09.12.26	121	
123	1.2.2.4.4 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Do 08.10.26	Mi 21.10.26	113	
124	1.2.2.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	15 Tage	Do 10.12.26	Mi 30.12.26	122	
125	1.2.2.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlfassungsargen	10 Tage	Do 10.12.26	Mi 23.12.26	120;123;122	
126	1.2.2.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Do 10.12.26	Mo 21.12.26	122	
127	1.2.2.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Do 10.12.26	Mo 21.12.26	122	
128	1.2.2.4.9 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Do 10.12.26	Mi 06.01.27	122	
129	1.2.2.4.10 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich	15 Tage	Do 07.01.27	Mi 27.01.27	128	
130	1.2.2.4.11 BOD_Bodenleger	15 Tage	Di 26.01.27	Mo 15.02.27	120;122EA+20 Tag	
131	1.2.2.4.12 TIS_Tischlereinbauten	8 Tage	Di 02.02.27	Do 11.02.27	130EA-10 Tage	
132	1.2.2.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Do 28.01.27	Mi 03.02.27	129	
133	1.2.2.4.14 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff	5 Tage	Do 28.01.27	Mi 03.02.27	129	
134	1.2.2.4.15 Endreinigung 1. Obergeschoss	5 Tage	Do 11.02.27	Mi 17.02.27	137;138;140;129	
135	1.2.2.5 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG)	38 Tage	Mo 28.12.26	Mi 17.02.27		
136	1.2.2.5.1 RLT-_Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	128EA+5 Tage	
137	1.2.2.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	128EA+5 Tage	
138	1.2.2.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	128EA+5 Tage	
139	1.2.2.5.4 Klimadecken	30 Tage	Do 07.01.27	Mi 17.02.27	128	
140	1.2.2.5.5 HLSE_Endausbau	20 Tage	Mo 28.12.26	Fr 22.01.27	128EA-8 Tage	
141	1.2.3 Erdgeschoss	189 Tage	Mo 06.07.26	Do 25.03.27		
142	1.2.3.1 Hochbau EG 1 (BL Trapez/BMU)	81 Tage	Mo 06.07.26	Mo 26.10.26		
143	1.2.3.1.1 DCH_Abklebung Sohle	10 Tage	Mo 06.07.26	Fr 17.07.26	47;29	
144	1.2.3.1.2 TRO_Trockenbau_Wände einseitig	15 Tage	Di 06.10.26	Mo 26.10.26	143EA-5 Tage;104	
145	1.2.3.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben	25 Tage	Di 25.08.26	Mo 28.09.26		
146	1.2.3.2.1 Sanitär	4 Tage	Di 25.08.26	Fr 28.08.26	58	
147	1.2.3.2.2 Heizung	3 Tage	Mo 31.08.26	Mi 02.09.26	146	
148	1.2.3.2.3 Lüftung	7 Tage	Fr 18.09.26	Mo 28.09.26	151	
149	1.2.3.2.4 Elektro Trassenbau	2 Tage	Do 03.09.26	Fr 04.09.26	147	
150	1.2.3.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom	4 Tage	Mo 07.09.26	Do 10.09.26	149	
151	1.2.3.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom	5 Tage	Fr 11.09.26	Do 17.09.26	150	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	
						K
152	1.2.3.3 HLSE Grundausbau (BL Gtec/GmG) von oben nach unten	136 Tage	Mo 20.07.26	Mo 25.01.27		
153	1.2.3.3.1 ELT unter Putz	10 Tage	Di 27.10.26	Mo 09.11.26	144	
154	 1.2.3.3.2 ELT In TB- Wand	12 Tage	Do 01.10.26	Fr 16.10.26	144	
155	1.2.3.3.3 Sanitär in TB	20 Tage	Di 27.10.26	Mo 23.11.26	144	
156	1.2.3.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung	20 Tage	Mo 20.07.26	Fr 14.08.26	143	
157	1.2.3.3.5 ELT mit Bodentanks	15 Tage	Mo 20.07.26	Fr 07.08.26	143	
158	1.2.3.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte EG (Schächte inkl. Stahlebenen)	20 Tage	Di 29.12.26	Mo 25.01.27	162	
159	1.2.3.4 Hochbau EG 2 (BL Trapez/BMU)	98 Tage	Di 10.11.26	Do 25.03.27		
160	1.2.3.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen	15 Tage	Di 17.11.26	Mo 07.12.26	154EA-5 Tage;155	
161	1.2.3.4.2 EST_Estrich	15 Tage	Di 01.12.26	Mo 21.12.26	143EA-5 Tage;160	
162	1.2.3.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit	5 Tage	Di 22.12.26	Mo 28.12.26	161	
163	1.2.3.4.4 PUZ_Putzarbeiten	10 Tage	Di 10.11.26	Mo 23.11.26	153	
164	1.2.3.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein	15 Tage	Di 29.12.26	Mo 18.01.27	162	
165	1.2.3.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen	10 Tage	Di 05.01.27	Mo 18.01.27	162EA+5 Tage	
166	1.2.3.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände	8 Tage	Di 05.01.27	Do 14.01.27	162EA+5 Tage	
167	1.2.3.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren	8 Tage	Di 05.01.27	Do 14.01.27	162EA+5 Tage	
168	1.2.3.4.9 TRO_Abgehängte Decken	20 Tage	Di 29.12.26	Mo 25.01.27	162	
169	1.2.3.4.10 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich	15 Tage	Di 26.01.27	Mo 15.02.27	168	
170	1.2.3.4.11 BOD_Bodenleger	15 Tage	Di 16.02.27	Mo 08.03.27	169	
171	1.2.3.4.12 TIS_Tischlereinbauten	8 Tage	Di 09.03.27	Do 18.03.27	170	
172	1.2.3.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos	5 Tage	Di 16.02.27	Mo 22.02.27	169	
173	1.2.3.4.14 TRO_Einbau Türblätter_ Holzwerkstofftüren	5 Tage	Di 09.03.27	Mo 15.03.27	169;170	
174	1.2.3.4.15 END- Endreinigung Erdgeschoss	5 Tage	Fr 19.03.27	Do 25.03.27	177;178;180;169;17	
175	1.2.3.5 HLSE Endausbau EG (BL Gtec/GmG)	32 Tage	Di 29.12.26	Mi 10.02.27		
176	1.2.3.5.1 RLT-_Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	168EA-8 Tage	
177	1.2.3.5.2 HK_ Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	168EA-8 Tage	
178	1.2.3.5.3 ELT- Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	168EA-8 Tage	
179	1.2.3.5.4 Klimadecken	30 Tage	Di 29.12.26	Mo 08.02.27	162	
180	1.2.3.5.5 HLSE_Endausbau	20 Tage	Do 14.01.27	Mi 10.02.27	168EA-8 Tage	
181						
182	1.2.4 Treppen / Aufzug / sonstiges	176 Tage	Mo 24.08.26	Mo 26.04.27		
183	1.2.4.1 Treppenhaus	156 Tage	Mo 21.09.26	Mo 26.04.27		
184	1.2.4.1.1 Geländer-Schlosser	25 Tage	Mo 21.09.26	Fr 23.10.26	191	
185	 1.2.4.1.2 Maler (Geländer)	15 Tage	Di 02.03.27	Mo 22.03.27	192	
186	 1.2.4.1.3 Stufen-Podeste Betonwerkstein (so spät wie möglich)	15 Tage	Di 23.03.27	Mo 12.04.27	185	
187	 1.2.4.1.4 Handläufe	10 Tage	Di 13.04.27	Mo 26.04.27	186	
188	1.2.4.1.5 Betonwerkstein Aufzugskabiene	2 Tage	Mo 01.02.27	Di 02.02.27	199	
189						
190	1.2.4.2 Treppenhaus 2	151 Tage	Mo 24.08.26	Mo 22.03.27		
191	1.2.4.2.1 Geländer-Schlosser	20 Tage	Mo 24.08.26	Fr 18.09.26	38	
192	 1.2.4.2.2 Maler (Geländer)	10 Tage	Di 16.02.27	Mo 01.03.27	169	
193	 1.2.4.2.3 Stufen-Podeste Bodenbelag	10 Tage	Di 02.03.27	Mo 15.03.27	192	
194	 1.2.4.2.4 Handläufe	5 Tage	Di 16.03.27	Mo 22.03.27	133;193	
195						
196	1.2.4.3 Aufzug	70 Tage	Mo 26.10.26	Fr 29.01.27		
197	 1.2.4.3.1 Schienenkonstruktion (Anstriche)	10 Tage	Mo 26.10.26	Fr 06.11.26	184	
198	 1.2.4.3.2 Alu-Glasverkleidung, Portale	15 Tage	Mo 09.11.26	Fr 27.11.26	197	
199	 1.2.4.3.3 Kabiene (gemäß Aufzugsbau)	10 Tage	Mo 18.01.27	Fr 29.01.27		
200						
201	1.2.4.4 sonstiges	2 Tage	Mo 11.01.27	Di 12.01.27		
202	 1.2.4.4.1 Schlosserarbeiten (Handlauf zum Dach, Steigleiter Dach, Leitern++)	2 Tage	Mo 11.01.27	Di 12.01.27		
203						
204						
205	1.3 Bau Freianlagen inkl. offene Kleingaragen	238 Tage	Mo 03.08.26	Mi 30.06.27		
206	 1.3.1 Bau zwei offene Kleingaragen inkl. Fundamente (BL Trapez/BMU)	20 Tage	Mo 03.08.26	Fr 28.08.26		
207	 1.3.2 Freianlagen_Oberbau _Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)	109 Tage	Mo 03.08.26	Do 31.12.26		
208	 1.3.3 Freianlagen_Pflanzungen (BL Neuhaus &Partner)	67 Tage	Mo 01.03.27	Di 01.06.27	207	
209	 1.3.4 Freianlagen_Ausstattung_Zäune (BL Neuhaus &Partner)	45 Tage	Mo 05.10.26	Fr 04.12.26		
210	 1.3.5 Freianlagen_Oberbau _Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)_PARKPLATZ_2. Phase	70 Tage	Do 25.03.27	Mi 30.06.27	207	
211						
212	1.4 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss	121 Tage	Mo 26.10.26	Mo 12.04.27		
213	 1.4.1 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss	10 Tage	Mo 26.10.26	Fr 06.11.26	134	
214	1.4.2 Inbetriebnahmen HLSE	10 Tage	Di 23.02.27	Mo 08.03.27	101;99;97;96	
215	1.4.3 Abnahme Brandschutz usw., Mängelbegehungen Gewerke	10 Tage	Di 02.03.27	Mo 15.03.27	94	
216	1.4.4 lose Möblierung (BL AG)	10 Tage	Fr 26.03.27	Do 08.04.27	134;94EA-5 Tage;1	
217	1.4.5 Mängelbeseitigung, Restarbeiten alle Gewerke	20 Tage	Di 16.03.27	Mo 12.04.27	215	
218						
219	1.5 Einzug Büros EG und 1. OG, bei Bedarf Bezug Büros 2. OG (Ohne Leitstellen !)	1 Tag	Di 13.04.27	Di 13.04.27	217	
220						
221	2 Leitstellensystemtechnik	182 Tage	Di 02.03.27	Mi 10.11.27		
222	 2.1 Einbau und Inbetriebnahmen Systemtechnik inkl Probebetrieb/Testphase>EG- 2. Obergeschoss (B	110 Tage	Di 02.03.27	Mo 02.08.27	94	
223	 2.2 Lieferung Möblierung Leitstellen (BL Awades)	40 Tage	Di 02.03.27	Mo 26.04.27	94	
224	 2.3 Inbetriebnahme Leitstellentechnik_Umzug zum operativen Betrieb (BL Awades)	10 Tage	Mi 07.07.27	Di 20.07.27		
225	 2.4 Umzug und Inbetriebnahme bestehender Systemkomponenten / Schulungs- Redundanzbereich	80 Tage	Mi 21.07.27	Di 09.11.27		
226						
227	 2.5 Projekt Ende/alle Gebäudeteile/Freiagen/Betrieb Technik übergeben (	1 Tag	Mi 10.11.27	Mi 10.11.27	225	

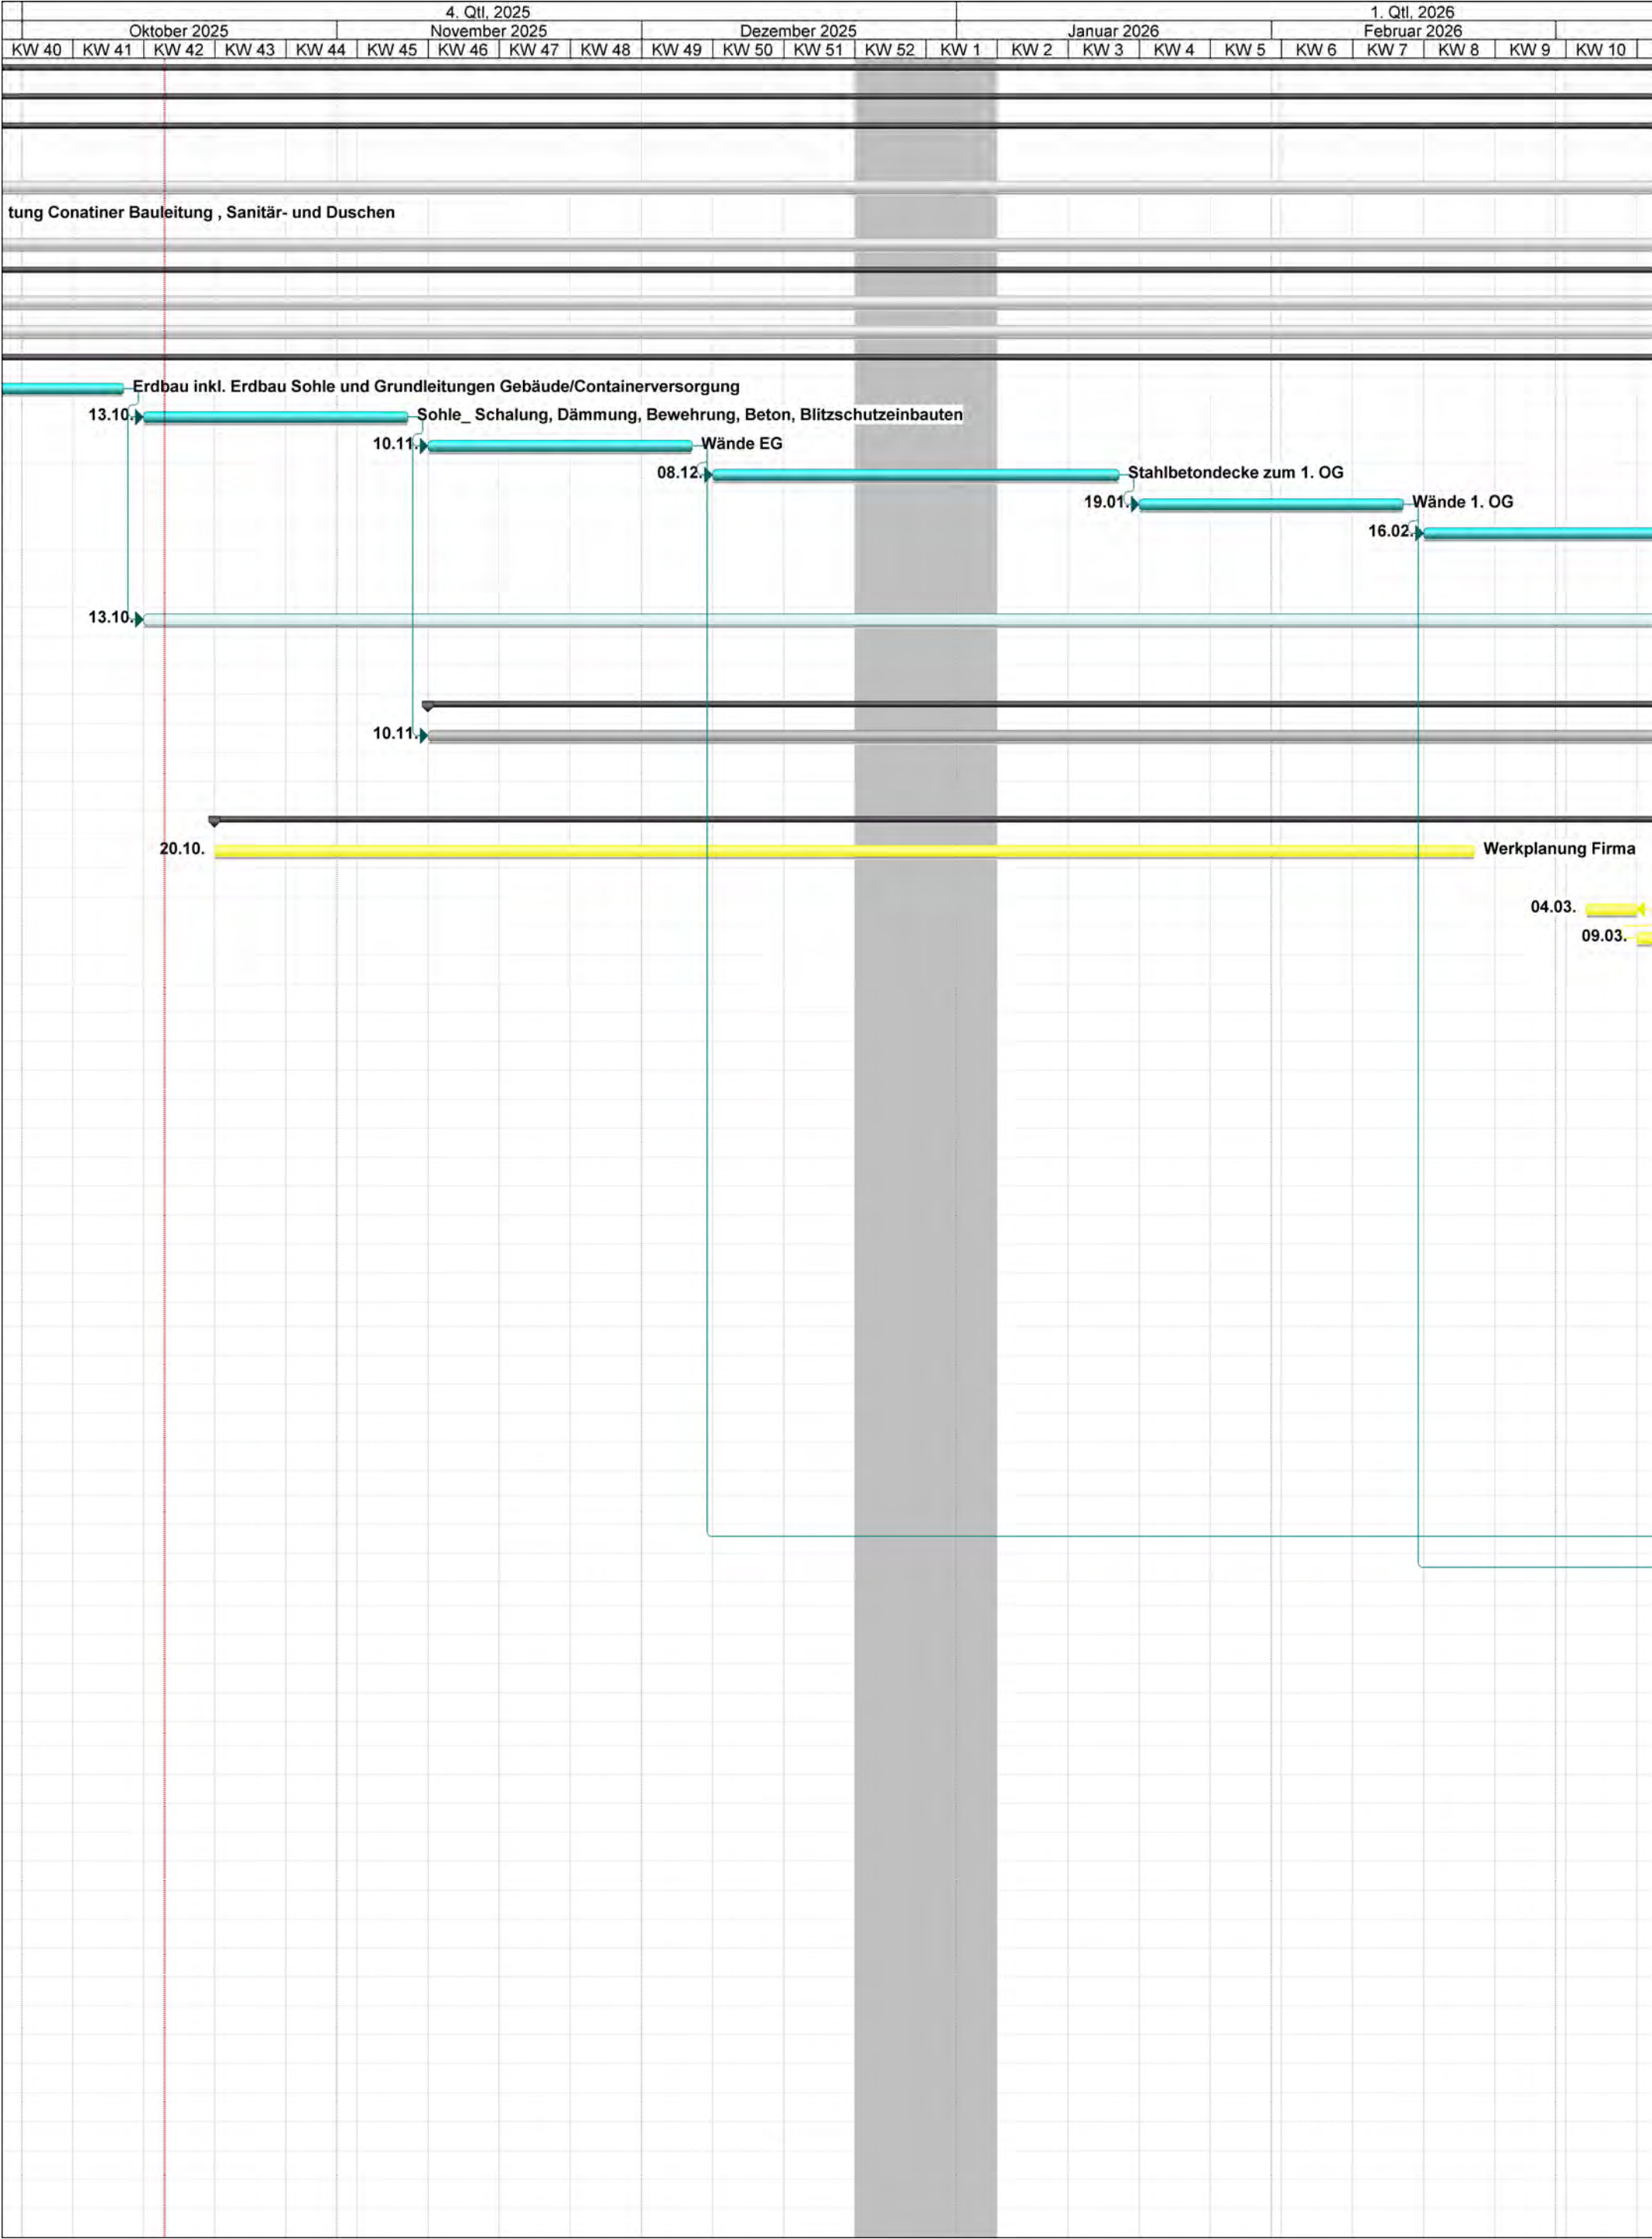


4. Qtl, 2025												1. Qtl, 2026											
Oktober 2025					November 2025				Dezember 2025				Januar 2026					Februar 2026					
KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	

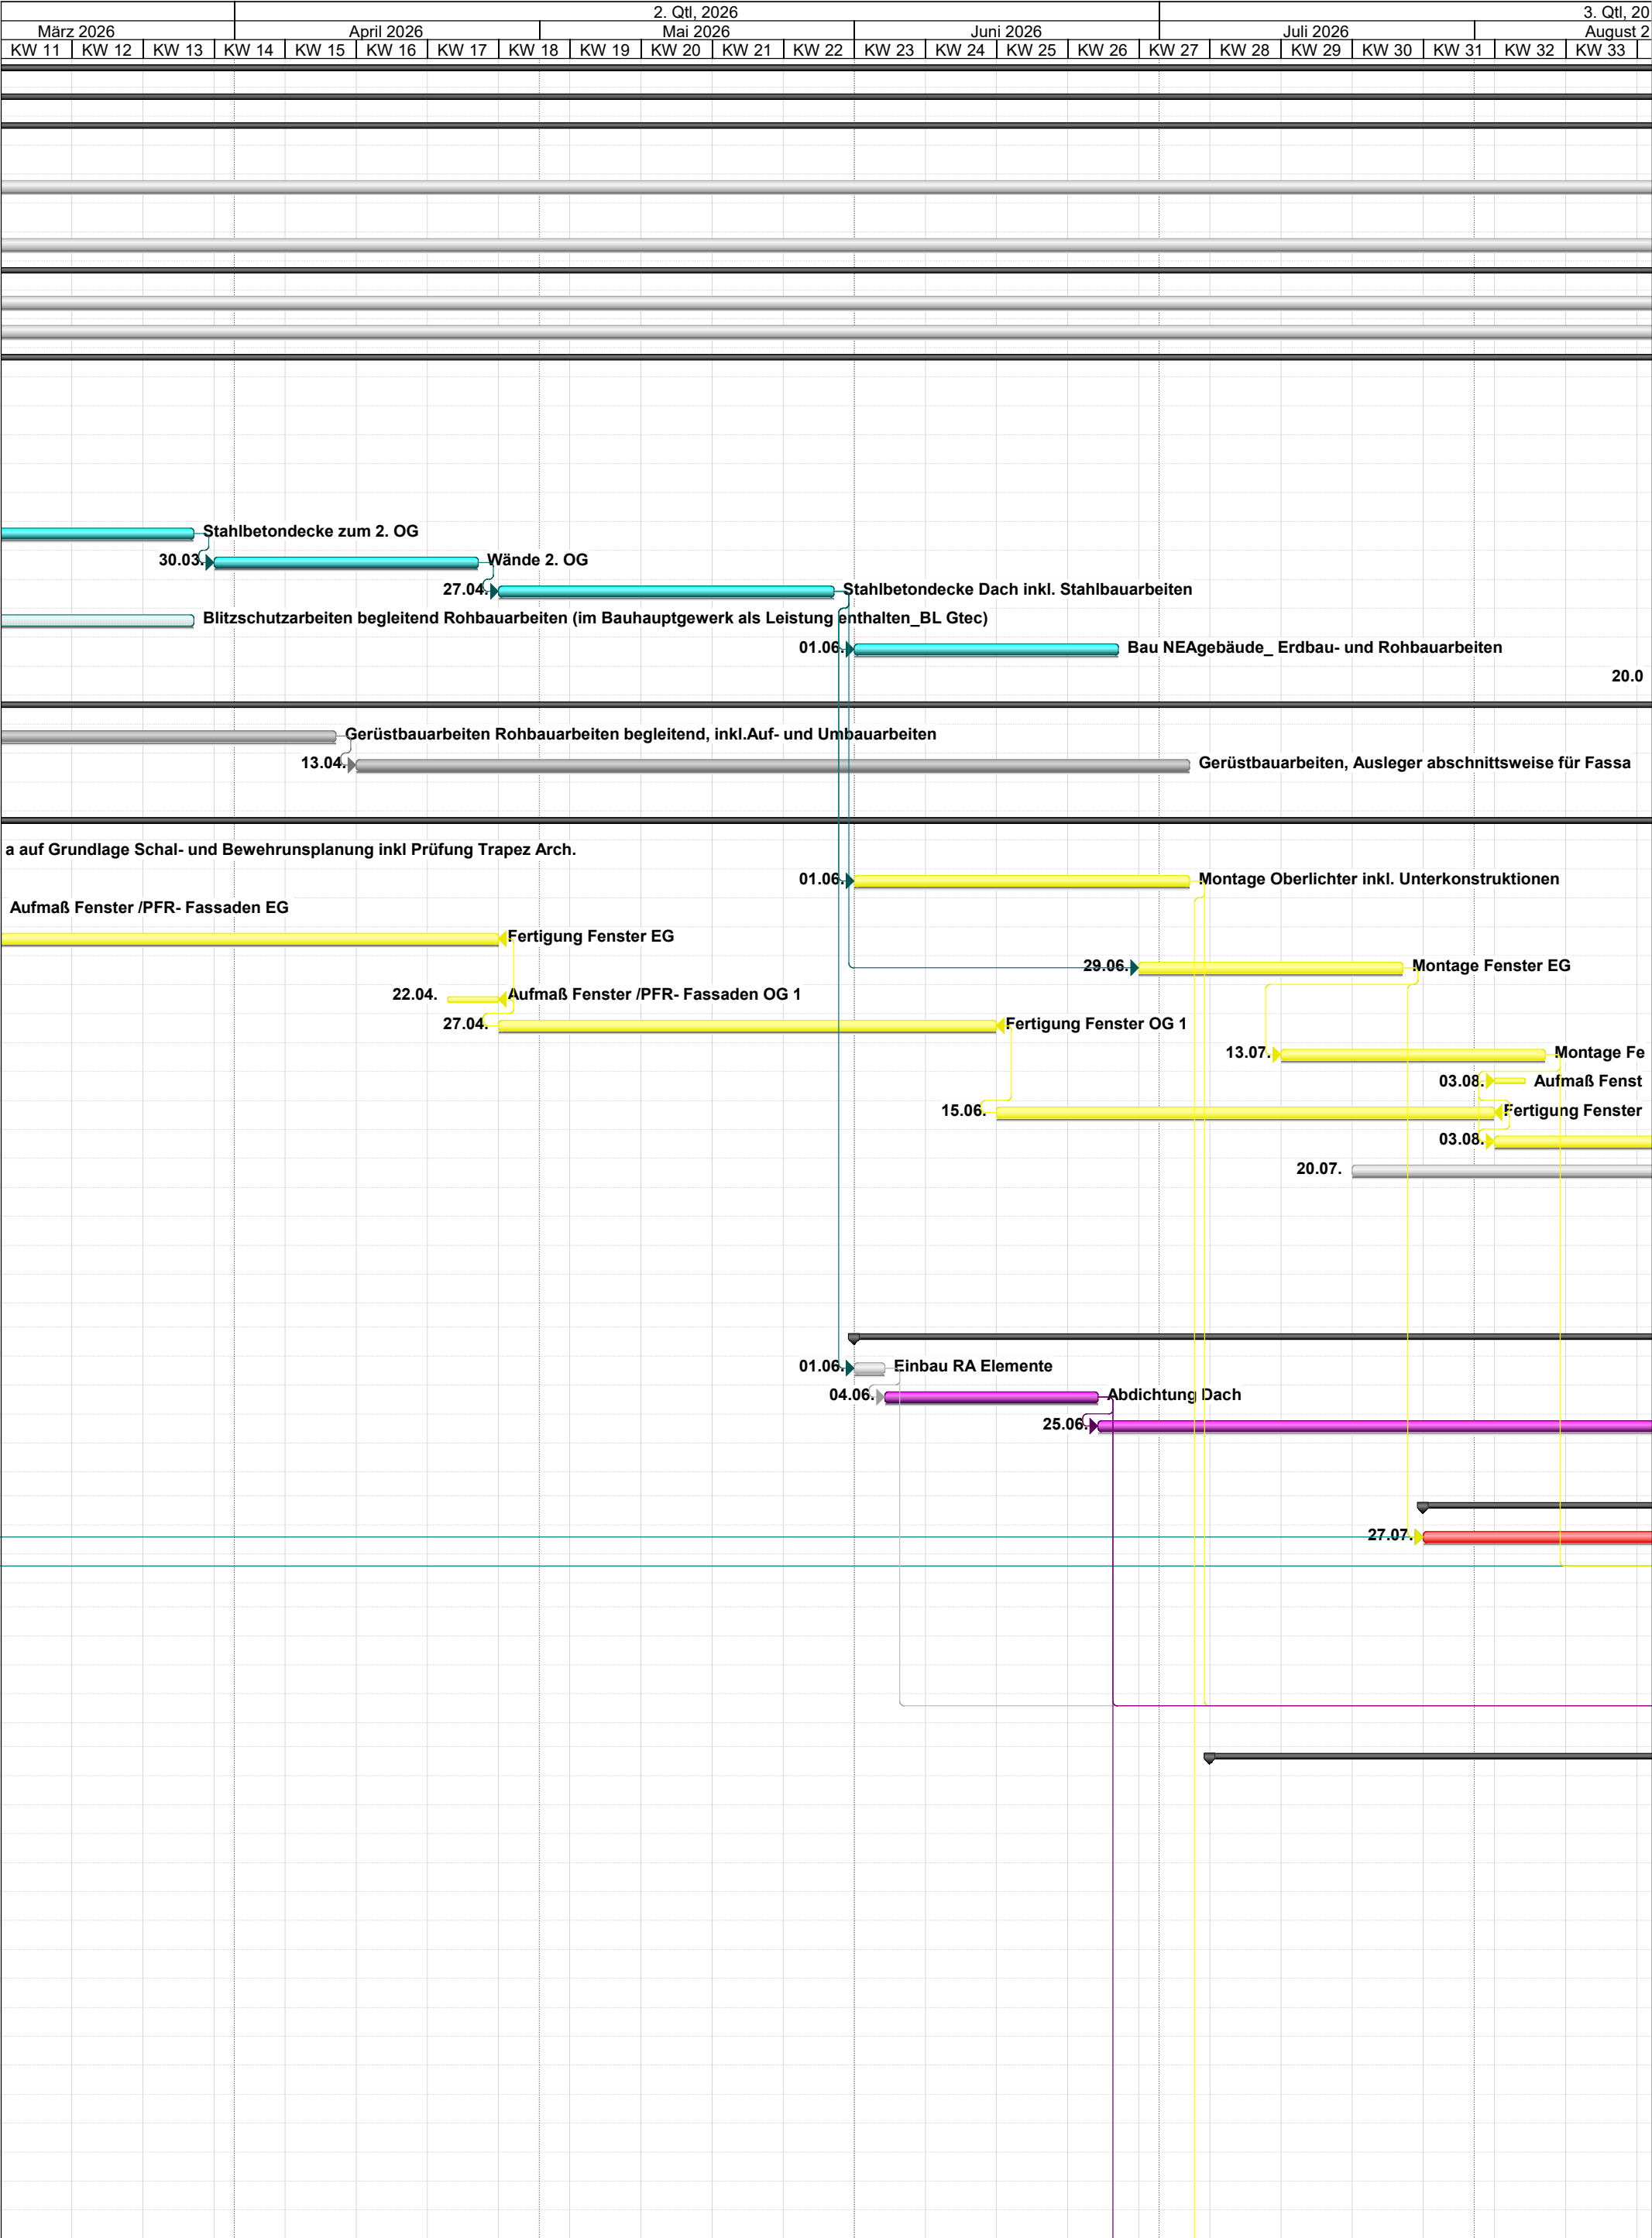

[illegible]



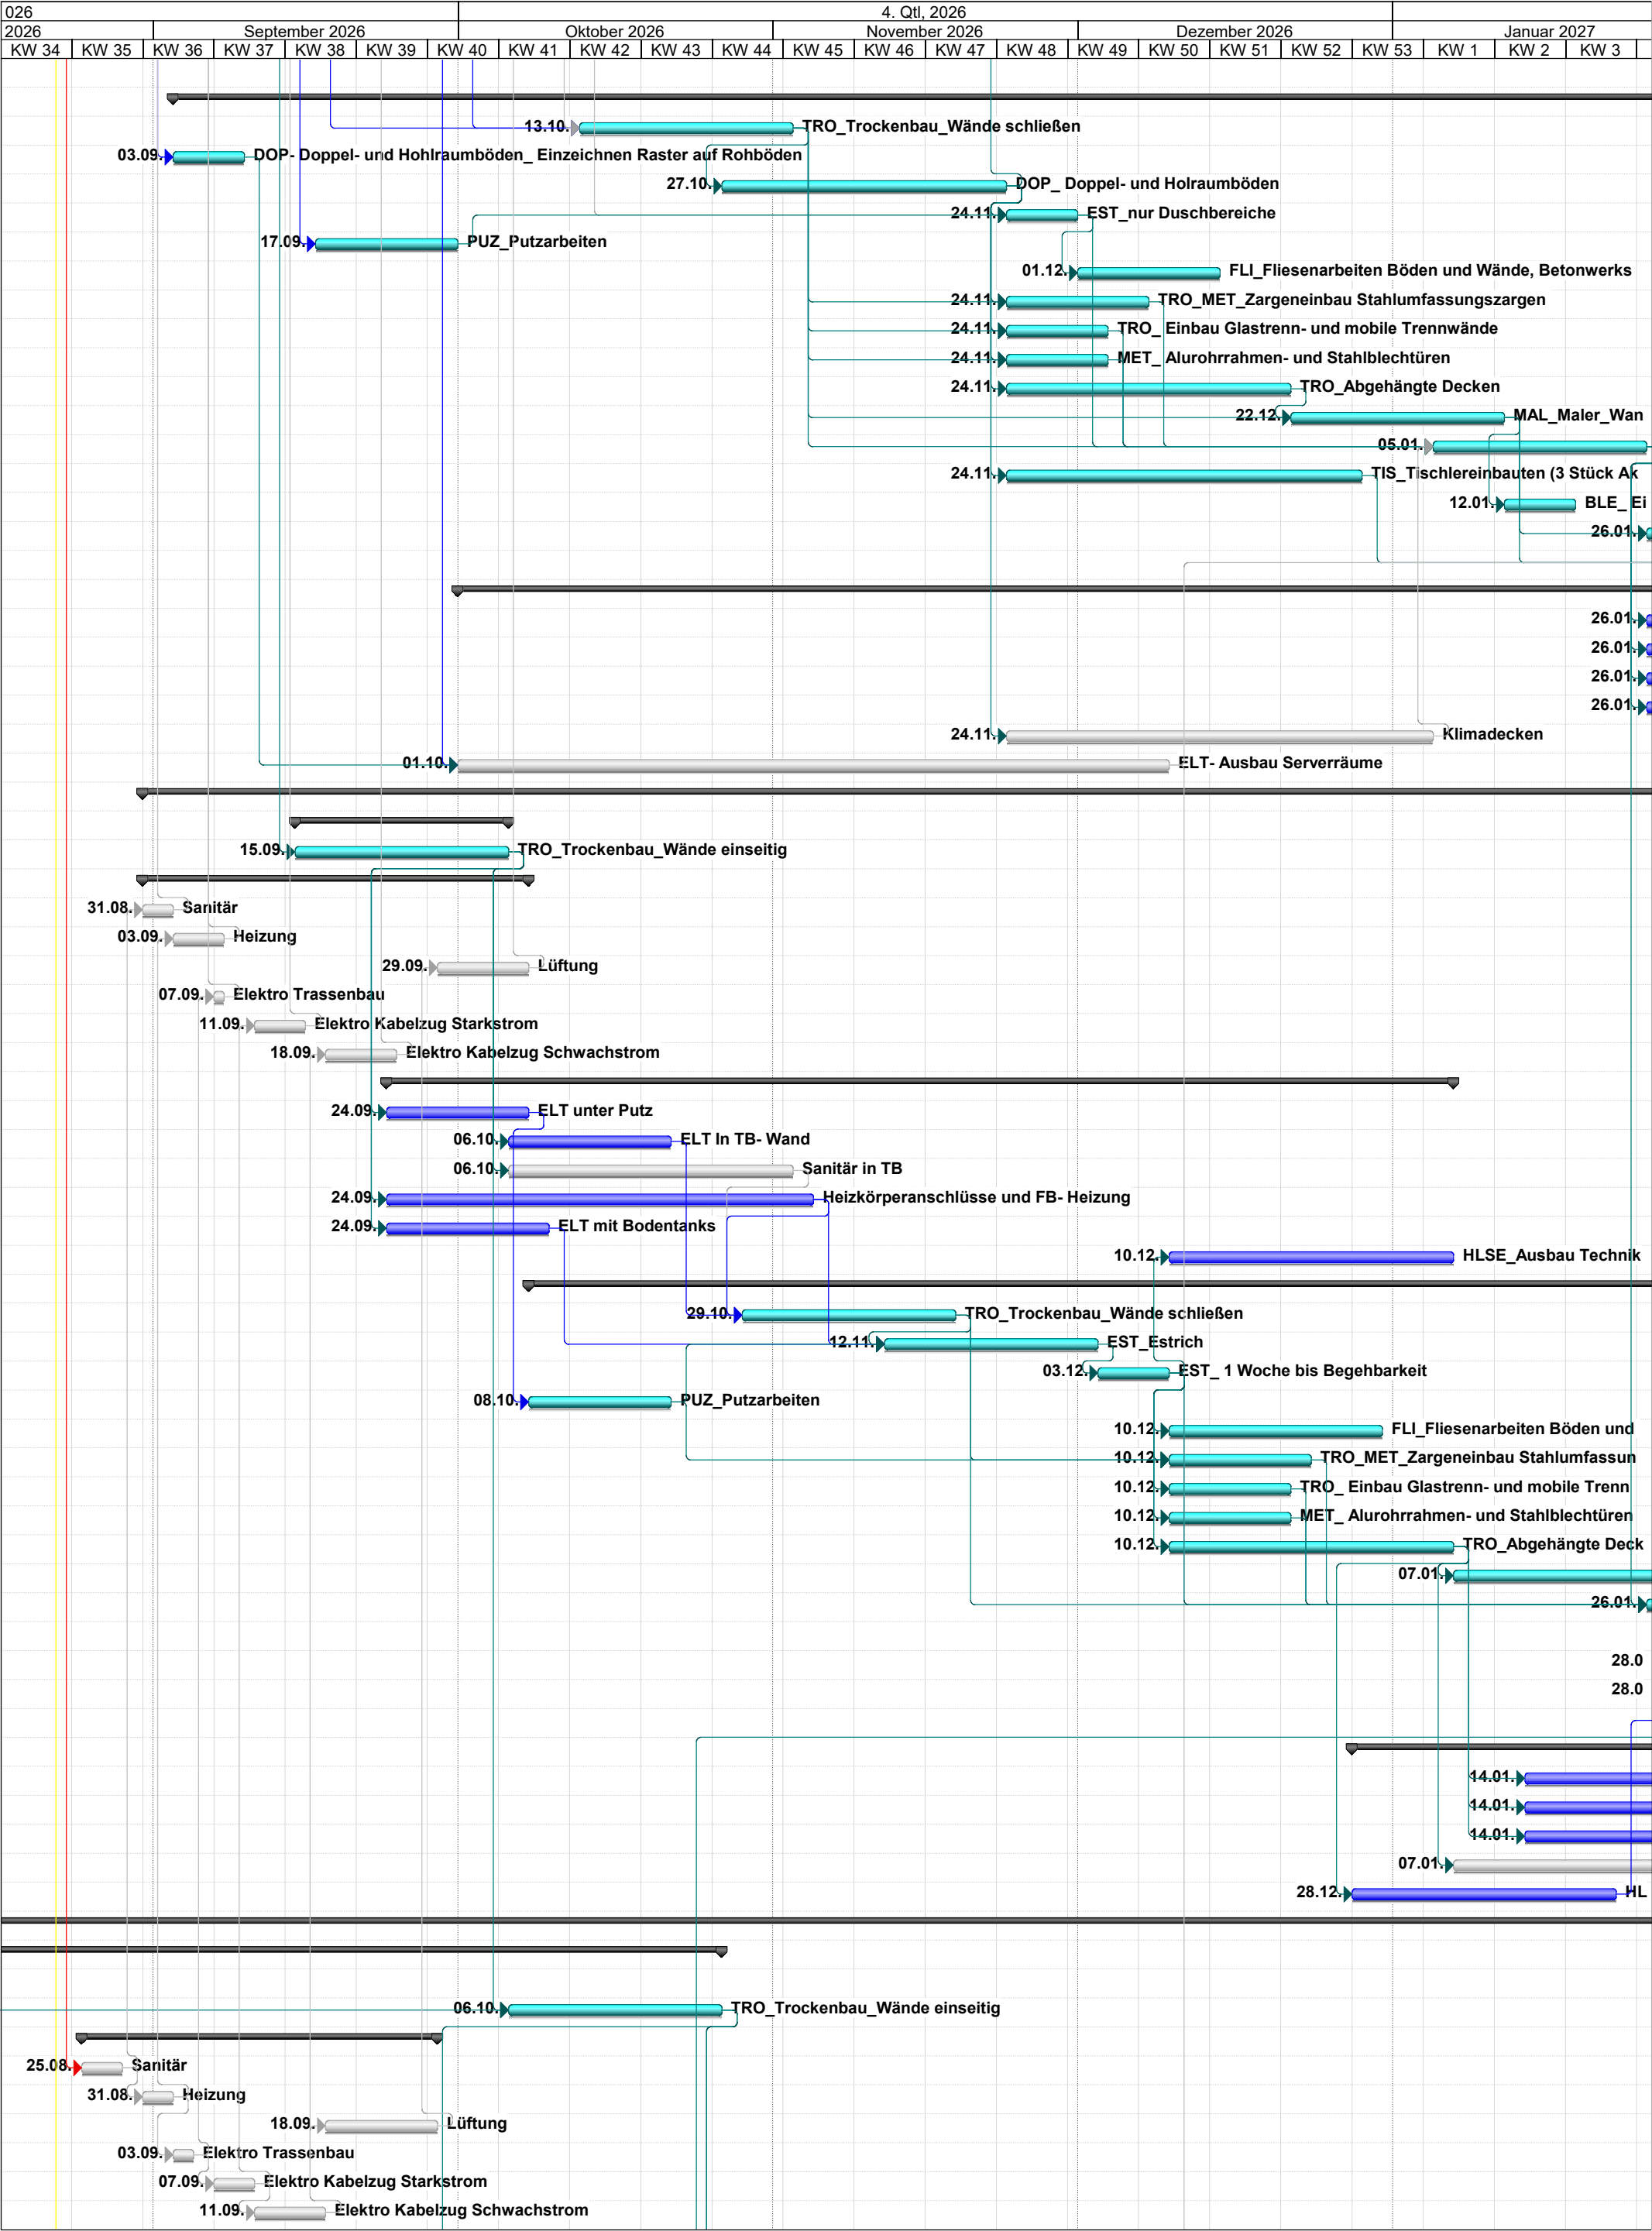



HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 2.OG (Schächte inkl. Stahlebenen)

