

Grundhafte Erneuerung Vor dem Rostocker Tor

19.05.2026

Stadt Bützow

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

20.04.2026 - 30.10.2027

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
49
0

Vorgänge


2

Vorgang	Anfang	Ende
Los 1 - Tiefbauarbeiten	12.05.26	12.02.27
Vorbereitung und Baustelleneinrichtung	12.05.26	28.05.26
Einholung VAO	20.04.26	08.05.26
Verkehrssicherung - Gesamtkonzept aufbauen	08.05.26	19.05.26
Baustelleneinrichtung	11.05.26	28.05.26
Baufeldberäumung, Sicherung von Leitungen	29.05.26	31.12.26
Baufeldräumung und Erdarbeiten	29.05.26	31.12.26
Sicherung Leitung und Anlagen	29.05.26	26.11.26
Kanalbau - DN 500 Vorflut + Schmutzwasser parralel	29.05.26	14.07.26
DN 500 Hauptkanal verlegen	29.05.26	14.07.26
Schmutzwasser DN 150	01.06.26	19.06.26
RiStWag-Anlage	15.07.26	04.08.26
RiStWag-Anlage errichten	15.07.26	04.08.26
RW-Leitung von RiStWag - Richtung Stadt	05.08.26	27.10.26
Kanalbau DN 300 Richtung Stadt	05.08.26	27.10.26
RW-Leitung von RiStWag - Richtung Ortsausgang	28.10.26	22.12.26
Kanalbau DN 300/400 Richtung Ortsausgang	28.10.26	22.12.26
Prüfung, Dokumentation und Baustellenräumung	23.12.26	12.02.27
Kanalprüfung, Dokumentation und Übergabe	23.12.26	29.01.27
Baustellenräumung	01.02.27	12.02.27
Los 2 - Straßenbau, Nebenanlagen, Bordanlagen	26.10.26	28.05.27
Baustelleneinrichtung	26.10.26	06.11.26
Verkehrssicherung vorhalten	26.10.26	21.05.27
BA 1 → Stadtmitte - RiStWag	02.11.26	05.03.27
Baufeldräumung/Leitungssicherung	02.11.26	20.11.26
Asphalt fräsen/Rückbau	02.11.26	13.11.26
Erdarbeiten + Planum herstellen	09.11.26	04.12.26

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Straßenentwässerung	23.11.26	11.12.26
Schichten ohne Bindemittel	30.11.26	11.12.26
Bordanlage + Rinnenanlage	30.11.26	18.12.26
Straßenbeleuchtung	09.11.26	18.12.26
Pflasterarbeiten BA 1	01.02.27	05.03.27
Winterpuffer	21.12.26	29.01.27
BA 2 → RiStWag - Stadtausgang	01.02.27	14.05.27
Baufeldräumung/Leitungssicherung	01.02.27	19.02.27
Asphalt fräsen/Rückbau	08.02.27	19.02.27
Erdarbeiten + Planum herstellen	08.02.27	05.03.27
Straßenentwässerung	22.02.27	12.03.27
Schichten ohne Bindemittel	01.03.27	26.03.27
Bordanlage + Rinnenanlage	15.03.27	02.04.27
Straßenbeleuchtung	08.02.27	31.03.27
Pflasterarbeiten BA 2	29.03.27	07.05.27
Landschaftsbauarbeiten	26.04.27	14.05.27
Abnahme + Dokumentation	10.05.27	21.05.27
Baustellenräumung	17.05.27	28.05.27
Los 3 - Asphaltarbeiten	24.05.27	06.07.27
Bauzeit Los 3 - Asphaltarbeiten	24.05.27	06.07.27
Los 4 Pflanzarbeiten	27.09.27	29.10.27
Bauzeit Los 4 - Pflanzarbeiten	27.09.27	29.10.27

Gantt-Diagramm

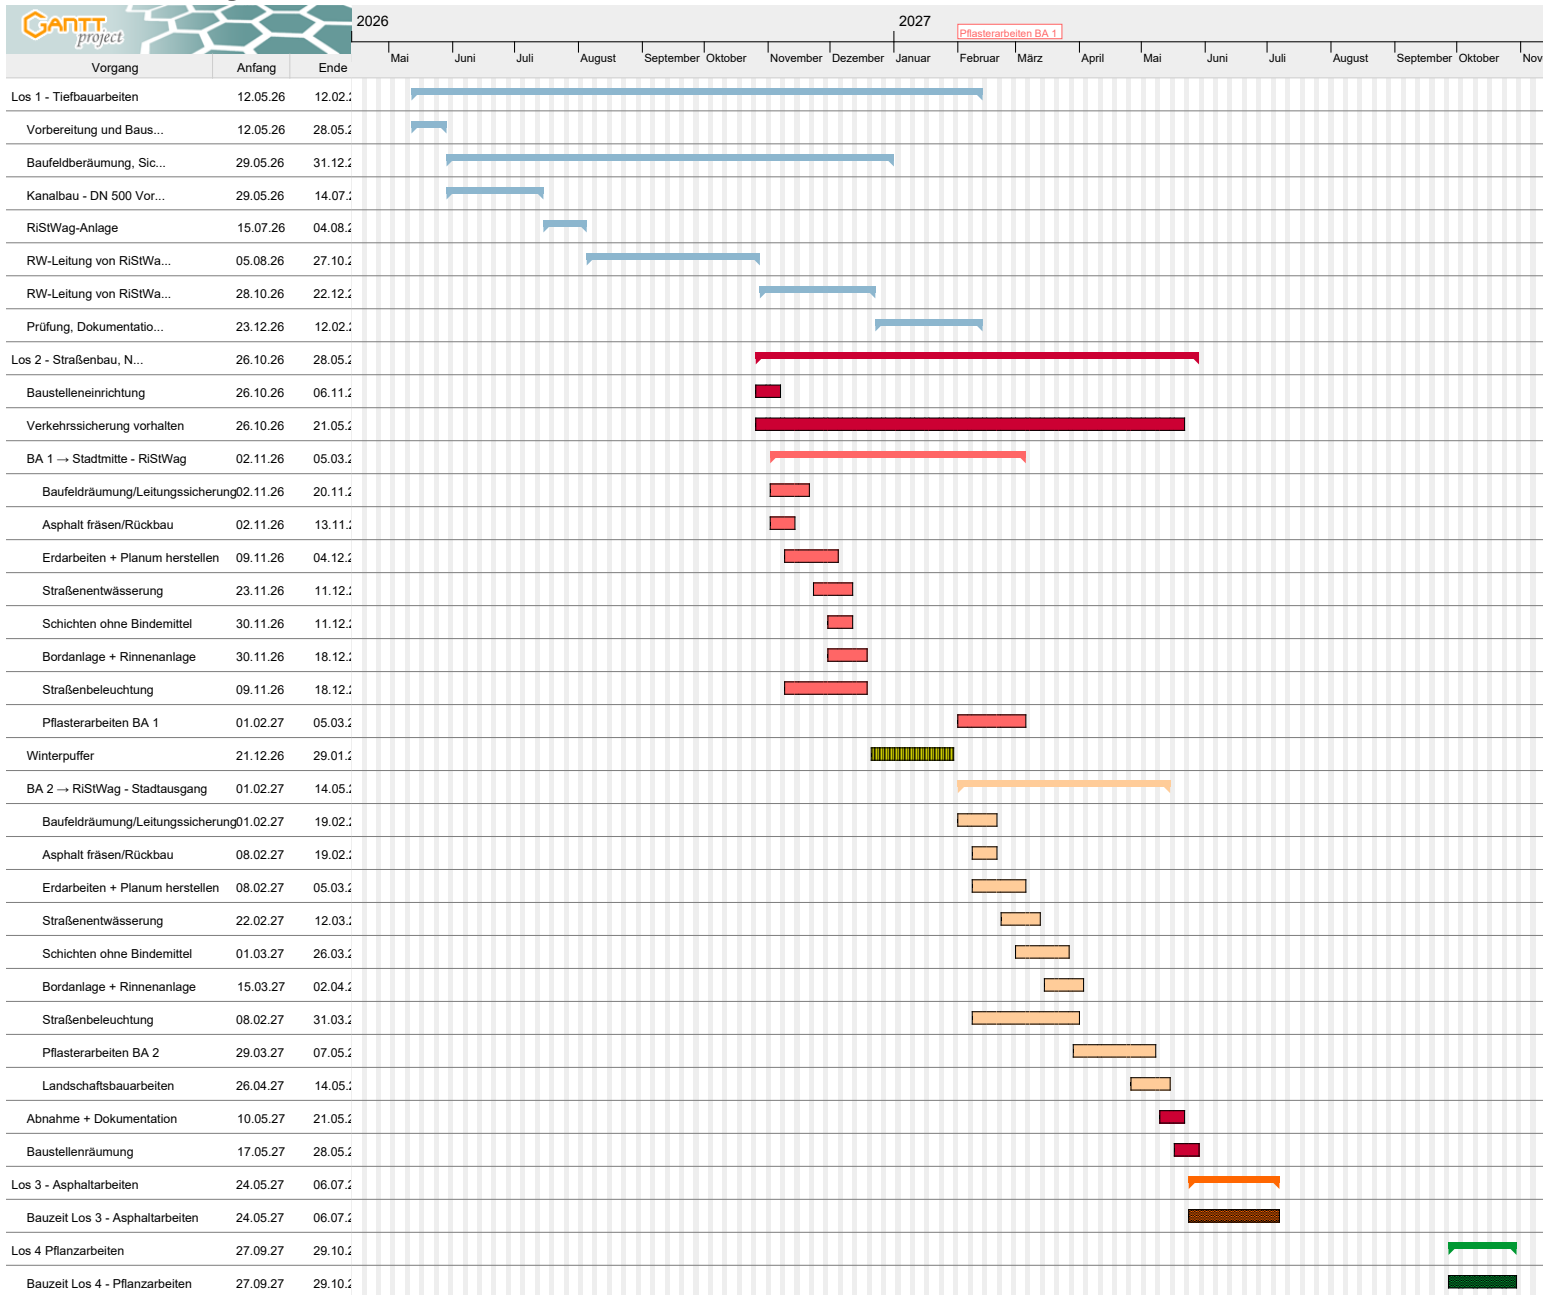

Ressourcendiagramm

