







Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT



Z 274-58

Z 274-60



HE1.21LTB



AUFBAU

Phase 1 / 5



Vorbereitung der FAT

- ↳ Abstände der VWT untereinander und zur FAT herstellen
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Weiterfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

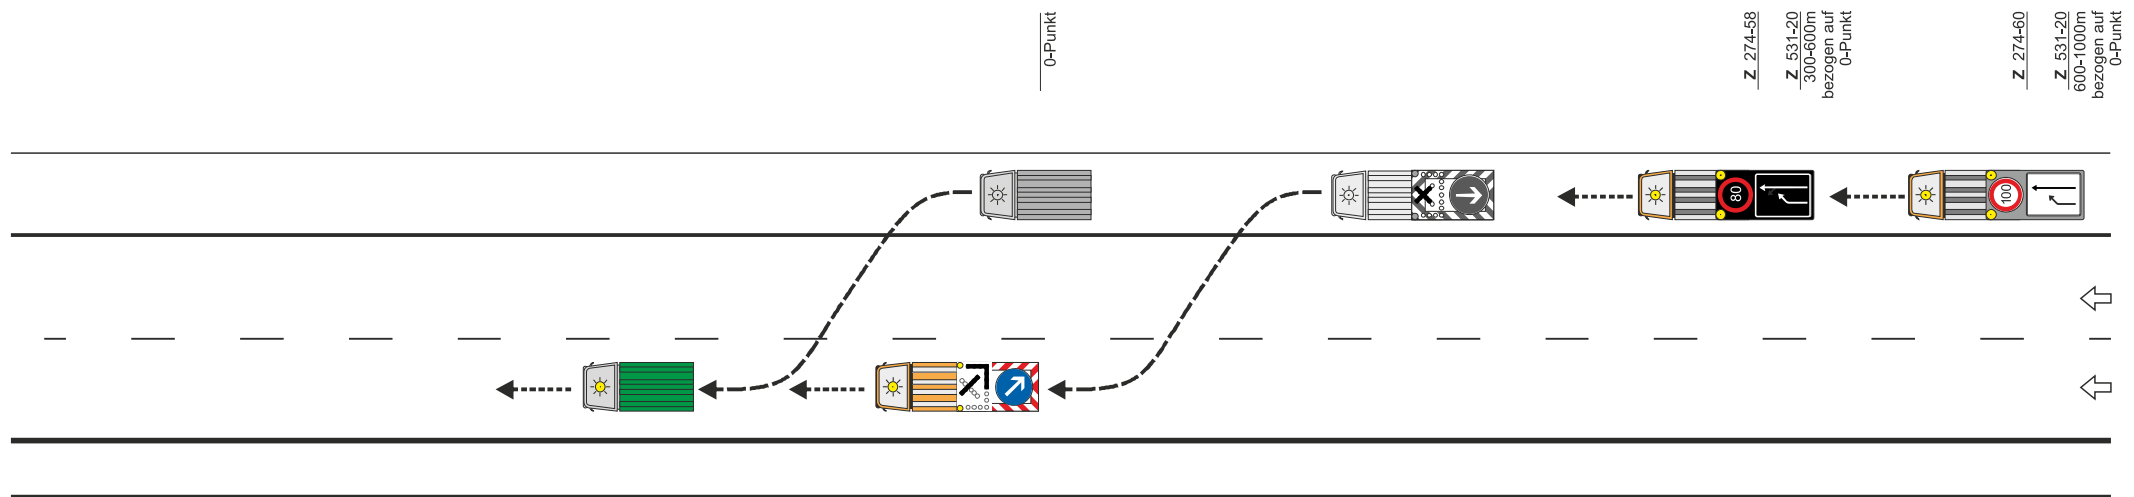



HE1.21LTB

AUFBAU

Phase 2 / 5



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches
↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

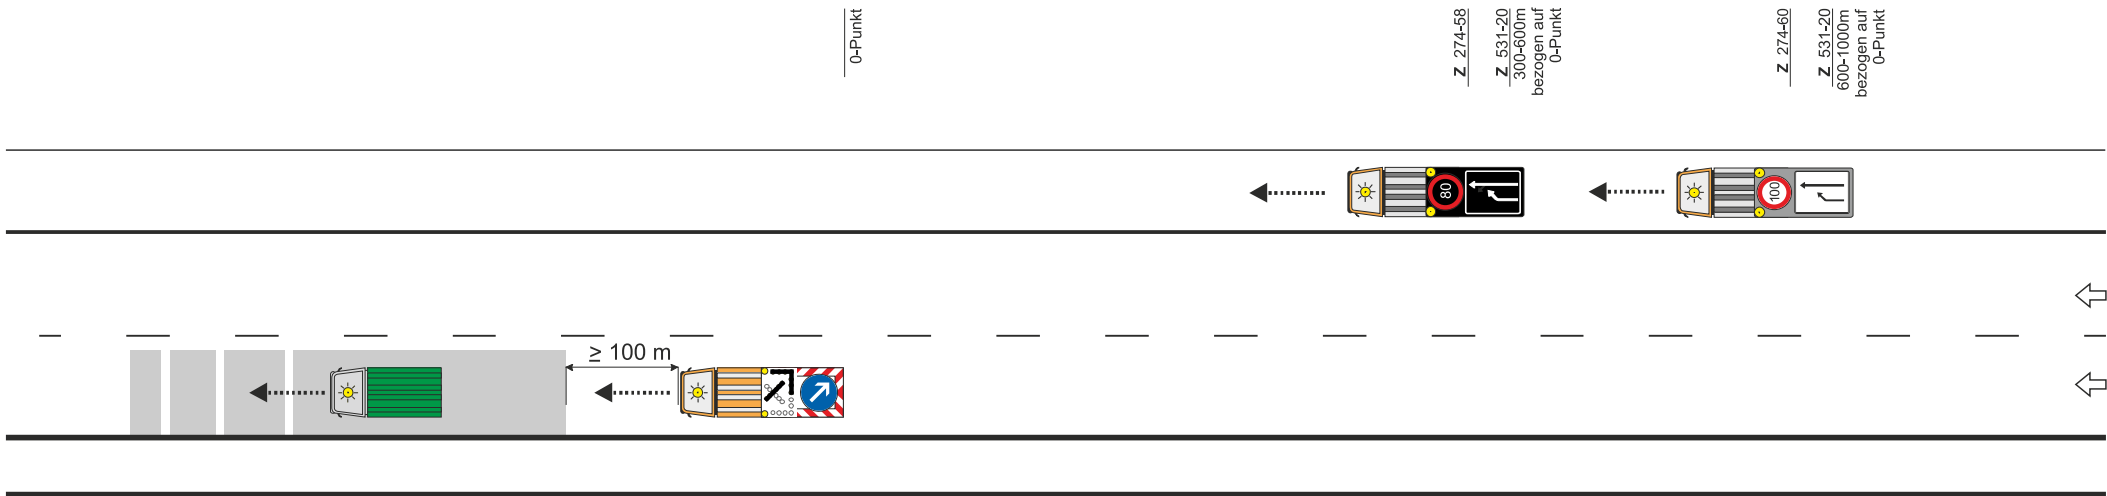



HE1.21LTB

ARBEITSSTELLE

Phase 3 / 5



- Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs
 - ↳ Information an Personal der VWT zum Ausfahren

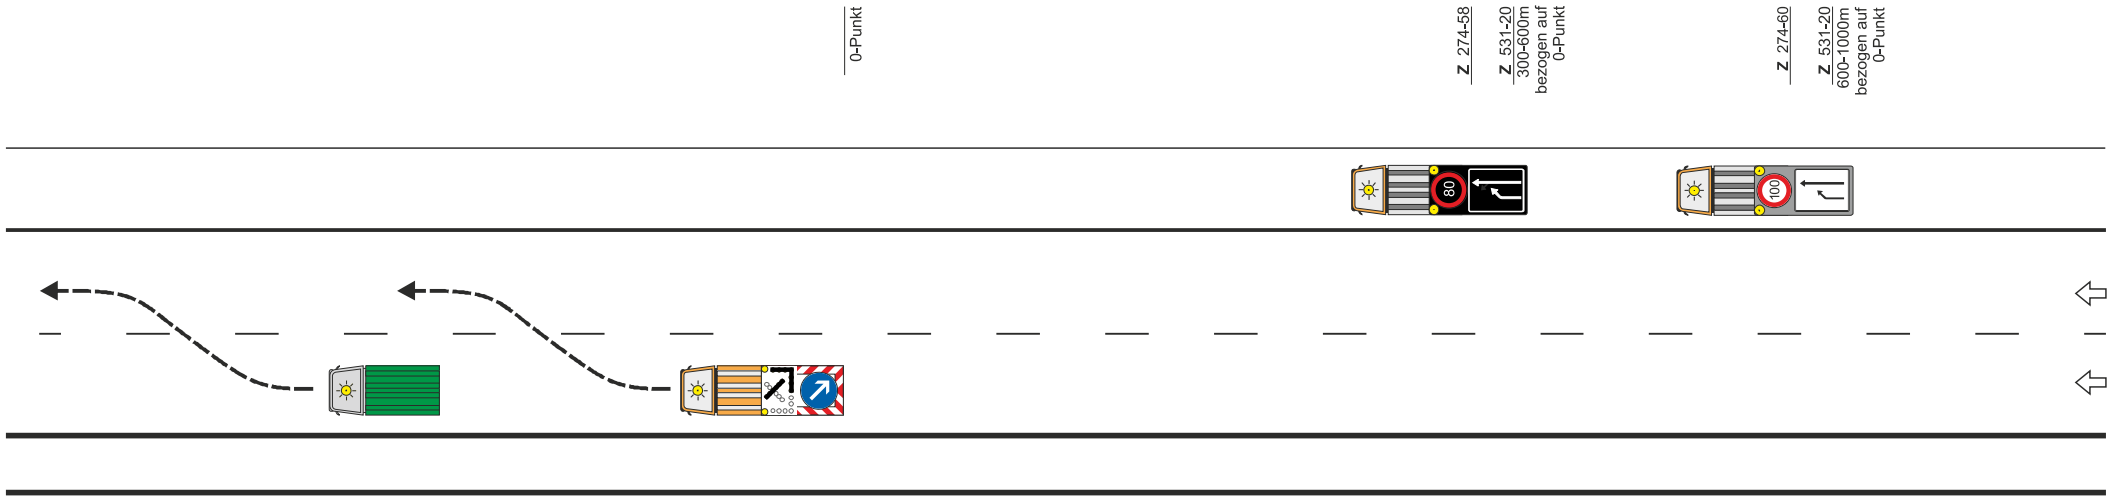



Vorwarneinrichtungen außer Betrieb setzen



↳ VWT außer Betrieb setzen

↳ Ausfahren der VWT



Z 274-58

Z 274-60

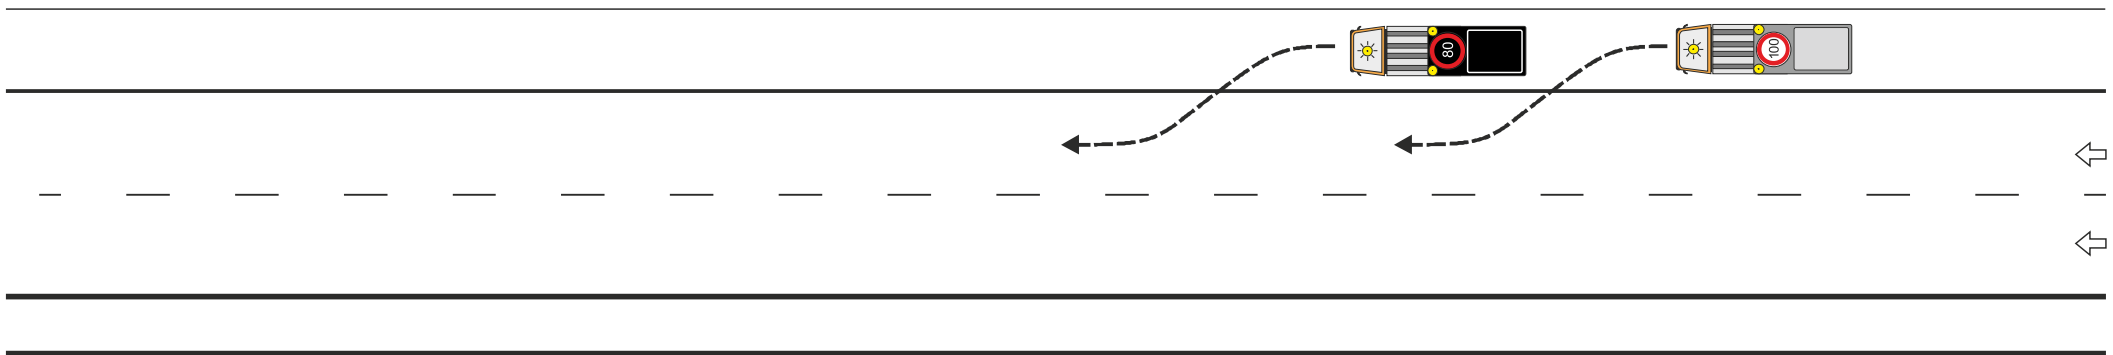

HE1.21LTB

ABBAU

Phase 5 / 5
