





Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT



Z 274-58

Z 274-60



HE1.15LN



AUFBAU

Phase 1 / 8



VZ-Montage

- ↳ Abstände der VWT untereinander und zur FAT herstellen
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
- ↳ Montage und einschalten Kleiner Blinkpfeil am vorgesehenen Standort „0“
- ↳ Weiterfahren zum Standort „1“ und VZ-Montage am vorgesehenen Standort „1“
- ↳ Weiterfahrt zum Standort „2“, dabei 1. VWT am Standort „1“ belassen
- ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „2“, dabei VWT am Standort „2“ belassen
- ↳ Weiterfahrt der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

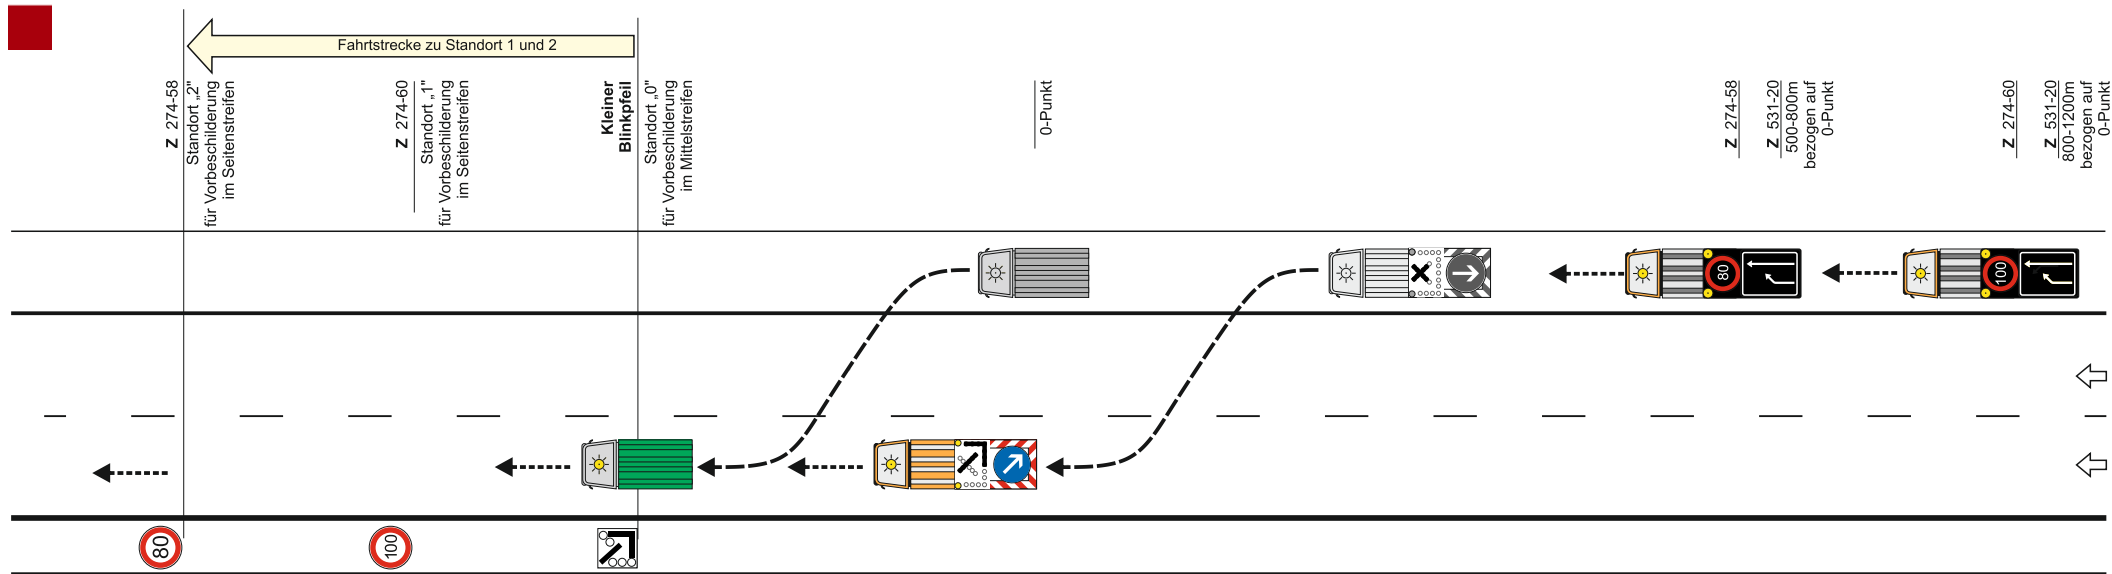


HE1.15LN

AUFBAU

Phase 2 / 8



- Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches
↳ Aufbau der Leitbaken im Abstand von 18,00 m
↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

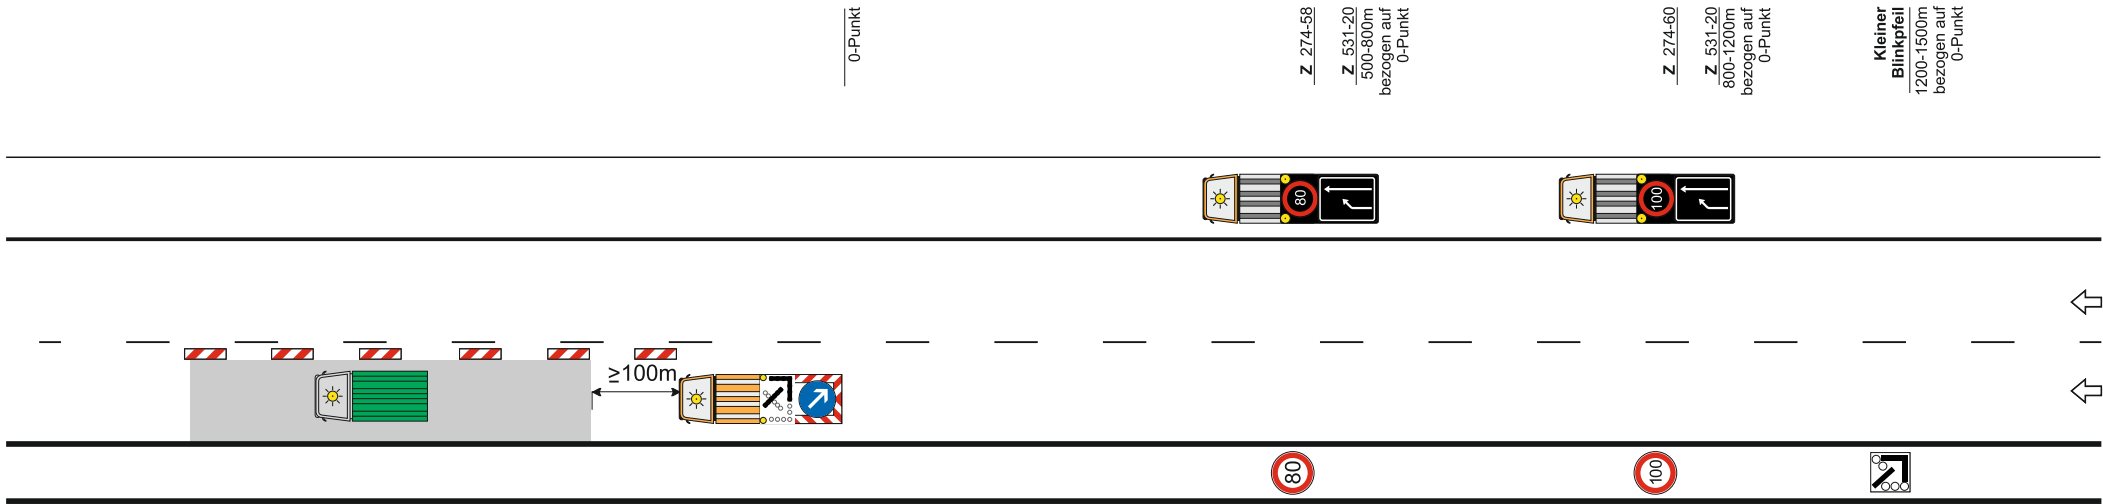



Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches


↳ Abbau der Leitbaken

↳ Ausfahren des Arbeitsfahrzeugs

↳ Ausfahren der FAT bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)

↳ Information an Personal der VWT zum Ausfahren und nachfolgenden Einholen der VZ im Mittelstreifen

- ggf. Anforderung der Zugfahrzeuge an VWT



0-Punkt



Z 274-58

Z 531-20
500-800m
bezogen auf
0-Punkt

Z 274-60

Z 531-20
800-1200m
bezogen auf
0-Punkt

Kleiner
Blinkpfeil
1200-1500m
bezogen auf
0-Punkt

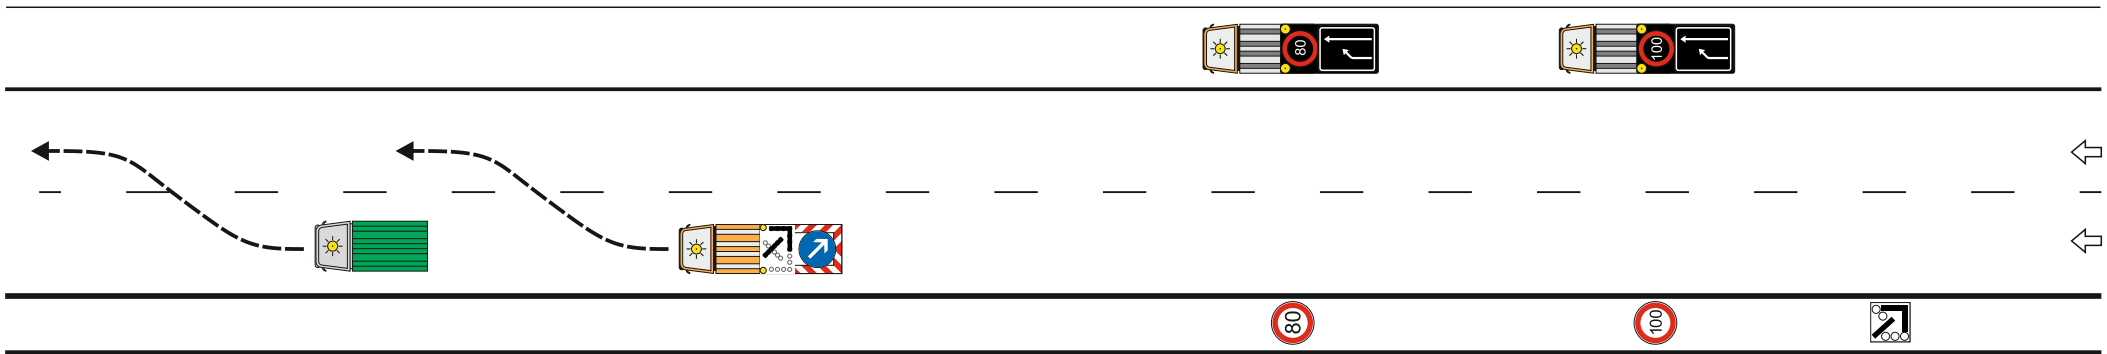

HE1.15LN

ABBAU




Phase 4 / 8



Vorwarneinrichtungen außer Betrieb setzen

↳ VWT außer Betrieb setzen

↳ Ausfahren bis zur nächsten Wendemöglichkeit
(s. Skizze)

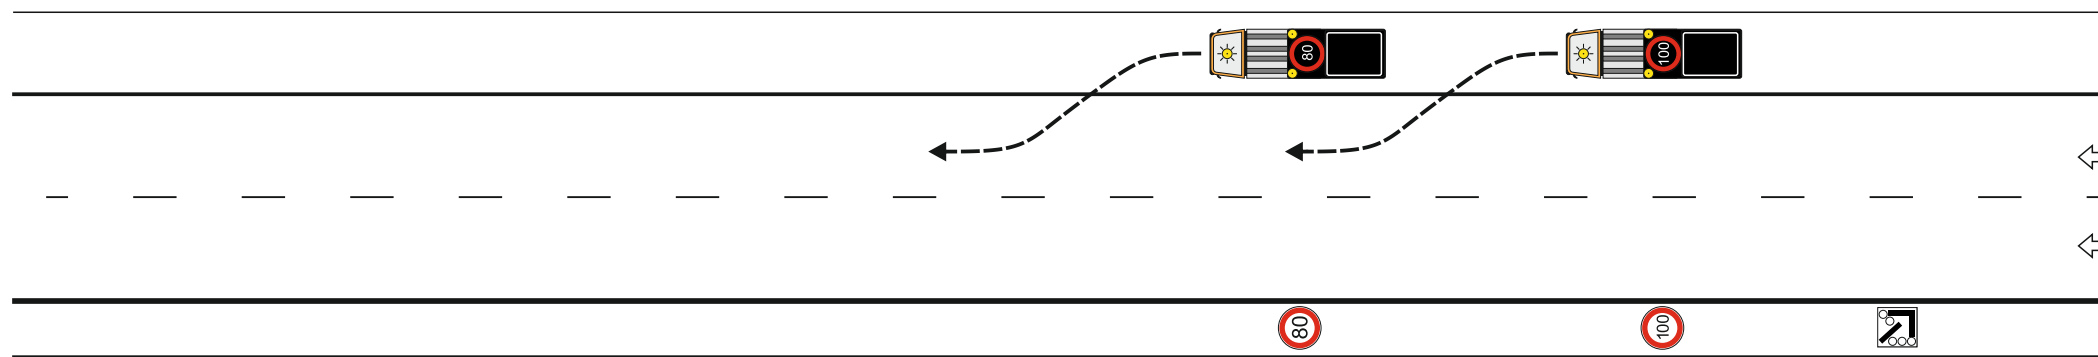

HE1.15LN

ABBAU

Phase 5 / 8



Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Standstreifen
↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT





Z 274-58

Z 274-60

Kleiner
Blinkpfeil

Z 274-58

Z 274-60

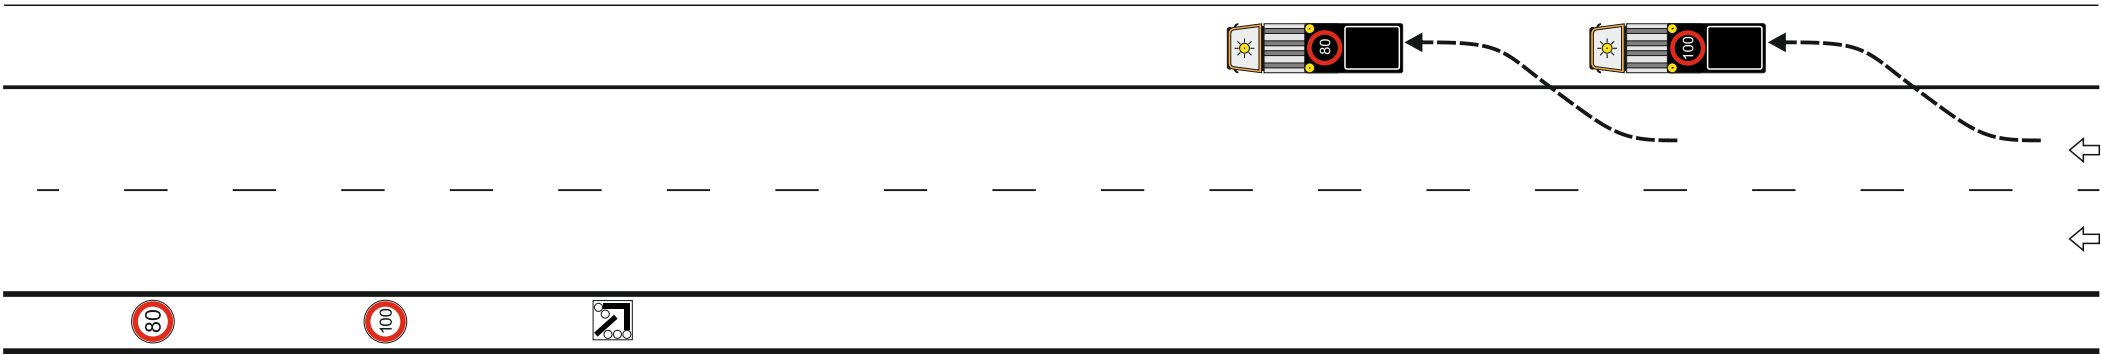

HE1.15LN



ABBAU

Phase 6 / 8



VZ-Demontage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs mit dem fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ Demontage Kleiner Blinkpfeil am Standort „0“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „1“ und „2“
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „1“ und „2“

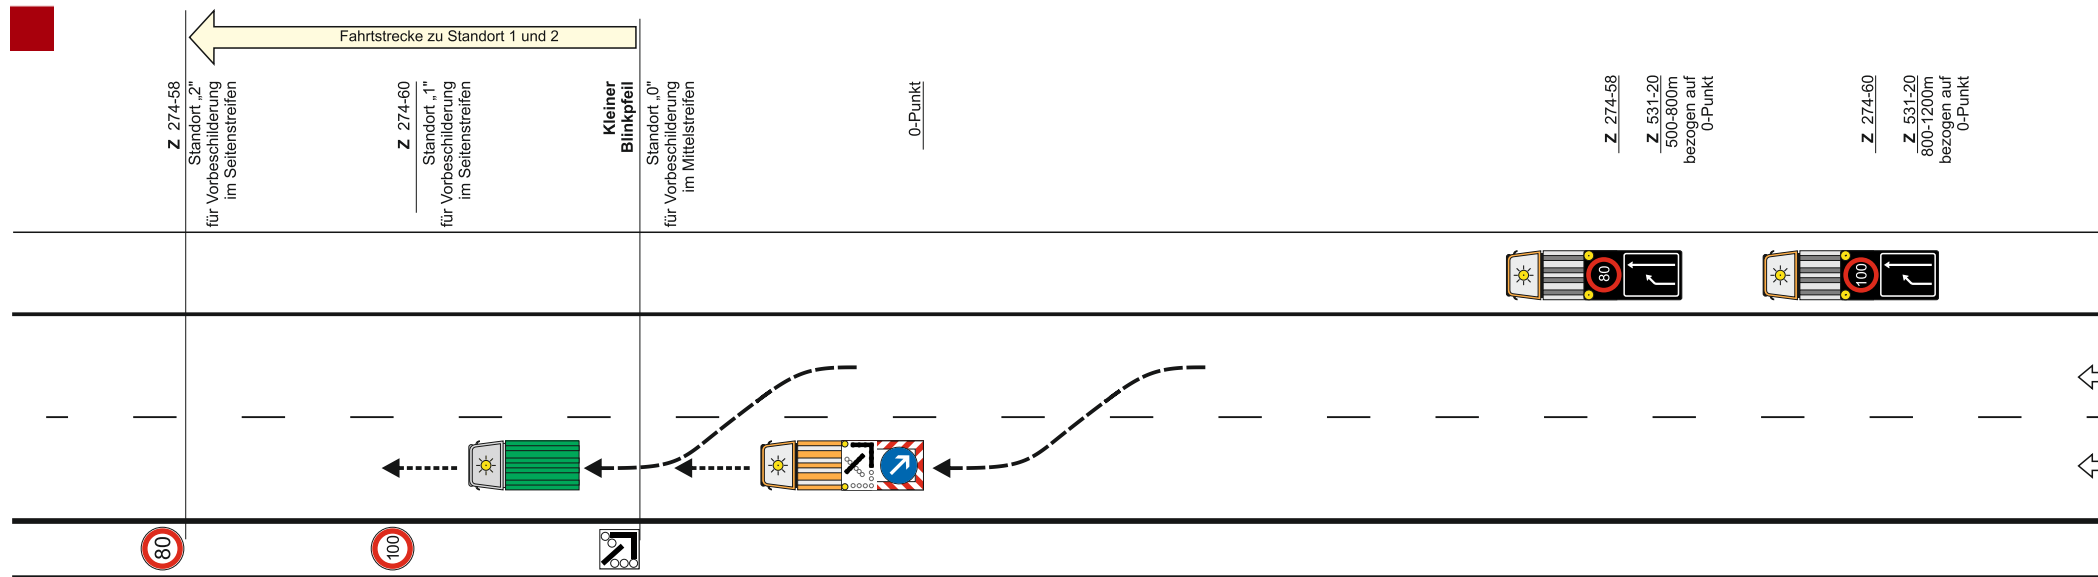

HE1.15LN

ABBAU

Phase 7 / 8





Vorwarntafel außer Betrieb setzen

- ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs
- ↳ VWT außer Betrieb setzen
- ↳ Ausfahren der VWT



Z 274-58

Z 274-60

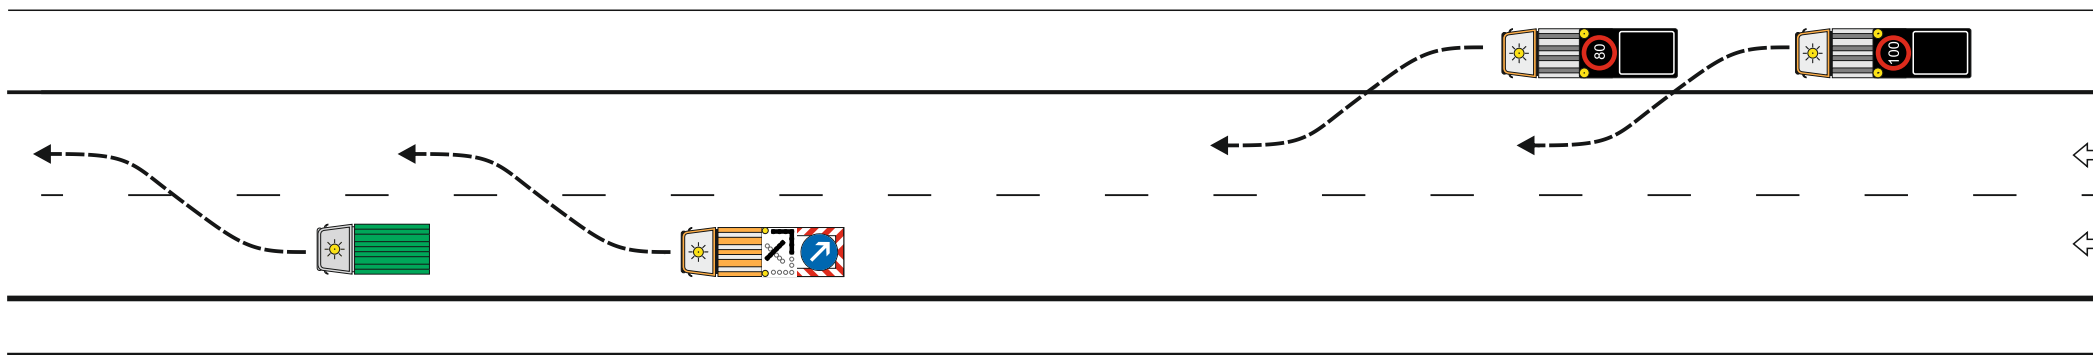

HE1.15LN

ABBAU

Phase 8 / 8
