





- Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen
↳ Aktivierung der SBA für Sperrung anfordern
↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf den Seitenstreifen

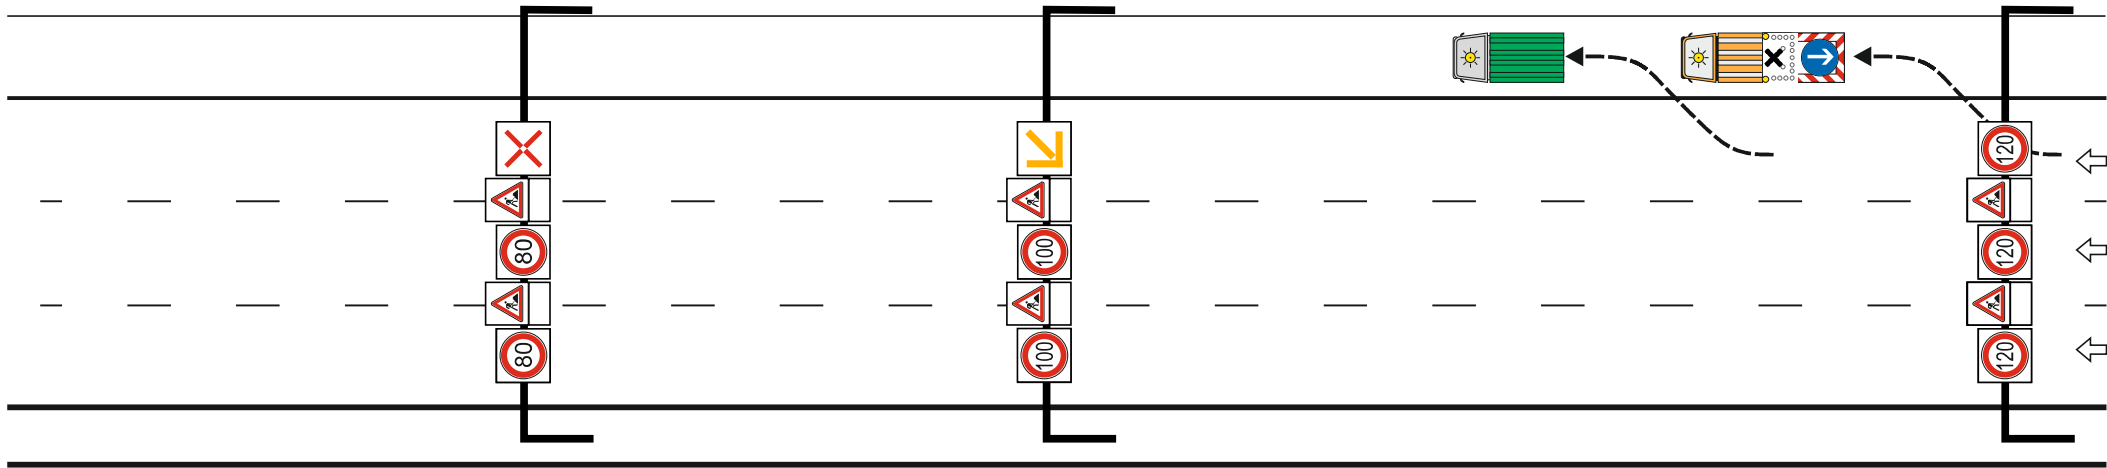



HE1.27RTS

AUFBAU

Phase 1 / 4



- Vorbereitung der FAT
- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs in den fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
 - ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ Vorfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

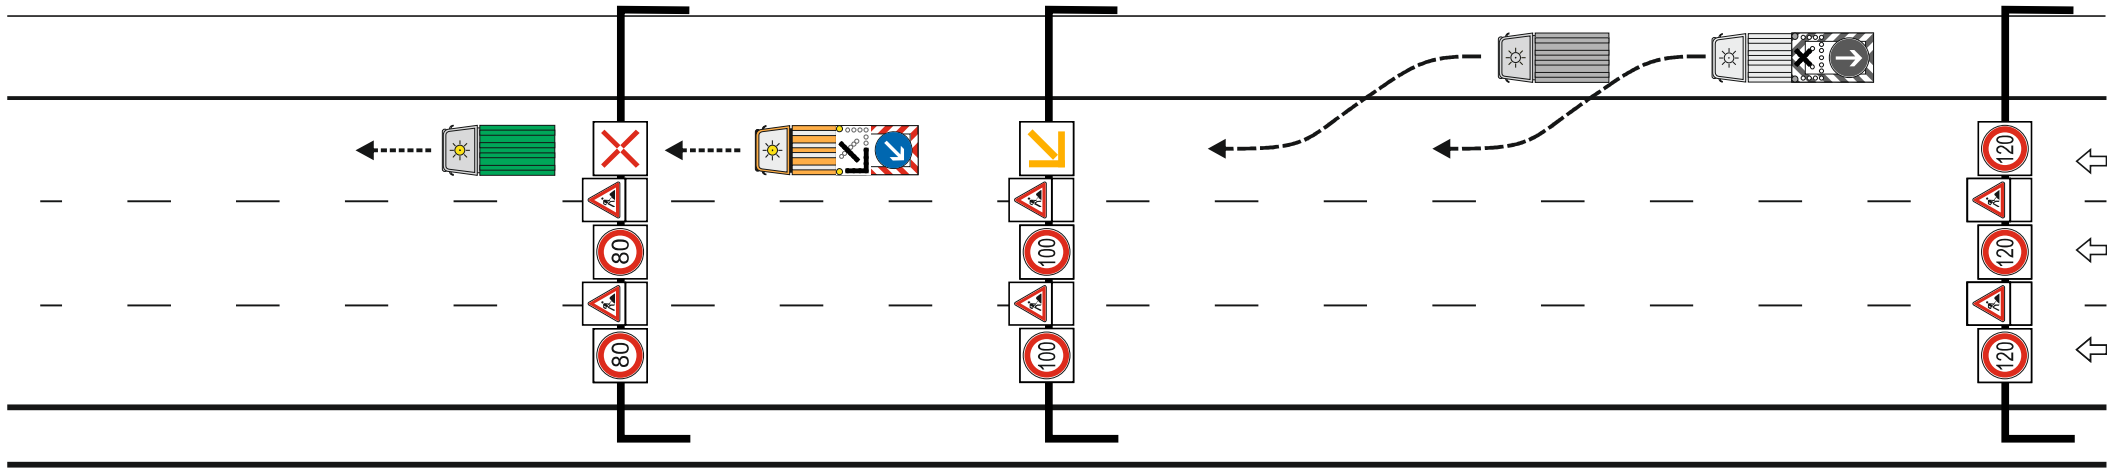

HE1.27RTS


AUFBAU

Phase 2 / 4




Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
- ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 100,00$ m

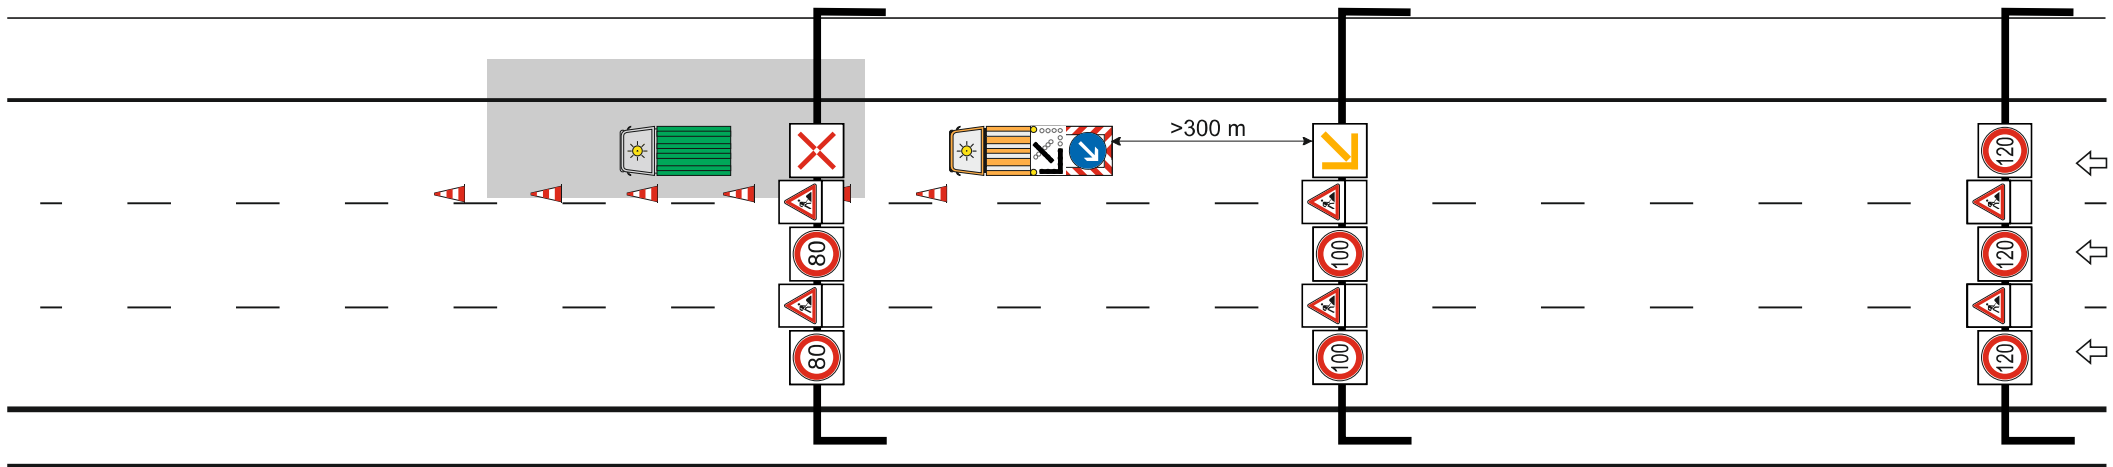

Achtung!
300 m beachten



HE1.27RTS



ARBEITSSTELLE

Phase 3 / 4



Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Abbau Leitkegel
- ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs
 - ↳ Deaktivierung der SBA für Freigabe anfordern

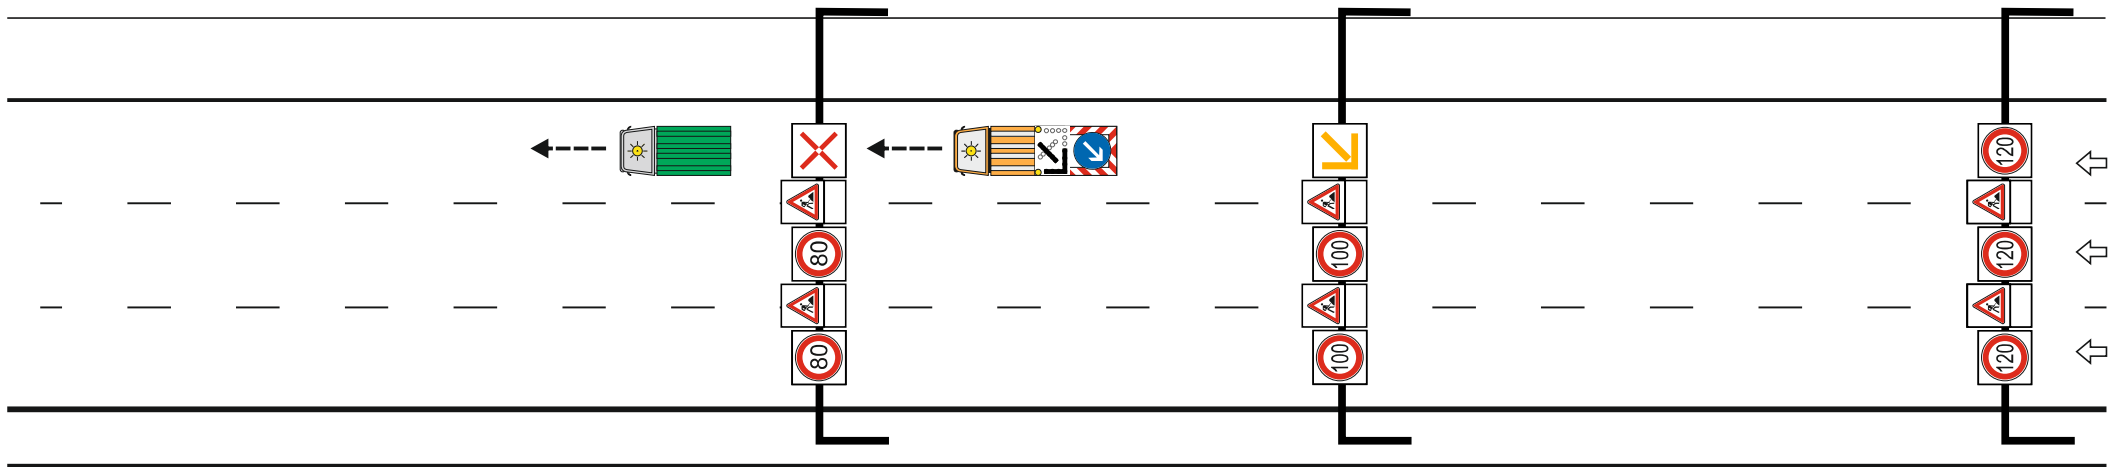

HE1.27RTS

ABBAU

Phase 4 / 4
