





VZ-Montage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf dem Seitenstreifen
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „1“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „2“
 - ↳ VZ-Montage am vorgesehenen Standort „2“
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)

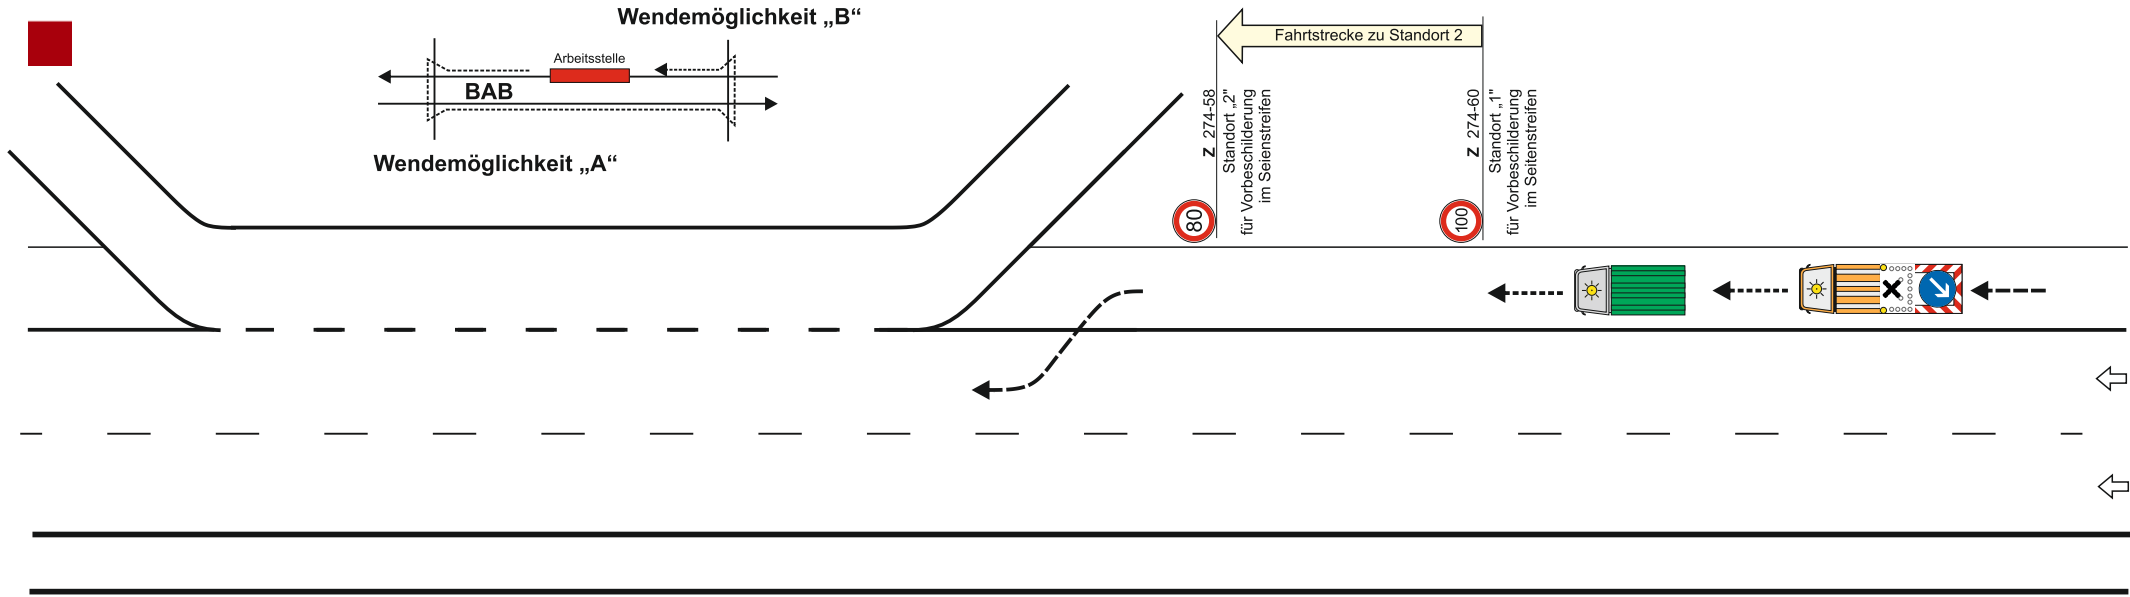

HE1.69RTK



AUFBAU

Phase 1 / 11



Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen

- ↳ Einfahren der VWT auf dem Seitenstreifen
 - ↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT
 - ↳ Funktionsprüfung aller Absperrelemente

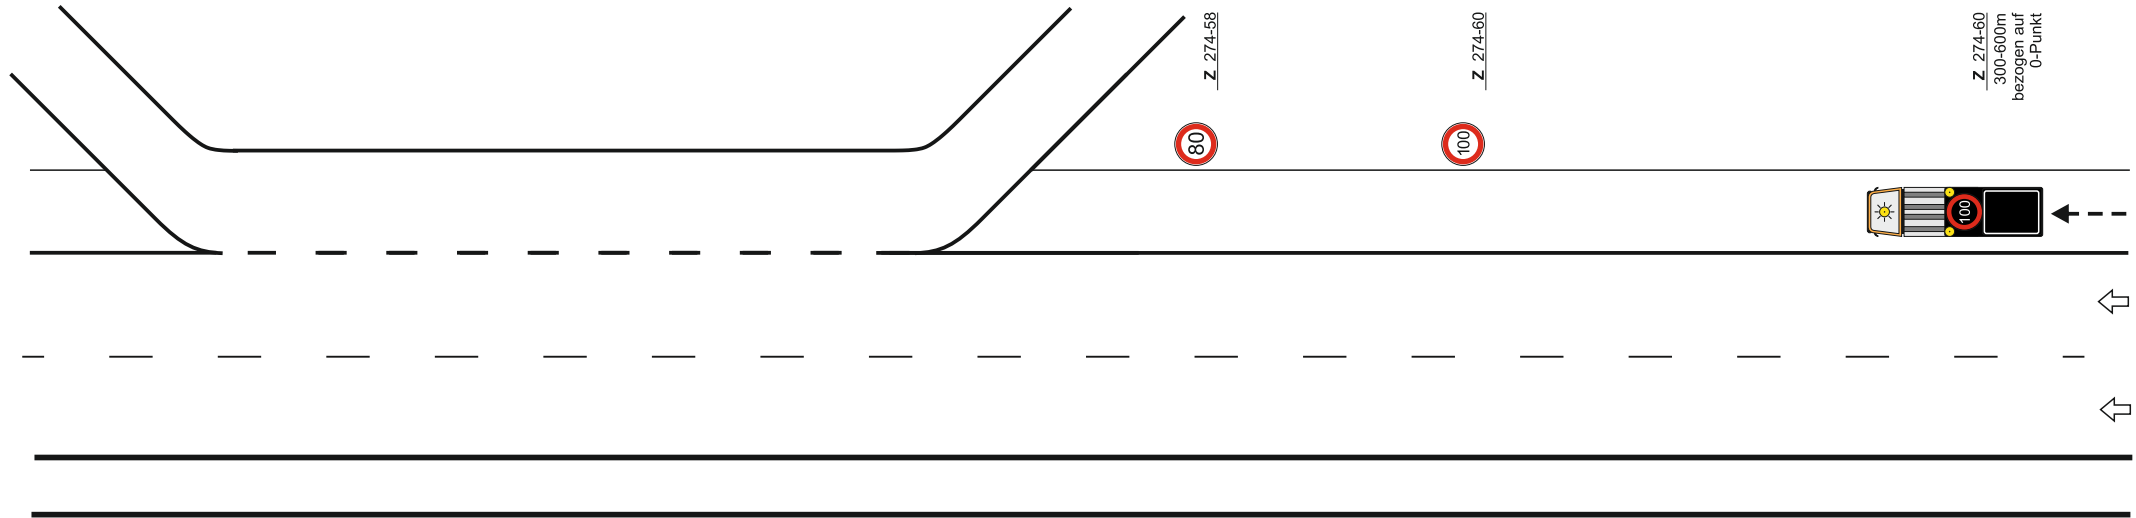

HE1.69RTK


AUFBAU

Phase 2 / 11



-

-





AUFBAU

Phase 3 / 11



VZ-Montage

- ↳ VWT außer Betrieb setzen
- ↳ Ausfahren der VWT
 - ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs mit dem fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
 - ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ VZ-Montage
 - ↳ Weiterfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zum Arbeitsbereich

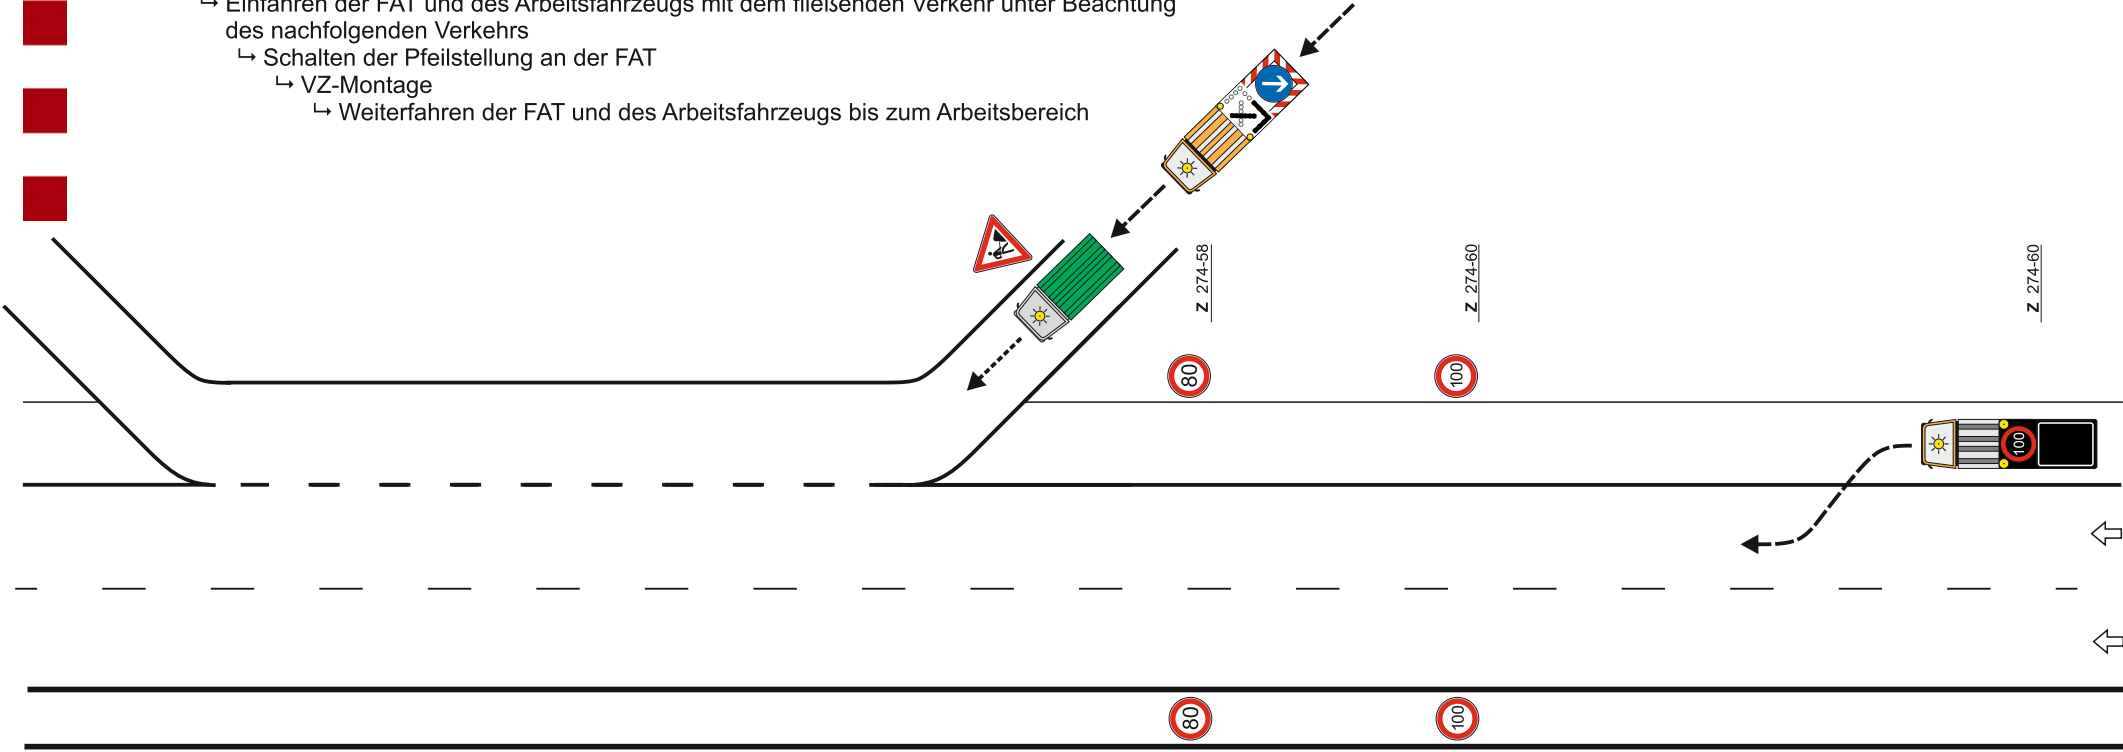

HE1.69RTK



AUFBAU

Phase 4 / 11



Sicherung des unmittelbaren Arbeitsbereiches

- ↳ Aufbau der Leitkegel im Abstand von 18,00 m
- ↳ Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Arbeitsbereich $\geq 50,00$ m

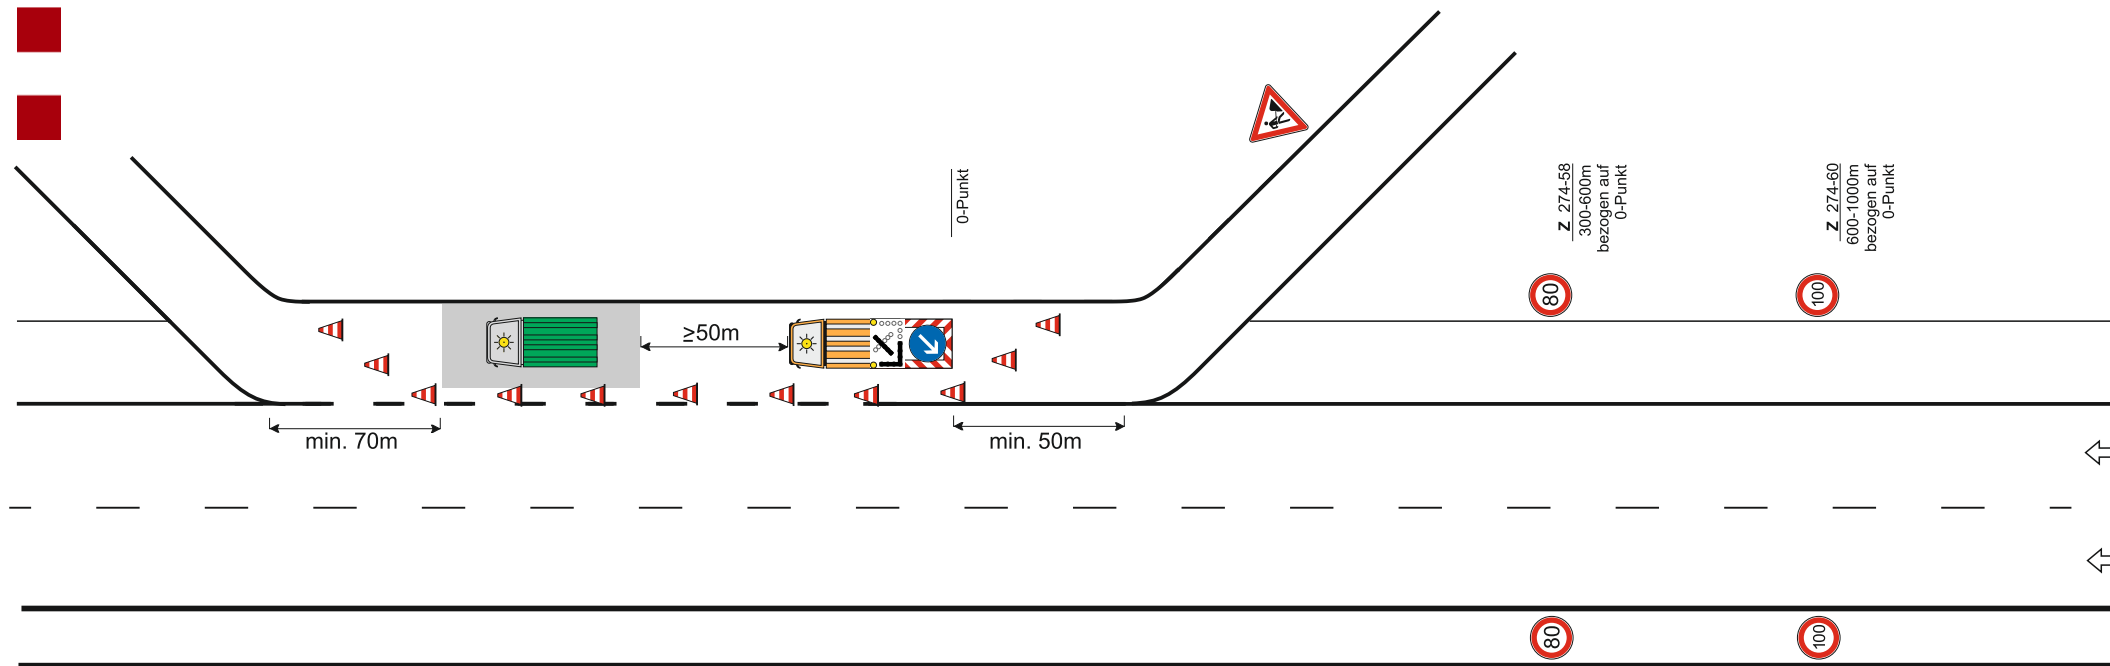



HE1.69RTK

ARBEITSSTELLE

Phase 5 / 11



- Abbau des unmittelbaren Arbeitsbereiches
↳ Abbau Leitkegel
↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

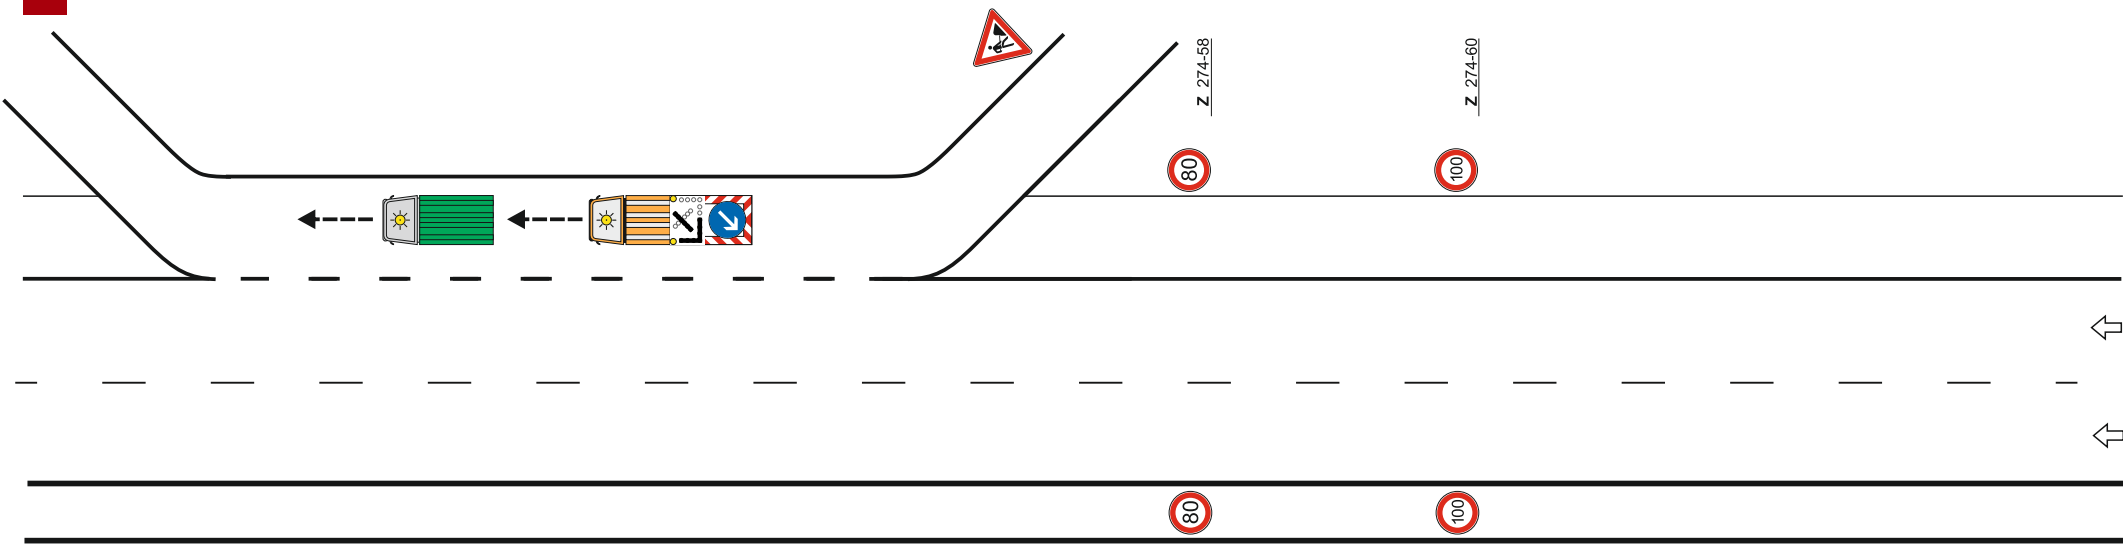

HE1.69RTK



ABBAU

Phase 6 / 11

- 

- 

- 

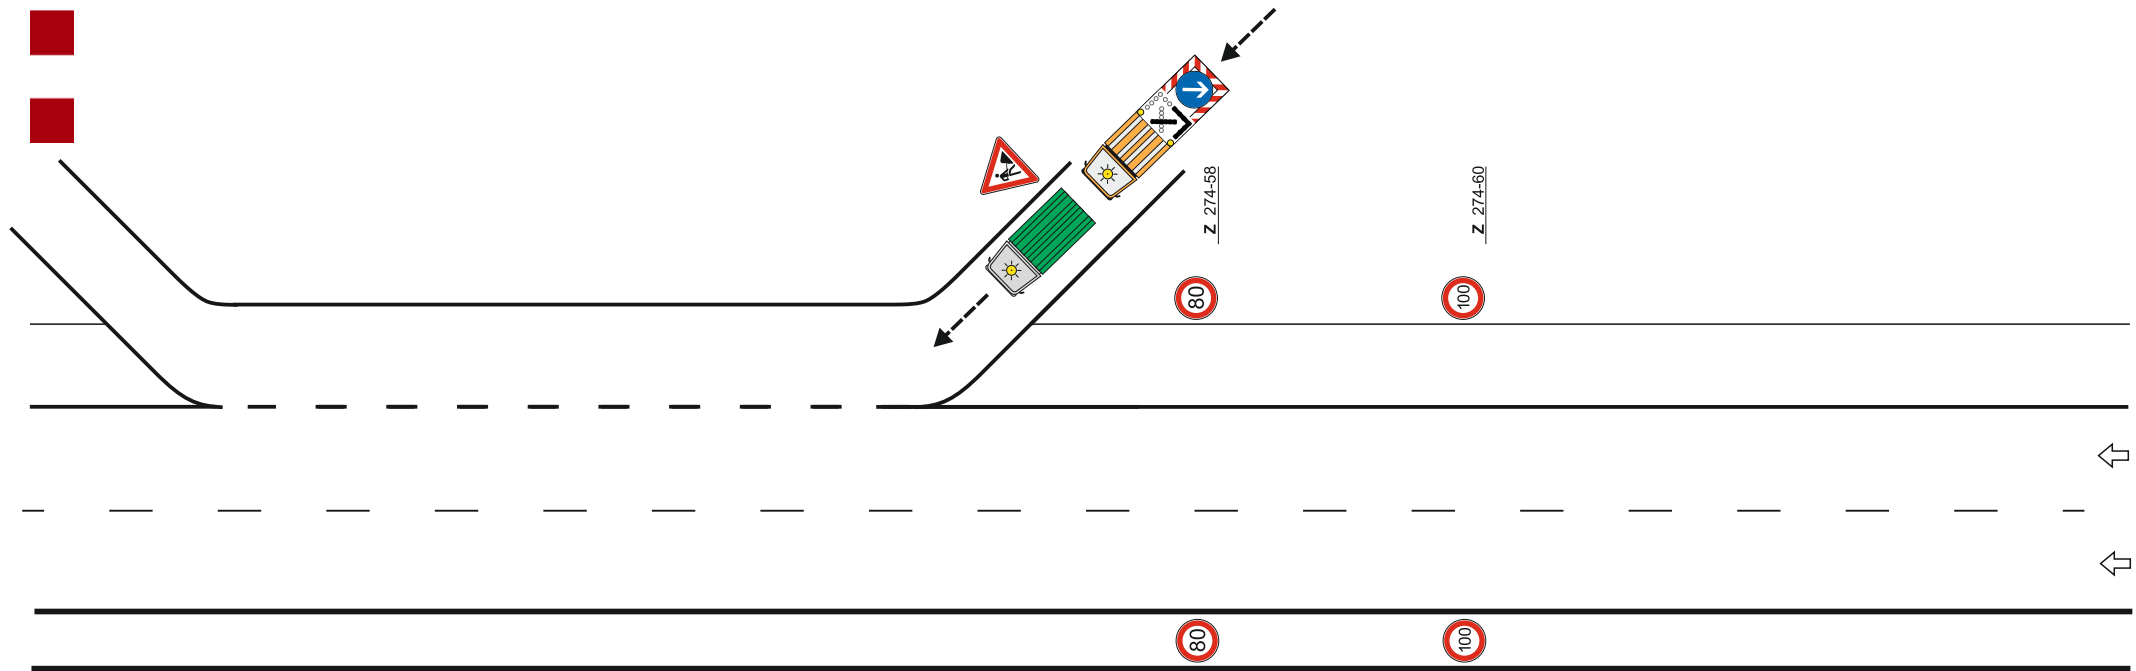



ABBAU

Phase 7 / 11



Vorbereitung der Absperrelemente auf dem Seitenstreifen

- ↳ Einfahren der VWT auf dem Seitenstreifen
 - ↳ Aufklappen und einstellen des Signalbildes der VWT
 - ↳ Funktionsprüfung aller Absperrelemente

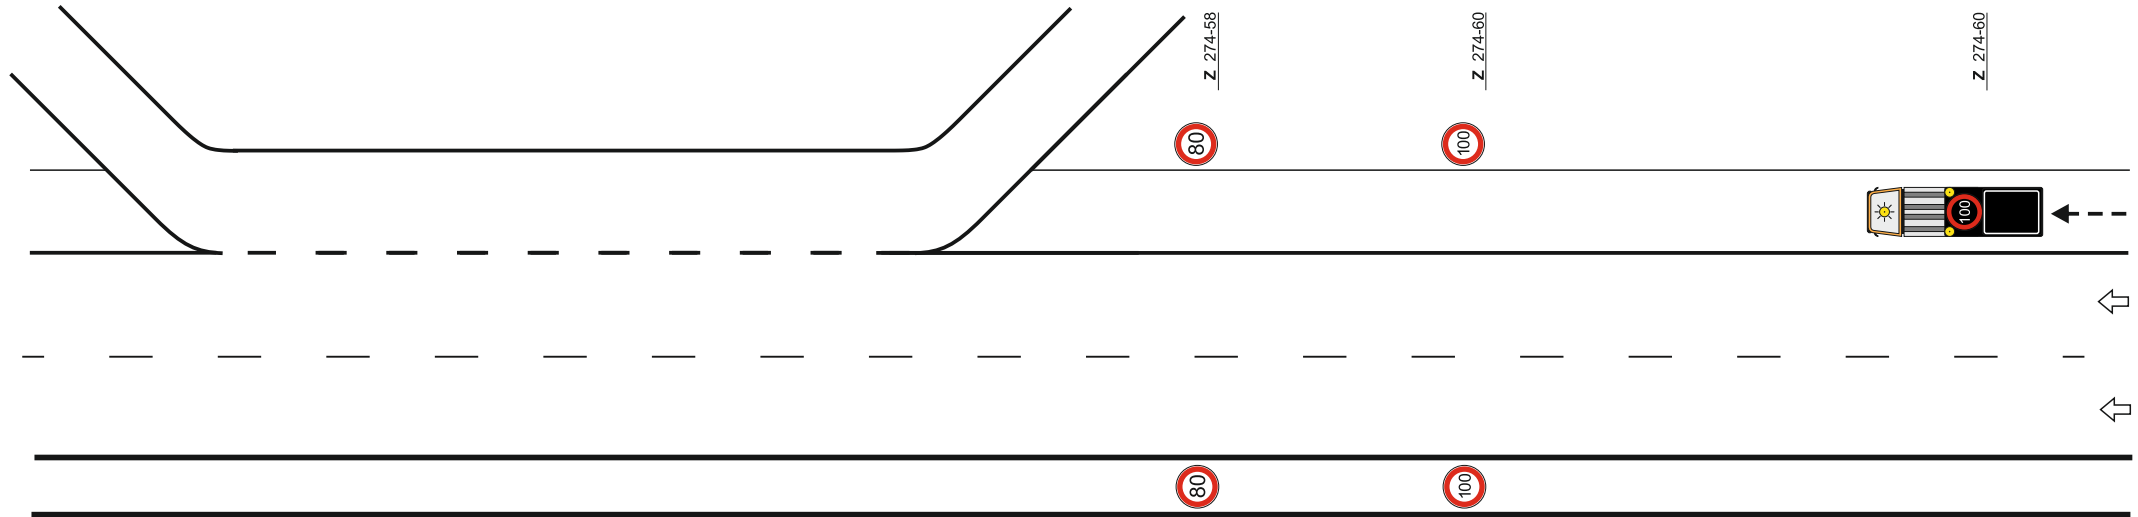

HE1.69RTK



ABBAU

Phase 8 / 11



VZ-Demontage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs mit dem fließenden Verkehr unter Beachtung des nachfolgenden Verkehrs
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „1“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „2“
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „2“
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs bis zur nächsten Wendemöglichkeit (s. Skizze)

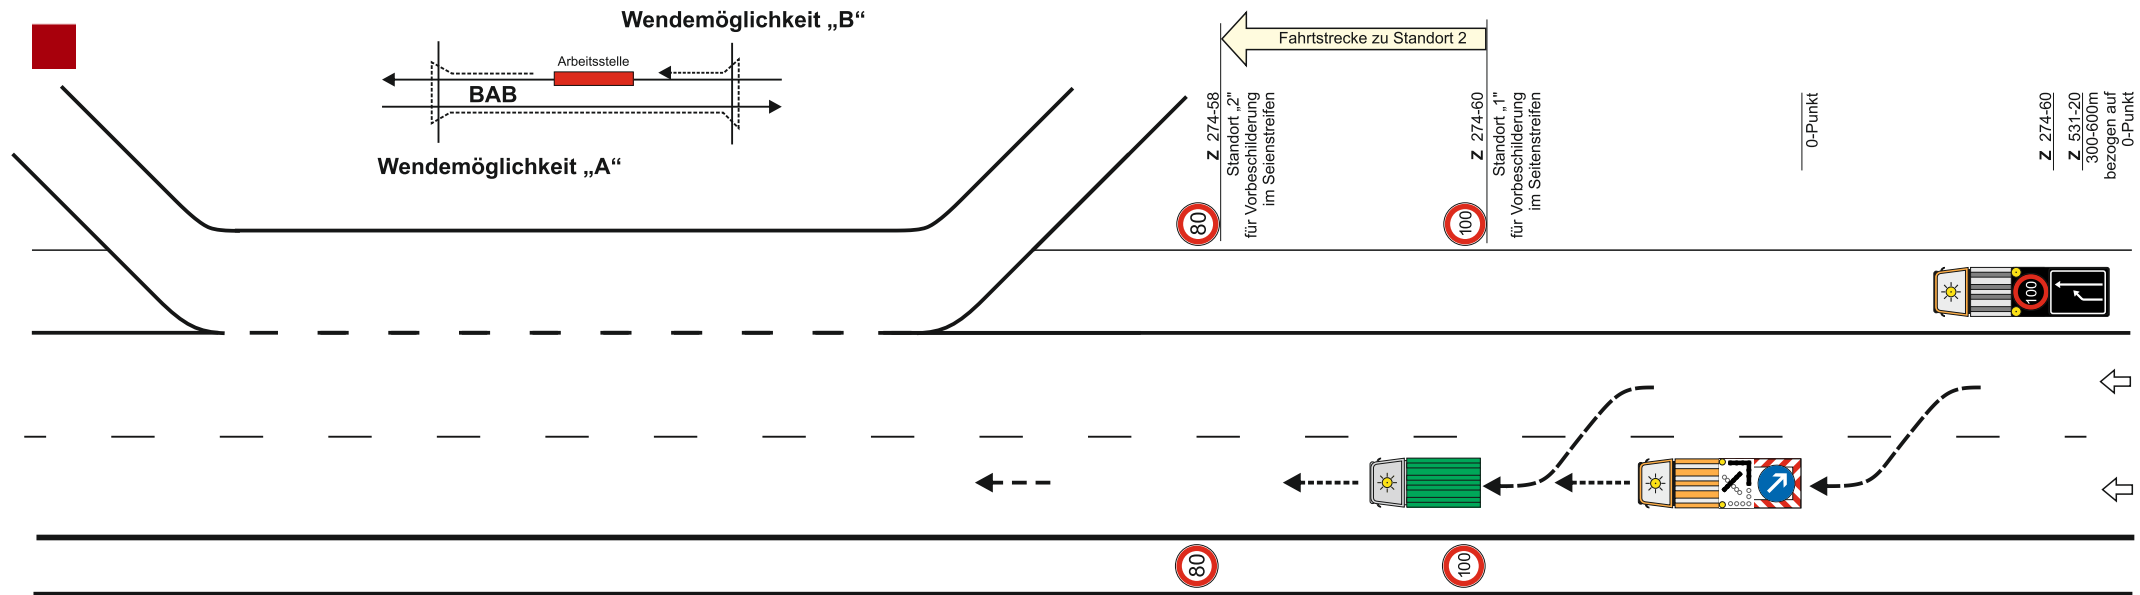

HE1.69RTK

ABBAU

Phase 9 / 11



Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement





VZ-Demontage

- ↳ VWT außer Betrieb setzen
- ↳ Ausfahren der VWT



HESSEN

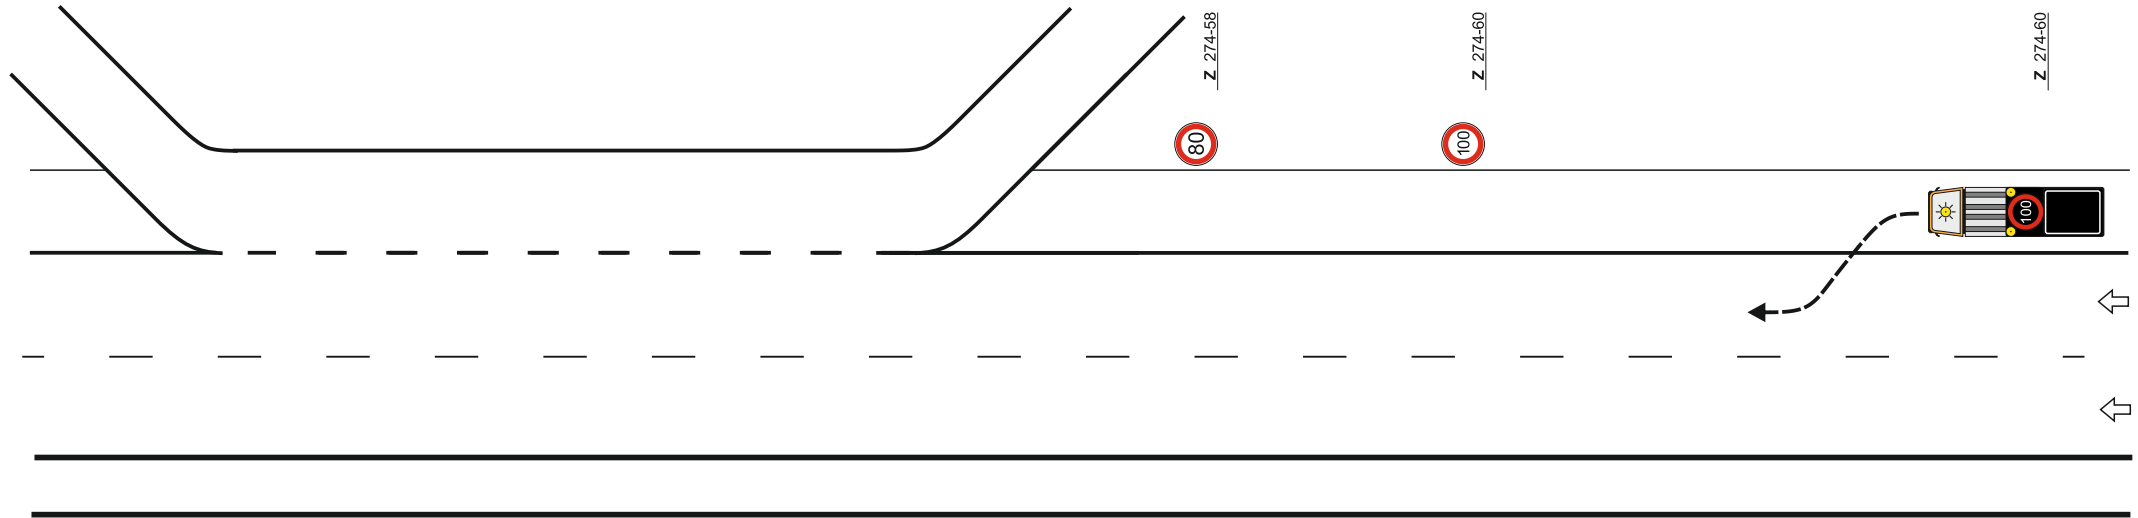

HE1.69RTK



ABBAU

Phase 10 / 11



VZ-Demontage

- ↳ Einfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs auf dem Seitenstreifen
- ↳ Schalten der Pfeilstellung an der FAT
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „1“
 - ↳ Weiterfahrt zum Standort „2“
 - ↳ VZ-Demontage am Standort „2“
 - ↳ Ausfahren der FAT und des Arbeitsfahrzeugs

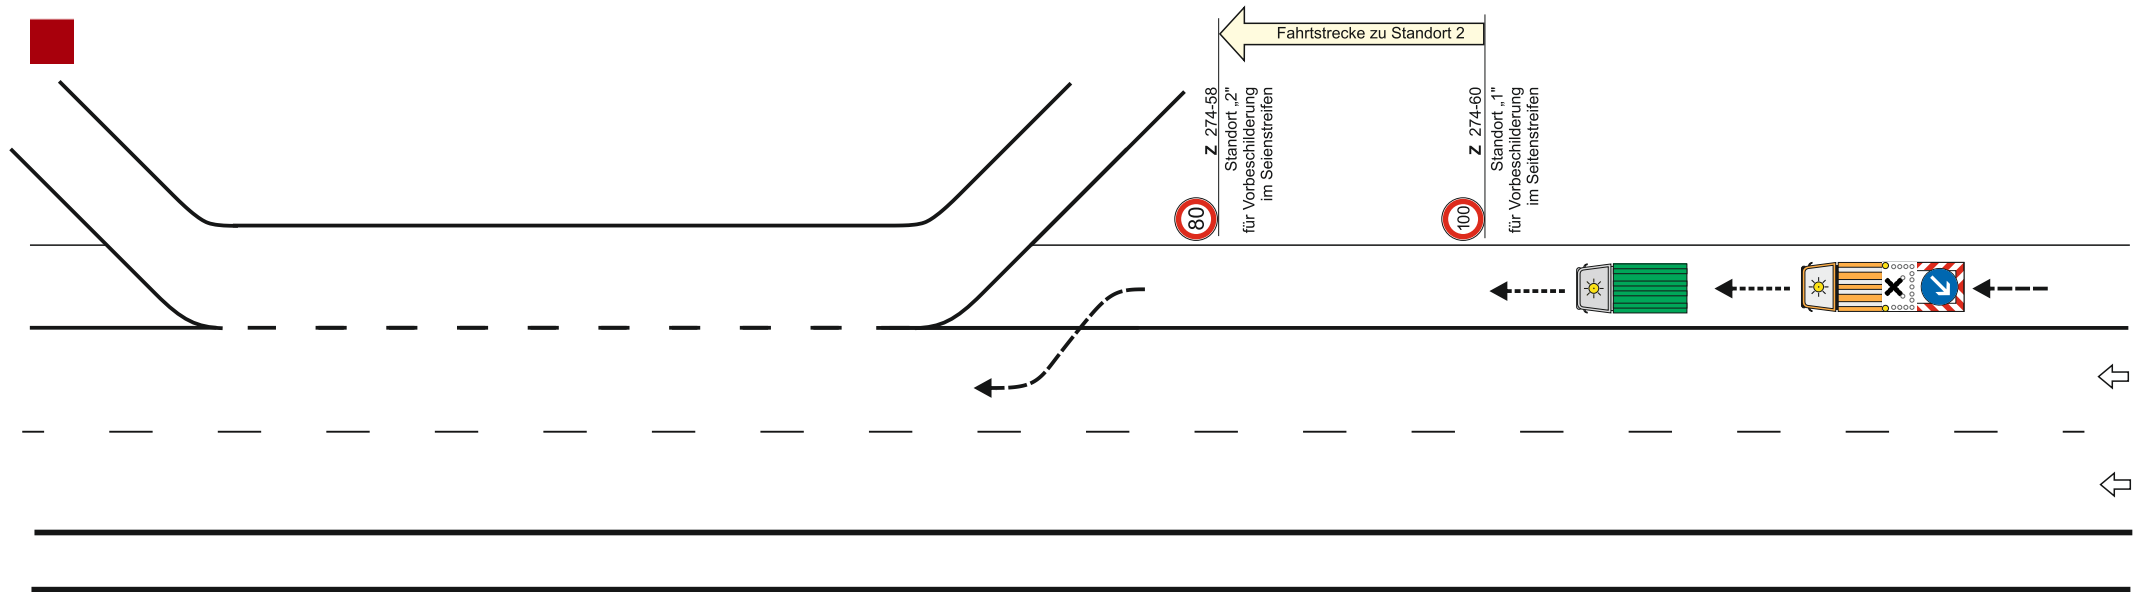

HE1.69RTK

ABBAU

Phase 11 / 11
