



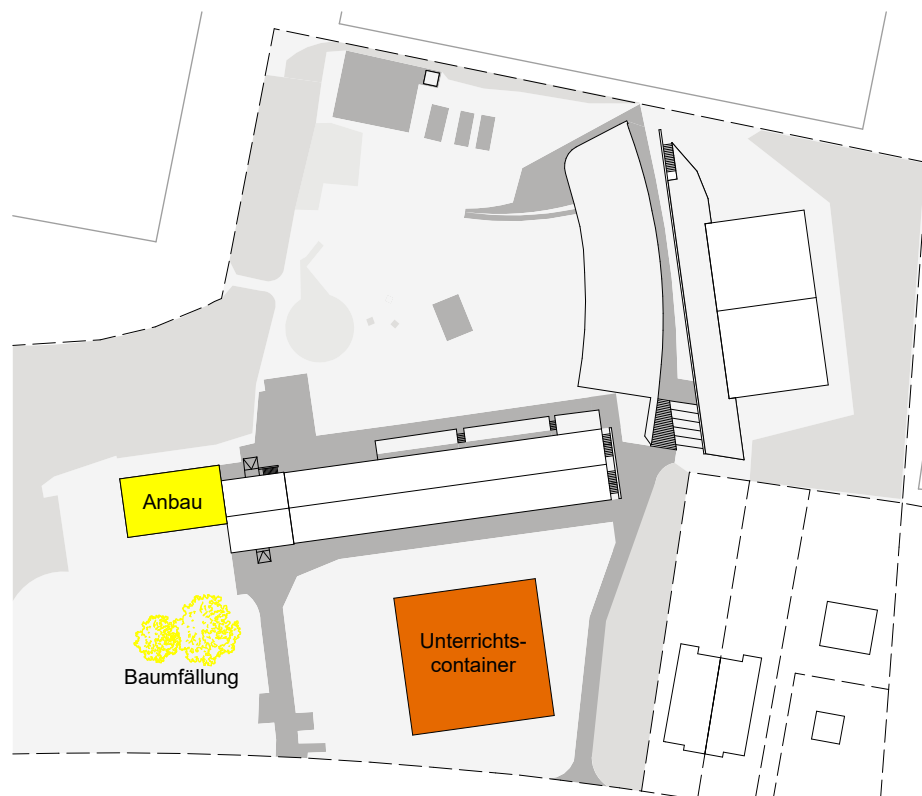


Sommer 2019
Unterrichtscontainer
als Interimslösung

Winter 2020/2021
Abbriss Anbau und Baumfällung als
vorbereitende Maßnahme für die
Erweiterung des Schulgebäudes

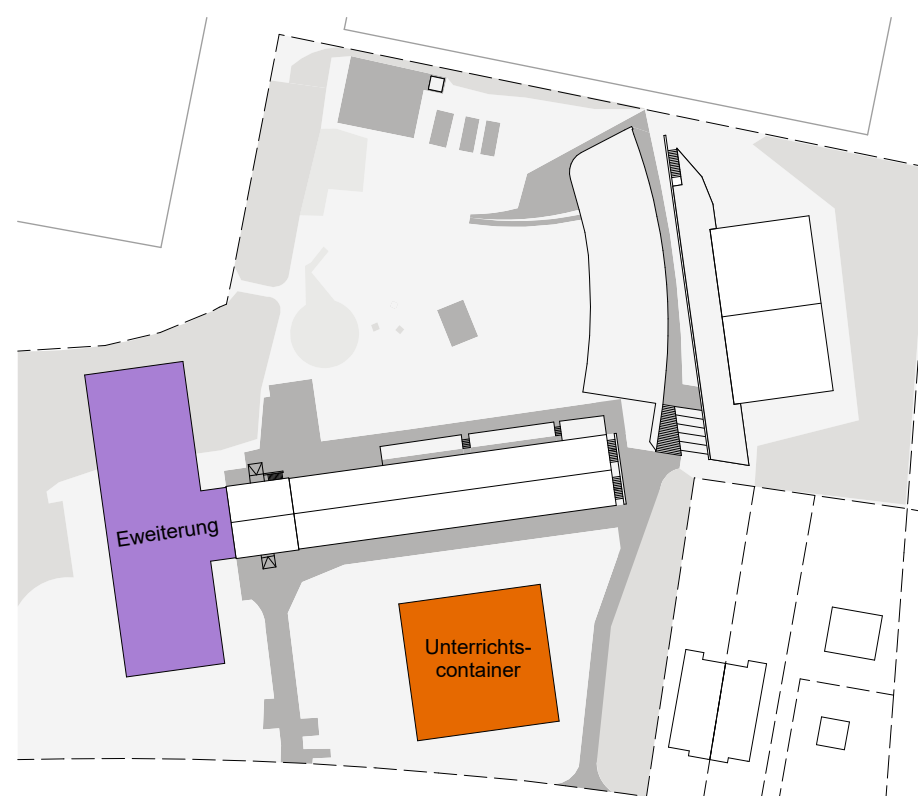

Herbst 2021 - Frühjahr 2023
Bauausführung Erweiterung


Der Unterricht findet weiterhin im
Bestandsgebäude sowie in den
Unterrichtscontainern statt

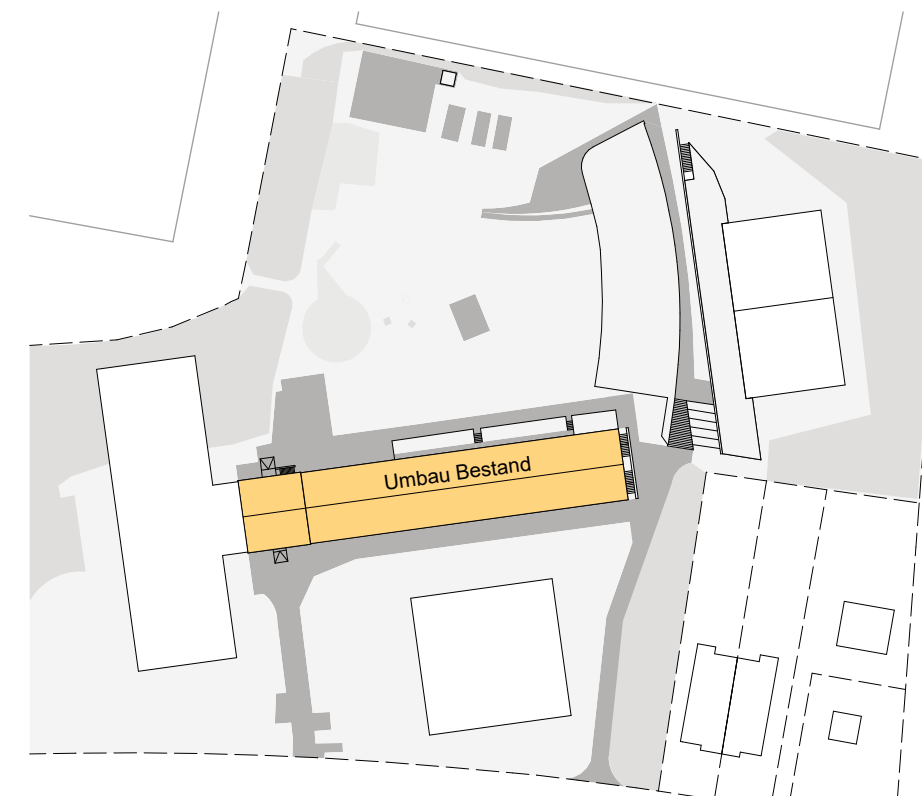

Frühjahr 2023 - Frühjahr 2024
Umbau und Sanierung
Bestandsgebäude


Der Unterricht findet in der
Erweiterung des Gebäudes sowie
in den Unterrichtscontainern statt

Frühjahr 2024
Abbau Unterrichtscontainer
in Vorbereitung für den Neubau
des Mehrzweckgebäudes

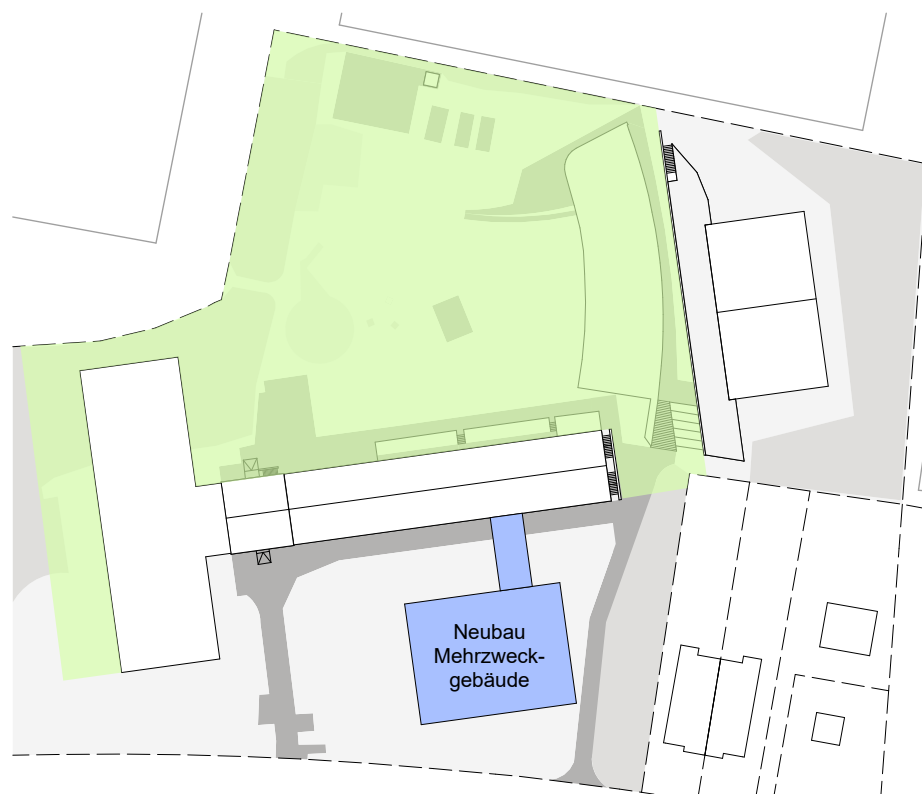


Frühjahr 2024 - Frühjahr 2025
Neubau Mehrzweckgebäude

Frühjahr 2024 - Sommer 2024
Außenanlagen Schulhof

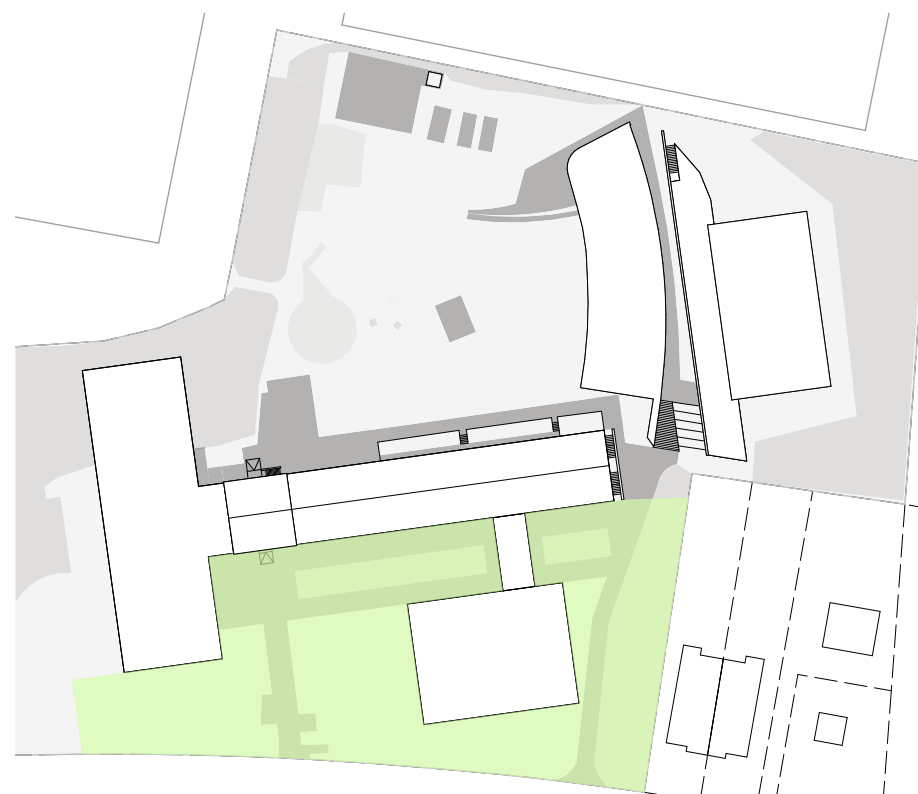

Frühjahr 2025 - Sommer 2025
Außenanlagen Straßenseite

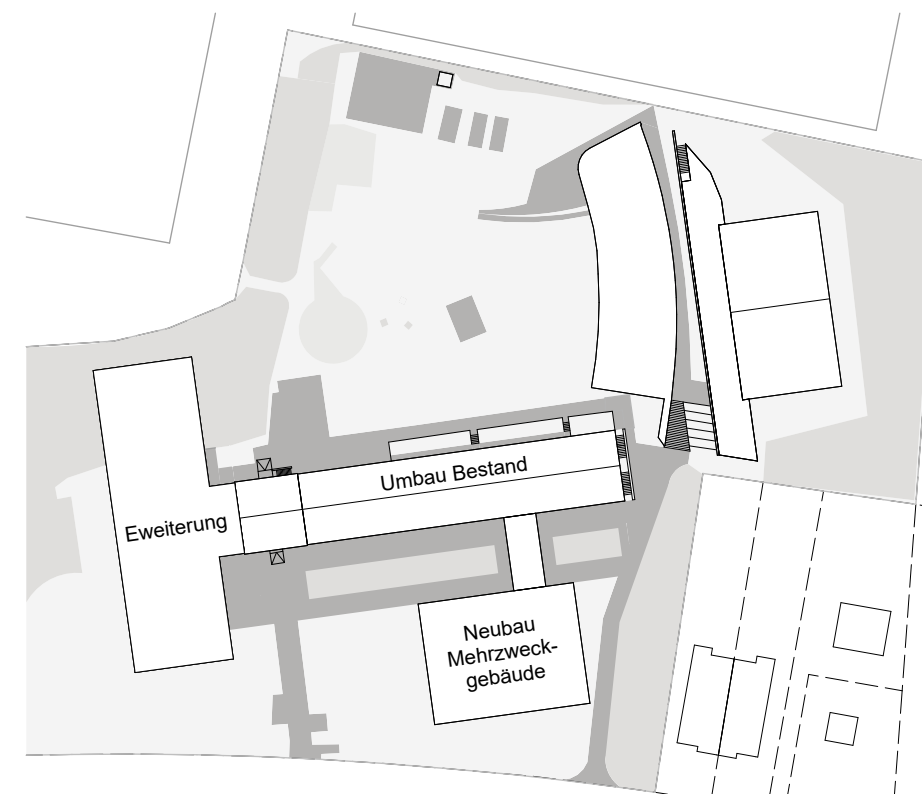

Zum neuen Schuljahr 2025/2026
ist die gesamte Schulanlage fertiggestellt.

Am Standort kann nun Mittagessen für alle Kinder
angeboten werden. Die Schule verfügt über einen
vollausgestatten Mehrzweckbereich für Veranstaltungen.
