

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:
für den Auftragnehmer:

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB ...

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Qualitätssicherung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Eisenbahn-Bundesamt

Freigabe zur Prüfung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

Freigabe der Ausführungsunterlagen

☐ mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prüfexemplaren

Genehmigung zur Bauausführung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:



Bahnbaugruppe
DB Bahnbaugruppe GmbH
Standortmanagement | I.BFS
Ernst-Kamieth-Str. 16
06112 Halle (Saale)

Projektleitung:



Bahnbaugruppe
DB Bahnbaugruppe GmbH
Projekte Inland | I.BVG 1
Am Studio 1A
12489 Berlin

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Auftragnehmer (AN):

Planung:




Westersch 25
26899 Rhede (Ems)
04964 9090951
info@planegut.de

Ört, Datum, Unterschrift

Ört, Datum, Unterschrift

Rhede, 03.09.2025, gez. N. Bekker
Ört, Datum, Unterschrift

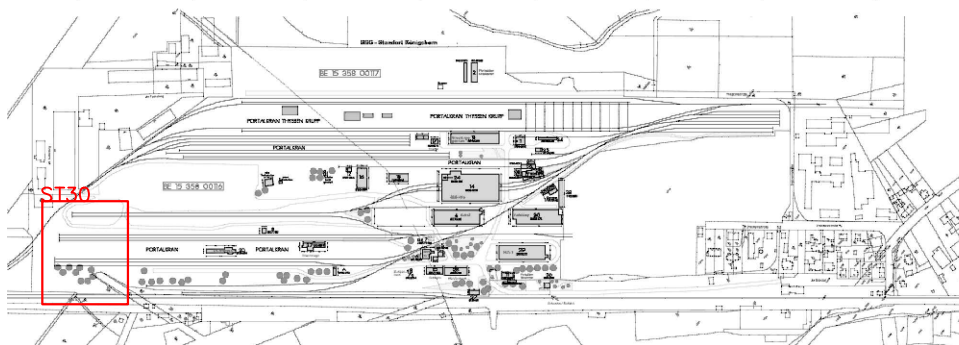

Projektnummer DB:
2510314/P05H20004 V1

BIM-Datencodierung:

Planzeichen: STOK-5-4-XXX-
PLG-ELT-TAB-XX-014-a-P

Planart: Tabelle

Höhen- und Koordinatensystem:

Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnummer:

|||*|||•|||*|||

BW-Kennziffer:

Barcodenummer:

Entwurfsgeschwindigkeit:

Strecke:
6410

Streckenabschnitt:
Biederitz - Trebnitz

Kilometer:
3,2 - 4,1

Erstellt

09.2025

vom Dorff

Geprüft

09.2025

Bekker

Freigegeben

09.2025

Bekker

Projektbasispunkt
X: 32.688.400,000
Y: 5.780.100,000

Datum

Name

Standortumbau Königsborn
QLKB--ST30

Anlage:

Planbezeichnung:

ST30

Kabelliste Unterverteilung

STOK-5-4-XXX-PLG-ELT-TAB-XX-014-a-P

Projektkürzel

Lph.

Teilpro.

Unterkategorie

Ersteller

Gewerk

Planart

Ebene

Lfd. Nr.

Index

Sta-
tus

Lfd.-Nr.	Kabelbezeichnung	Kabel-Nr.	Von	Nach	Kabeltyp	Kabel-länge [m]	I _N [A]	I _Z [A]	I _{Kmin} [kA]	I _a [kA]	I _b [A]	Verle-geart	Reduk-tion	U _{ges} [%]
1	QLKB--ST30 ST30-UV-001 NSHV ST20 Unterverteilung	ST30-UV-001	NSHV ST20	Unterverteilung	NYN-J 5x16	30	63,0	76	2,05	0,13	24,9	C	1	0,71
2	QLKB--ST30 ST30-UV-002 Unterverteilung Steckdosen Station	ST30-UV-002	Unterverteilung	Steckdosen Station	NYM-J 3x2,5	10	16,0	27	0,74	0,04	10,8	C	1	1,34
3	QLKB--ST30 ST30-UV-003 Unterverteilung Beleuchtung	ST30-UV-003	Unterverteilung	Beleuchtung	NYM-J 3x2,5	15	10,0	27	0,56	0,04	0,5	C	1	0,76
4	QLKB--ST30 ST30-UV-004 Unterverteilung Wandkonvektor	ST30-UV-004	Unterverteilung	Wandkonvektor	NYM-J 3x2,5	15	16,0	27	0,56	0,04	10,8	C	1	1,65
5	QLKB--ST30 ST30-UV-005 Unterverteilung FWA Schrank DB Energie GmbH	ST30-UV-005	Unterverteilung	FWA Schrank DB Energie GmbH	NYM-J 3x2,5	15	10,0	27	0,56	0,04	2,7	C	1	0,95

Zust.	Änderung	Datum	Name	Datum	03.09.2025	Erstellt  planegut	Standortumbau Königsborn QLKB--ST30 Kabelliste Unterverteilung	
				Bearbeitet	S. Vom Dorff			
				Geprüft	N. Bekker			
	Ausführungsplan-Nr.: STOK-5-4-XXX-PLG-ELT-TAB-XX-014-a-P						Seite	1/1
