

Revision: 01	PROJEKT ZRE	 ZENTRUM FÜR RESSOURCEN UND ENERGIE
C7	Ausführungsstandards	
C7.15.4	Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll	

ZRE 2.0 Hamburg

Übergabeprotokoll 3D-Modell

Ersteller:

ÄM-Nr.:	0XX	Bauwerk:	Gesamtanlage oder Gebäude-KKS
Thema:	Schlagwort (Stichpunktartig)		
Erstellt:	Ersteller	Datum:	19.01.2022

ECN/SRH:

Priorität	Mittel	Frist bis:	XX.0X.2022
Geprüft	Name	Datum:	XX.0X.2022
Status:	bestätigt / abgelehnt		

Bearbeiter: ZRE	Dokument: C7.15.4 Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll+CEC001_01	Stand: 19.01.2022	Seite: 1 von 5
--------------------	---	----------------------	-------------------

Revision: 01	PROJEKT ZRE	 ZENTRUM FÜR RESSOURCEN UND ENERGIE
C7	Ausführungsstandards	
C7.15.4	Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll	

Inhalt

1	Aufgabenstellung	3
2	Randbedingungen	3
2.1	Hintergrund	3
2.2	Konsequenzen auf den Anlagenbetrieb	4
2.3	Kostenauswirkungen	4
2.4	Terminliche Auswirkungen	4
2.5	Auswirkungen auf andere Fachbereiche	4
3	Entscheidung	5
4	Anlagen	5

Revision: 01	PROJEKT ZRE	 ZENTRUM FÜR RESSOURCEN UND ENERGIE
C7	Ausführungsstandards	
C7.15.4	Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll	


1 Aufgabenstellung

Entscheidung über Änderung der lichten Durchgangsmaße der Fluchttüren
(Innen und Außen)

2 Randbedingungen

2.1 Hintergrund

Aktuelle Mindest-Rohbaumaße der Fluchttüren: (B/H) 1,00/2,135m

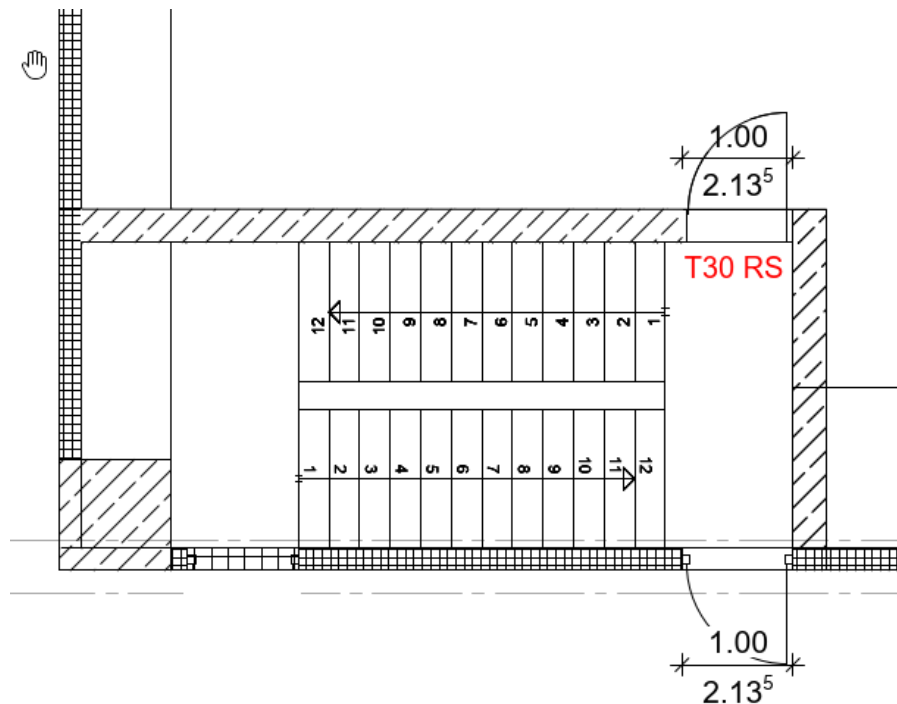

Abzüglich der Zargenbreite (ca. 65mm pro Seite): Lichtes Durchgangsmaß von <1m.


Laut Brandschutzkonzept: Lichtes Durchgangsmaß von ≥ 1 m erforderlich

→ Vergrößerung Mindest-Rohbaumaße der Fluchttüren: (B/H) 1,135/2,26m

Bearbeiter: ZRE	Dokument: C7.15.4 Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll+CEC001_01	Stand: 19.01.2022	Seite: 3 von 5
--------------------	---	----------------------	-------------------

Revision: 01	PROJEKT ZRE	 ZENTRUM FÜR RESSOURCEN UND ENERGIE
C7	Ausführungsstandards	
C7.15.4	Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll	

Gem. Baudetails des Architekten muss das Rohbaumaß der Außentüren um eine zusätzliche Dämmschicht verbreitert (siehe Prinzip-Detail Tür DT001_00):

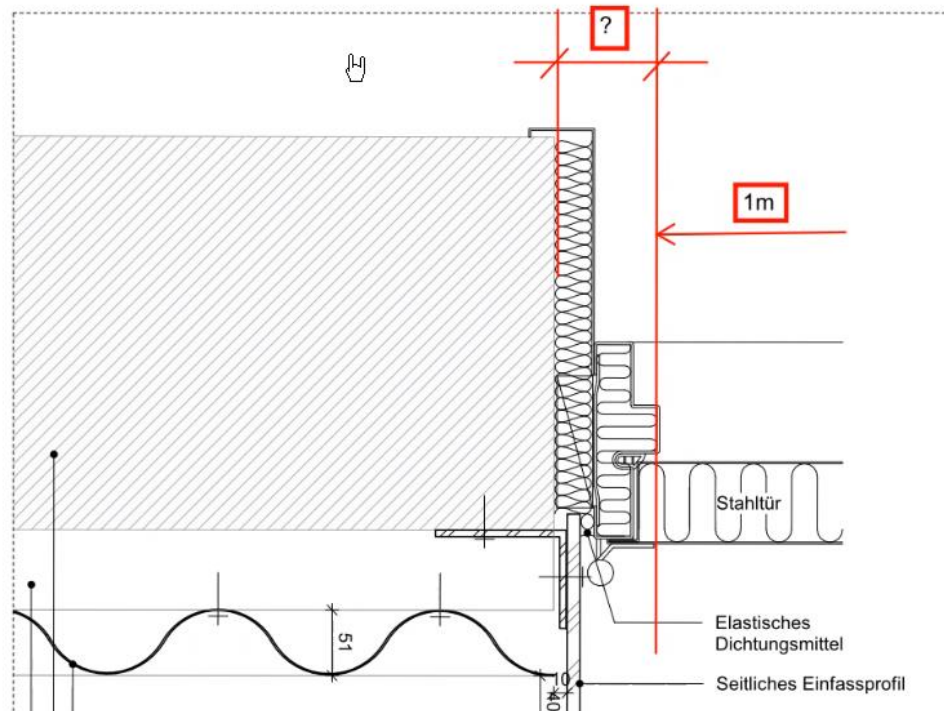

Für die Ausführungsplanung wird das oben gekennzeichnete Maß benötigt (Zarge + Dämmschicht zu Tragwerk).

2.2 Konsequenzen auf den Anlagenbetrieb

Keine

2.3 Kostenauswirkungen

Kosten für größere Türen in der Gesamtanlage.

2.4 Terminliche Auswirkungen

keine

2.5 Auswirkungen auf andere Fachbereiche

keine

Bearbeiter: ZRE	Dokument: C7.15.4 Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll+CEC001_01	Stand: 19.01.2022	Seite: 4 von 5
--------------------	---	----------------------	-------------------

Revision: 01	PROJEKT ZRE	
C7	Ausführungsstandards	
C7.15.4	Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll	

3 Entscheidung

- **Optionen:** gibt es aus unserer Sicht keine
- **Empfehlung:** Änderung der Rohbaumaße der Türen auf die im Brandschutzkonzept geforderten lichten Durchgangsmaße

4 Anlagen

- keine

Bearbeiter: ZRE	Dokument: C7.15.4 Ausführungsstandard - Modellübergabeprotokoll+CEC001_01	Stand: 19.01.2022	Seite: 5 von 5
--------------------	---	----------------------	-------------------
