


Infrastruktur: MA-Industrieafen
Betriebsstelle: Franzosenkai
Weiche-Nr.: 252
IBW 49-250/170-1:12 (H), L
Baulänge: 41.600 mm
Verlegepl.-Nr.: aus EW 500-1:12 gebogen
Lieferwerk:
Einbau: SwE 2026



Weichenmesspunkte

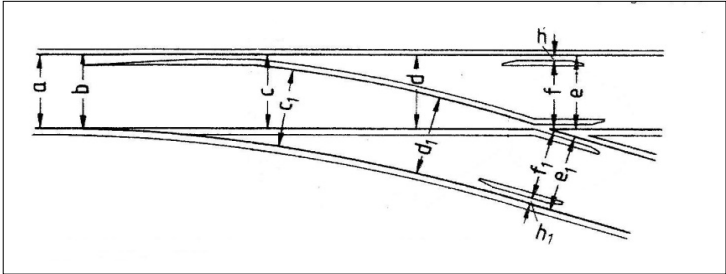

SOLLWERTE UND ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN (mm)

Spurweiten												Leitweite		Rillenweite				Datum der Prüfung/ Name Prüfer	Der ordnungsgemäße Zustand der Weiche wird bescheinigt. EBL
Weichen- anfang	Zungen- spitze	Zungenbereich (Mittelverschl.)		Zungenbereich (Angstlasche)		Weichenmitte		Herzstück		Weichenende				Radlenker		Herzstück			
1435	1440	1435		1435		1435		1435		1435		1394		41	41	44	44		
10	10	10		10		10		8		10		4		4		4			
-3	-4	-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3			
a (sa)	b (s1)	c (s2)	c1 (s2z)	c2	c3	d (s3)	d1 (s3z)	e (sh)	e1 (shz)	- (se)	- (sez)	f (l)	f1 (lz)	h (-)	h1 (-)	i (h)	i1 (hz)		
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																			
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																			
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																			
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																			
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																			

Die c1/sz-Maße sind bei abweigender Lage der Zungenvorrichtung zu messen
