



Begehung am: 26.08.2025

Teilnehmer: Herr Gehrman, Herr Gumbrecht, Herr Henne,
Herr Müller, Herr Reinsperger, Herr Weik

Weichenform alt: EWL 54 - 760 - 1:14 B

Weichenform neu: EWL 60 - 760 - 1:14 B

Montageplatz: Bf Schwetzingen, Gleise 12, 13, 14

Belastung / VZG: >= 30.000 Lt/d / 80 km/h

GPS

GleisPlanService GmbH

Saffiger Straße 14, 56299 Ochtendung
Tel. 02625 / 2898970
Email: info@gps-gleisplanservice.de

Weichendokumentation

Bf Schwetzingen - W191


Schienen:

2 x 10,4m Endteilschiene
2x 34,4m UIC 60
Schiene teilen
mit WSK

Ende Endteil, alt: Übergang S54 > UIC
BESTAND: 20x B70 W60 / NEU: 25x B90 W60

- Änderung Schienenform der Weiche 191 von S54 > UIC 60
- Schienenfußkabel und 2x Überspannungssicherung im Umbaubereich
- gelber Datenmesspunkt im Weichenbereich
- 90m Wiederherstellung Rangierweg rechts im kompletten Umbaubereich
- 150m Kabelkanal beidseitig im Seitenbereich
- 150m² Vegetationsarbeiten zur Baufeldfreimachung
- Belastungsstopfgang gemäß Grunddatei
- Neulagenschleifen gemäß Mail vom 13.05.26
- Einfassungsrahmen für Antrieb und Gestänge einbauen

Weiche 191

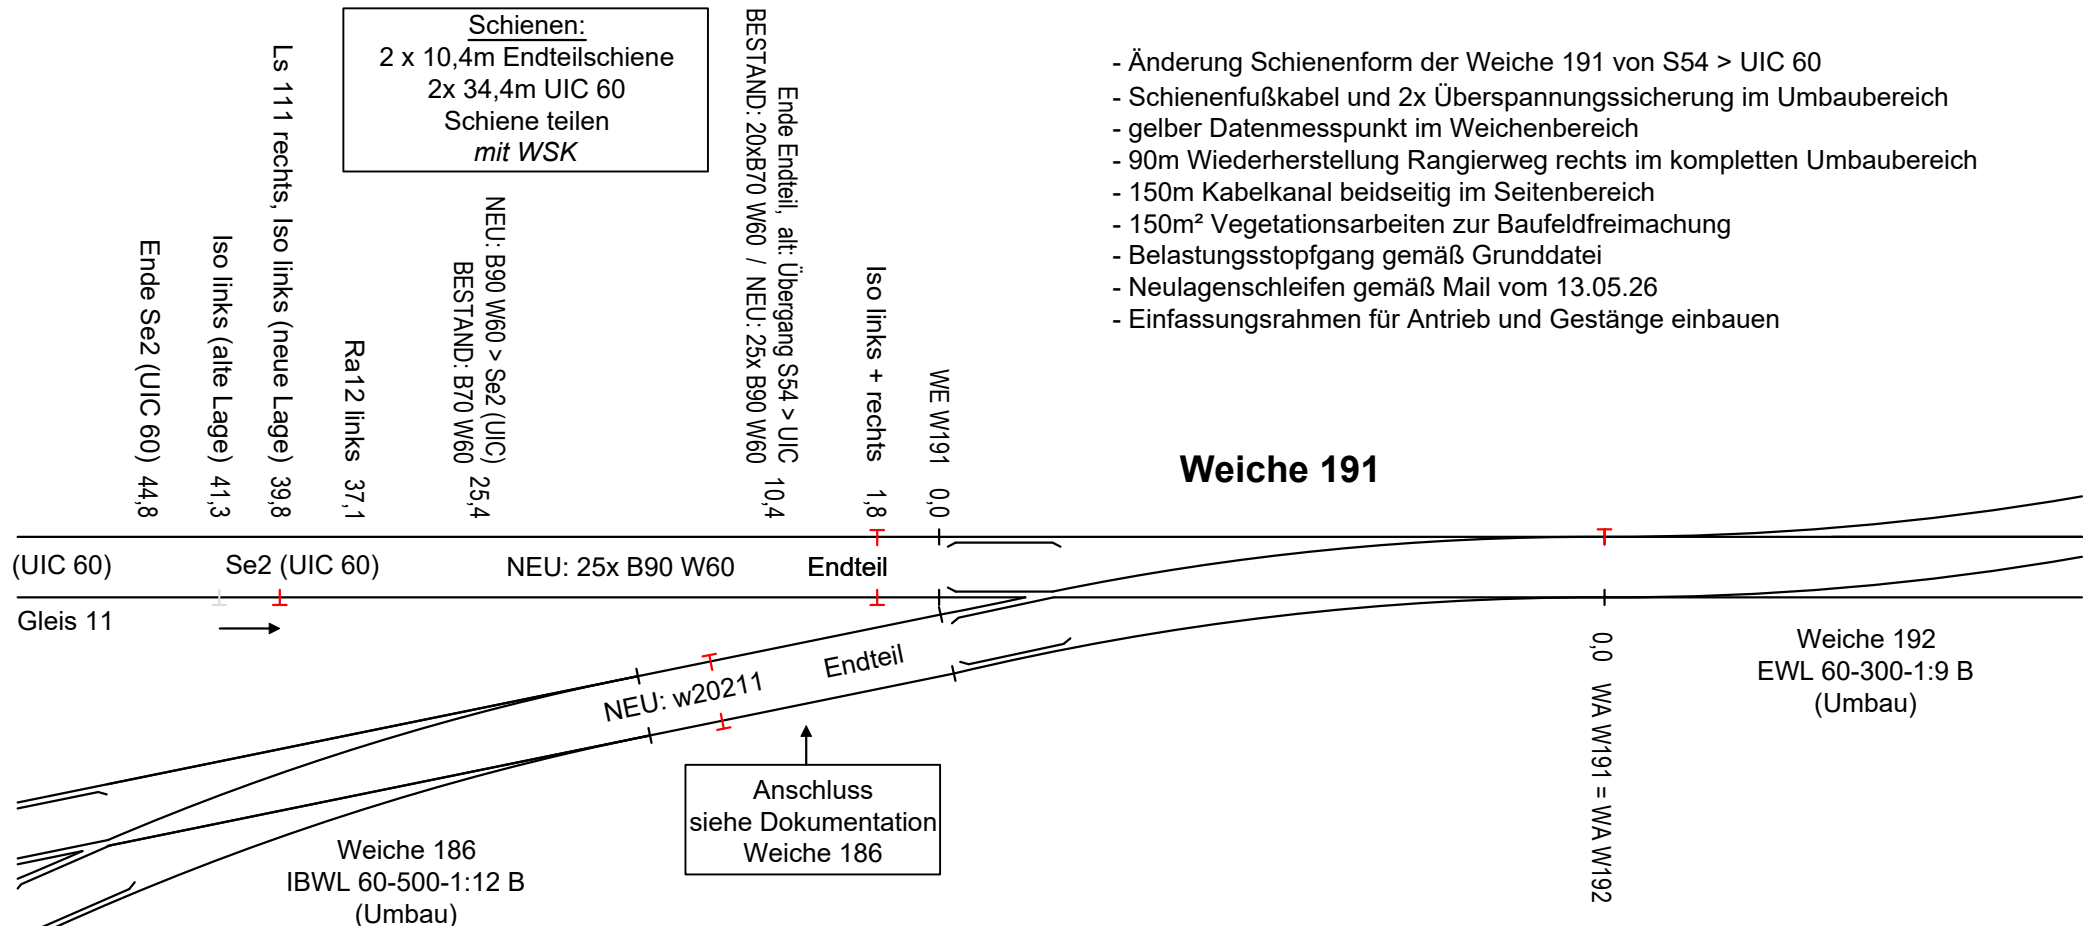



Begehung am: 26.08.2025
 Teilnehmer: Herr Gehrmann, Herr Gumbrecht, Herr Henne,
 Herr Müller, Herr Reinsperger, Herr Weik
 Weichenform alt: EWL 54 - 190 - 1:9 B
 Weichenform neu: EWL 60 - 300 - 1:9 B
 Montageplatz: Bf Schwetzingen, Gleise 12, 13, 14
 Belastung / VZG: >= 30.000 Lt/d / 80 km/h

GPS

GleisPlanService GmbH

Saffiger Straße 14, 56299 Ochtendung
 Tel. 02625 / 2898970
 Email: info@gps-gleisplanservice.de

Weichendokumentation

Bf Schwetzingen - W192

