


UNTERSICHT DECKE EBENE U3 UND BODENPLATTE U2 M=1:125
BETONIERABSCHNITTE + REIHENFOLGE

ACHTUNG:
Dieser Plan dient nur zur Übersicht der Betonierabschnitte - U3 / Bodenplatte U2 !
Er ist nicht zur Maßentnahme zu verwenden !

Die Abschnitte 4 / 5 und 6 können auch parallel und in anderer Reihenfolge
gebaut werden.
Die Betonierrichtung an den Arbeitsfugen kann jedoch nicht ohne Umplanung
geändert werden.

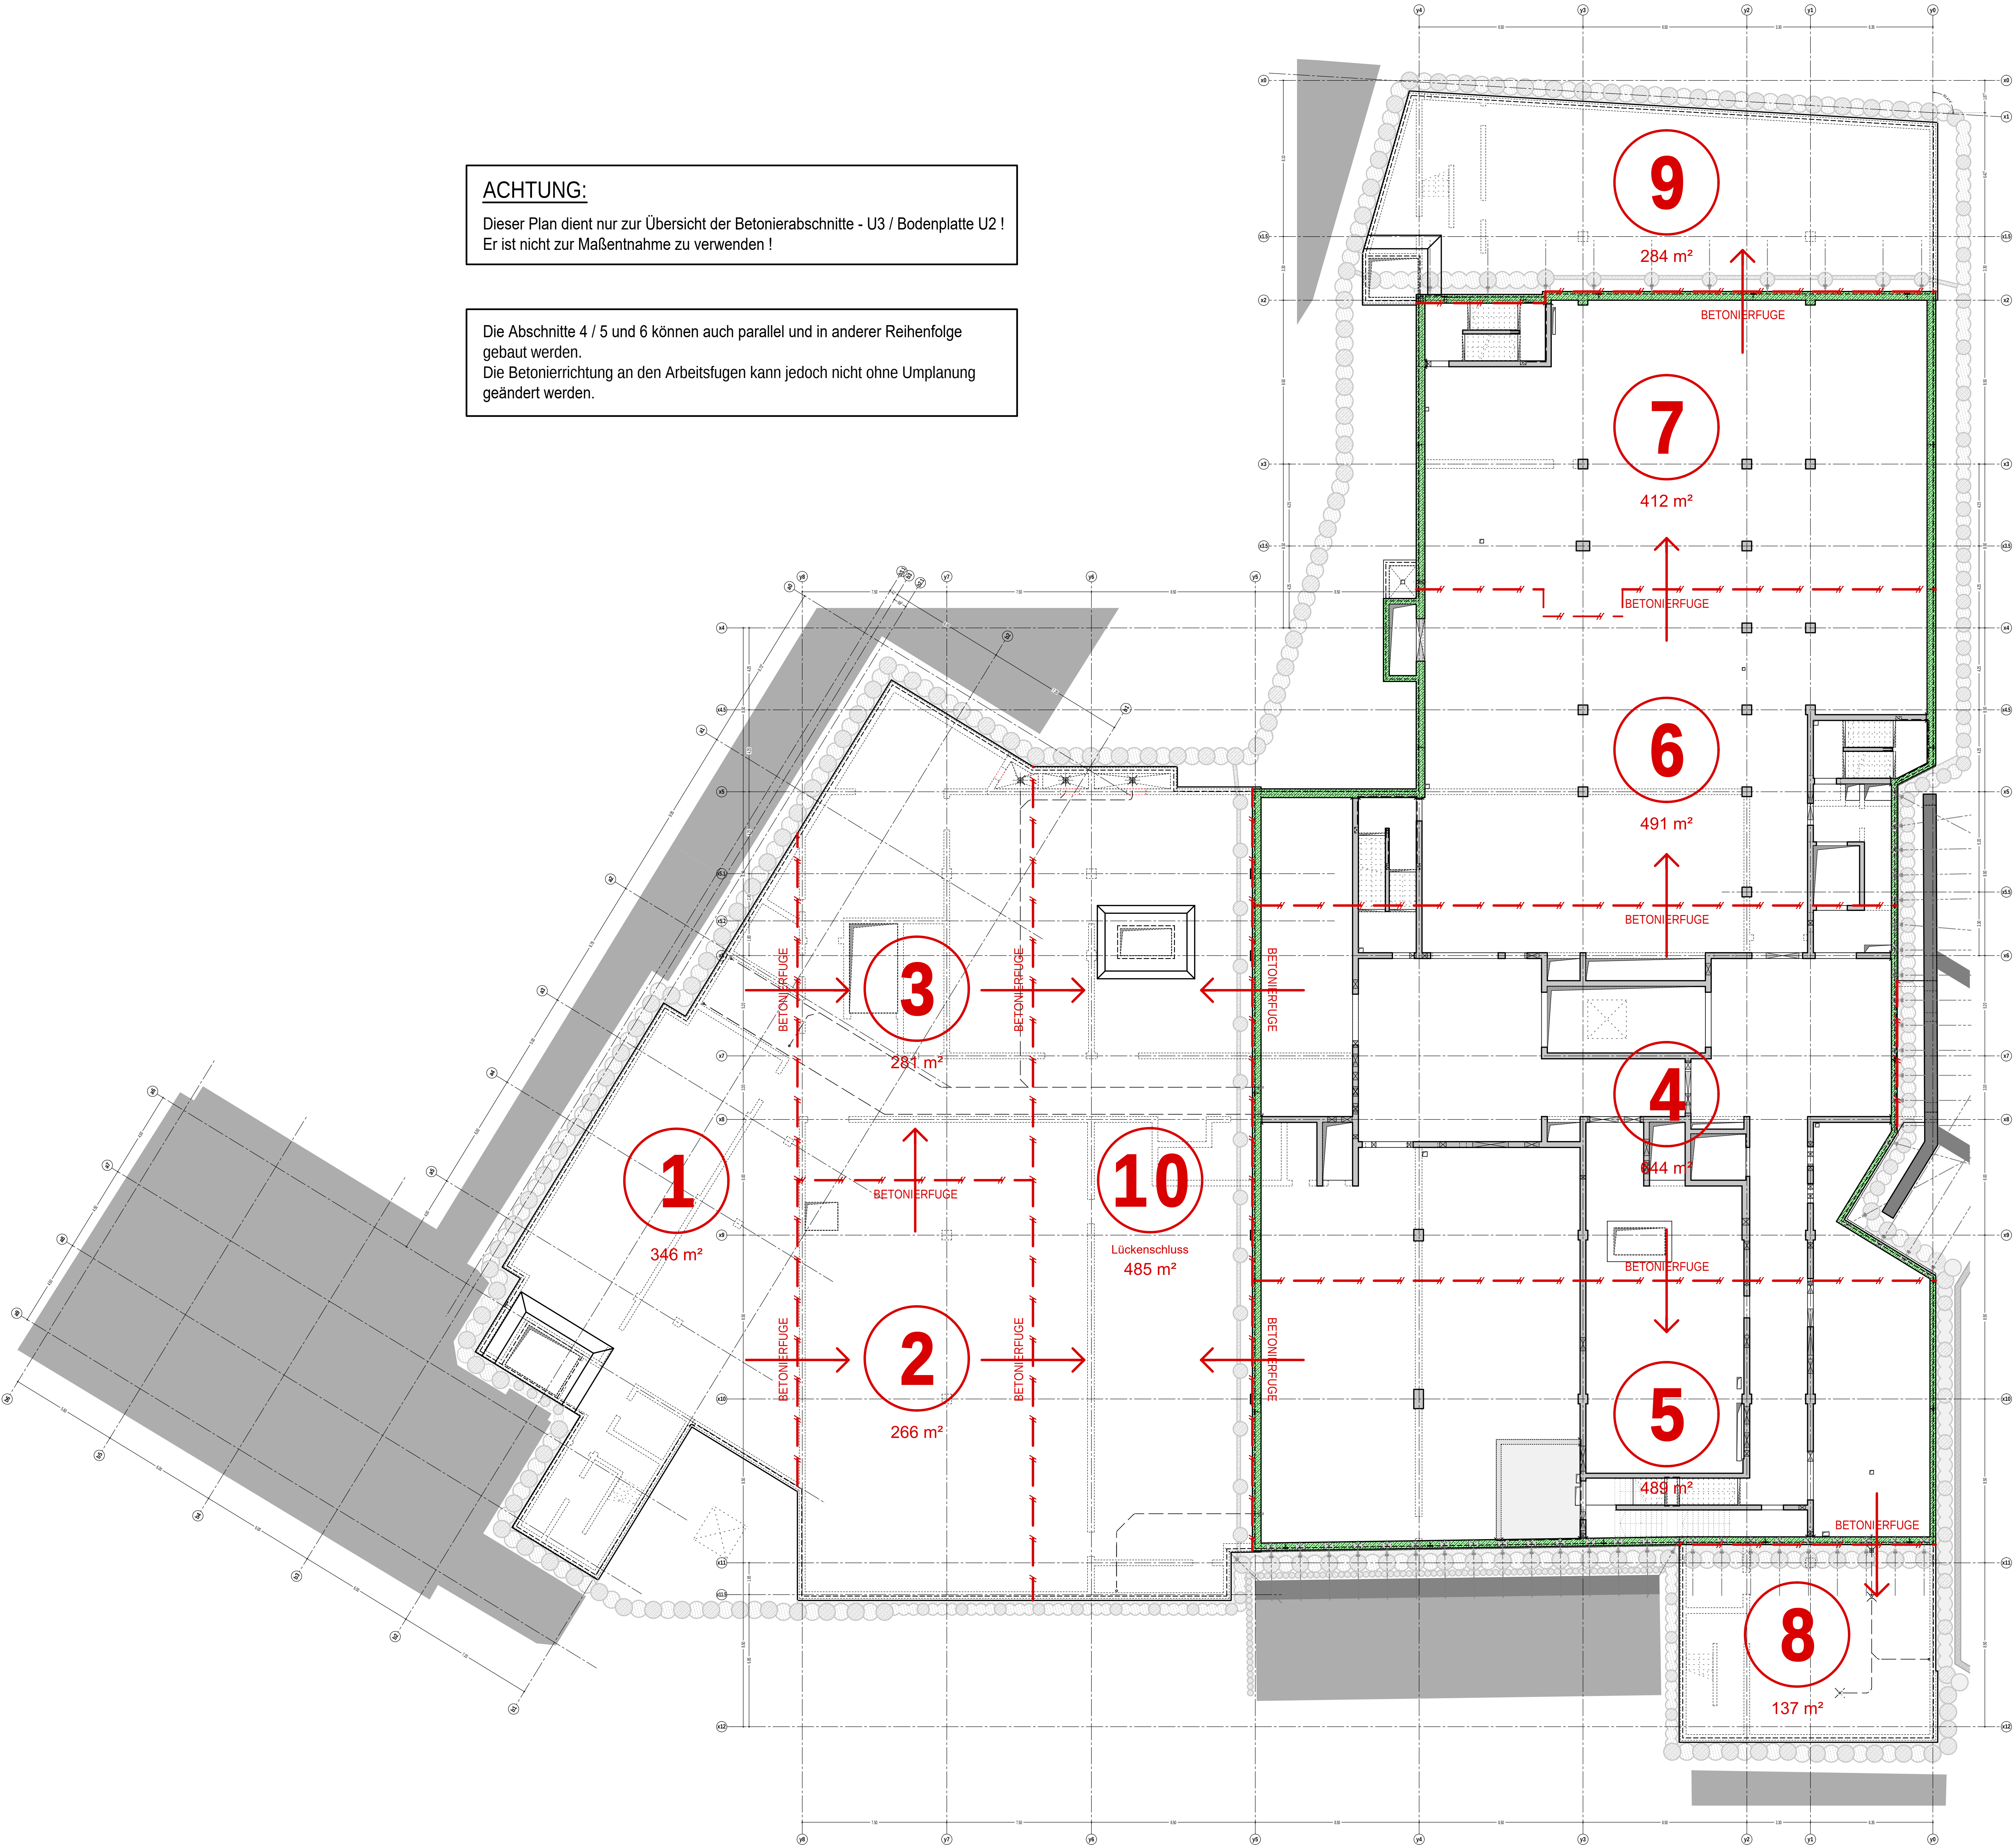

LEGENDE :

- ZUR MINIMIERUNG DES BETONSCHWUNDS SIND FOLGENDE MAßNAHMEN EINZUHALTEN :
- BETON MIT MÖGLICHT GERINGEM WZ-WERT
- VERWENDUNG EINES BETONVERFLÜSSIGERS (EVTL.)
- MINDESTZEMENTGEGHALT
- VERWENDUNG EINES HOCHFESTZEMENTES
- NACH DEM EINBAU IST DER BETON SOFORT INTENSIV UND AUSREICHEND LANG NACHZUBEHANDLEN
(SCHUTZ VOR AUSTROCKNUNG, SCHUTZ VOR ABKÜHLUNG).
- ANGABEN ZU EINBAUTEILEN (Z.B. FÜR NACHTRÄGLICH ANZUSCHLIEßENDE BAUTEILE), EINBAULEUCHTEN, LEERRÖHREN,
GRUNDLEITUNGEN, FUNDAMENTIERER UND FASSADENELEMENTEN SIND DEN PLÄNEN DER FACHPLANER ZU ENTHNEHMEN
(ARCHITEKT, AUFGUSPLANER, HAUSTECHNIKER, FASSADENPLANER ETC.).
- AUFHANGABEWEHRUNG FÜR DEN TRANSPORT VON FERTIGTEILEN NACH ANGABE DES AUSFÜHRENDEN FT-WERKES.
- SÄMTLICHE MW-WÄNDE SIND DEN WERKPLÄNEN DES ARCHITEKTEN ZU ENTHNEHMEN.
- ANSCHLUSS DES MAUERWERKS AN BETONBAUTEILE MITTELS KLEBANKER NACH WAHL DER AUSFÜHRENDEN BAUFORMA BZW. SIEHE
ANGABE WERKPLAN ARCHITEKT.
- AUSSPARUNGEN, SOWEIT ANGEZEIGT, BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ORTBETONBAUTEILE. AUSSPARUNGEN IN NICHTTRAGENDEN
BAUTEILEN SOWIE IN MW-WÄNDEN SIEHE WERK- BZW. HAUSTECHNIKPLÄNE.
- BETONFESTIGKEITEN UND EXPOSITIONSKLASSEN SIEHE GÜLTIGE UND FREIGELEGTE BEWEHRUNGSPLÄNE.
- BESONDERE ANFORDERUNGEN WIE NACHBEHANDLUNG VON BETONBEREICHEN, OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT VON
STAHLTEILEN ODER MAUERWERKSÜBEN SIEHE LV.
- BEI PRODUKTÄNDERUNGEN HAT DIE AUSFÜHRENDEN BAUFORMA DIE NACHWEISE AUF GLEICHWERTIGKEIT ZU ERBRINGEN UND NACH
GEBEHMIGUNG PLANÄNDERUNGEN AUF EIGENE KOSTEN ZU ERSTELLEN.

- SCHWEIFÜBERTRAGUNG IN FUGEN UND AUSBLINDUNG DER FUGEN NACH EC2 DIN EN 1992-1-1, 4.2.2.5
SIND ARBEITS- BZW. BETONIERFUGEN IN PLAN ENGEBRACHT, SIND DIES OHNE WEITERGEHENDE ANGABEN ZUR OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT
ALS RAUHE FUGE. (Z.B. DURCH FREILEGEN DES KÖRNERGÜTS) AUSZUFÜHREN.
ÄNDERUNGEN DER BAUAUSFÜHRUNGEN SIND VORAB MIT DEM TRAGWERKPLANER ABZUSTIMMEN.
SIND KEINE ANGABEN ZU BETONIERABSCHNITTEN UND ARBEITSFUGEN IN PLAN VERMERT, SIND EINZELNE BAUTEILE (Z.B. UNTERZUG UND DECKE)
MONOLITISCH HERZUSTELLEN. BEI ZUSÄTZLICHEN HORIZONTALEN ARBEITSFUGEN DURCH DEN AN IST RÜCKSICHTIG MIT DEM
TRAGWERKPLANER ERFORDERLICH!

HIER GEGENGEZEICHNETE SICHTBETON-OBERFLÄCHEN - INSBESONDERE DEREN AUSFÜHRUNG UND QUALITÄT
(BREITENSCHALLUNG / SBZ / SB3 / ERHÖHTE EBENHEITSTOLERANZ) SIND DEN WERKPLÄNEN DER ARCHITEKTEN ZU ENTHNEHMEN.

Darstellungen :

Stahlbeton (Stb) - Ortbeton	DD / WD - Ansicht	Planungsbezeichnungen :
Stahlbeton (Stb) - Ortbeton WU	DD / WS - Schnitt	OK - Rohkante - Oberkante
Stahlbeton (Stb) - Ortbeton n.t.	DS / WS - Ansicht	UK - Rohkante - Unterkante
Stahlbeton (Stb) im Folgebereich	DS / WS - Ansicht ober-Rückseitig	FK - Fertigkante - Oberkante
Stahlbeton (Stb) unter der Schalldämmung	DS / WS - Schnitt	UK - Fertigkante - Unterkante
Stahlbeton (Stb) - Fertigteil (FT)	Kernbohrschne - Ansicht	OK - Vorankerschnitt
Mauerwerk (MW)	Kernbohrschne - Schnitt	UK - Vorankerschnitt
Bestand	Wärmedämmung	OK - Vorankerschnitt
Bestand MW	Arbeitsfuge - (AF)	UK - Vorankerschnitt
	Bewehrungsanschluss	OK - Vorankerschnitt

BAUWERKSNUL : ± 0.00 = 495.00 m ü.NHN
BW : - 18.00 = 477.00 m ü.NHN
HHW : - 18.50 = 476.50 m ü.NHN

HIER VERMÄLTE WÄNDE UND STÜTZEN DES AUFHANGENDEN BAUTEILES DIENEN NUR ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS !
FÜR DAS AUFHANGENDE BAUTEIL GILT DER SCHALPLAN DES FOLGEGESCHOSSES.

ALLE ANGABEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN BAUFORMEN VERANTWORTLICH AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT
DEN PLÄNEN DER EINZELNEN FACHPLANER ZU ÜBERPRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU
KLÄREN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES BAUHERREN ODER SEINES VERTRÄGLICH VEREINBARTEN STELLVERTRETERS.

PLANUNGSGRUNDLAGEN :
WERKPLANUNG BÜRO AAA VOM 02.02.2024 - VP-006

PP	003	AUFZUGSUNTERFAHRTEN ANGEPAßT. ÄNDERUNGEN SIEHE WOLKEN	RRR	17.06.2024
PP <td>002</td> <td>ARBEITSFUGEN UND BETONIERREIHENFOLGE ANGEPAßT. ÄNDERUNGEN SIEHE WOLKEN</td> <td>RRR</td> <td>25.03.2024</td>	002	ARBEITSFUGEN UND BETONIERREIHENFOLGE ANGEPAßT. ÄNDERUNGEN SIEHE WOLKEN	RRR	25.03.2024
PP	001	ERSTAUSSAGE	RRR	11.03.2024
Status	Index	Änderungsverlauf	gezeichnet	Datum

Änderungen

Projekt Nr. :	07 / 2018	Plan Nr. :	BZ TRW SP 5 GR U3 - 9306 - FP-003				
Gezeichnet :	RRR	Geprüft :	AW	Datum Erschaffung :	11.03.2024	Datum Planstand :	17.06.2024
Planart :	AUSFÜHRUNGSPLAN						
Planinhalt :	BETRIEBSGEBÄUDE BETONIERABSCHNITTE DECKE ÜBER EBENE U3 UND BODENPLATTE U2						
Übersicht :							
Projekt :	THEATER AUGSBURG GESAMT AREAL						
Bauherr :	STADT AUGSBURG REFERAT 5 REFERAT 6						
	RATHAUSPLATZ 1 86150 AUGSBURG						

Stadt Augsburg
