

Energieanforderung für elektrisch betriebene Geräte

Das Formblatt der Energieanforderung muss vom Lieferanten für jedes elektrisch betriebene Gerät bestmöglich ausgefüllt und an den AN-ELT übergeben werden. Als Gerät werden z.B. Sonnenschutzmotore, RWA oder Rauchabzugs-Anlagen, Brandschutztüren, Durchlauferhitzer, Boiler, Pissior, Lüfter, Lüftungs- und Klimageräte usw. angesehen. Bei Geräten identischen Typs reicht ein Formblatt je Gerät aus, die Anzahl muss aus Grundrissplänen hervorgehen.

Bauvorhaben:

Neubau Campus Chiemgau Traunstein

Antragsteller / Firma

Musterfirma XY-GmbH

Gewerk

Heizung / Sanitär

Standort: Gebäude, Etage, Raum:

BTA, alle WC-Herren EG bis OG3

Bezeichnung des Gerätes:

Durchlauferhitzer - DLE18

1.0 Betriebswerte

1.1 el. Leistung: ----- W / VA

1.2 Spannung ----- V

2.0 Anschluss

2.1 Phasenanzahl

☐ 1L/N/PE ☒ 2L/N/PE ☐ 3L/N/PE

2.2 Maximaler Anschlussquerschnitt

2,5mm² mm²

2.3 Anschlussart

☐ Direkt ☒ Steckbar

2.4 gewünschter Kabeltyp

max. NYM-J 2x 2,5

2.5. Anschluss/Einführung

☐ Oben ☐ Unten

2.6 Standort Anschlusspunkt:*

unter Waschtisch

* Das Einsichern und Zuschalten der Anlagen wird durch ein gemeinsames Inbetriebnahme-Protokoll dokumentiert.

* Bei ungenauer Standortangaben Lageplan anhängen.

3.0 Besonderheiten

3.1 Besonderheiten

(z.B. Anschluß flexibel, RCD Typ-B erforderlich o.ä.)

3.2. Anzal identischer Geräte Gesamt

Die Anzahl der Geräte muss aus separat zu erstellenden Plänen hervorgehen.

4 Stück

2022345_5_GR_00_HLSE_001_01

(Bitte Plannummer / Planbezeichnung angeben)

5.0 sonstige Anschlüsse

5.1 USV-Anschluß

☐ 1L/N/PE

☐ 3L/N/PE

Vorsicherung ____A
Charakteristik ____

5.2 örtlicher Potentialausgleich

☐ Anschluß

mm²

☐ PA-Schiene

5.3 Netzwerkanschluß

☐ 1x RJ45

☐ 2x RJ45

Kat

5.4 Ansteuerung aus BMA

☐ Ja

☒ Nein

5.5 Anbindung an MSR oder GLT

☐ Ja

☒ Nein

5.6 Messung erforderlich?

geeicht

☐ Ja

☒ Ja

☐ Nein

☐ Nein

6.0 Termin

Anschlussstermin frühestens 6 Wochen **nach** Einreichung und vollständiger Klärung aller technischen Punkte.

Zudem muss die Anlage min. 1 Woche **vor** Anschlussstermin betriebsfertig auf- /eingebaut sein.

6.1 Wunschtermin:

Ort, Datum

Unterschrift Anforderer

Der nachfolgende Absatz wird vom AN-ELT bearbeitet


Technisch i.O. Anschluss freigegeben

Anschlussstermin bis:

Ort, Datum

Unterschrift Errichterfirma / AN-ELT

Installationsmaße
Elektro!

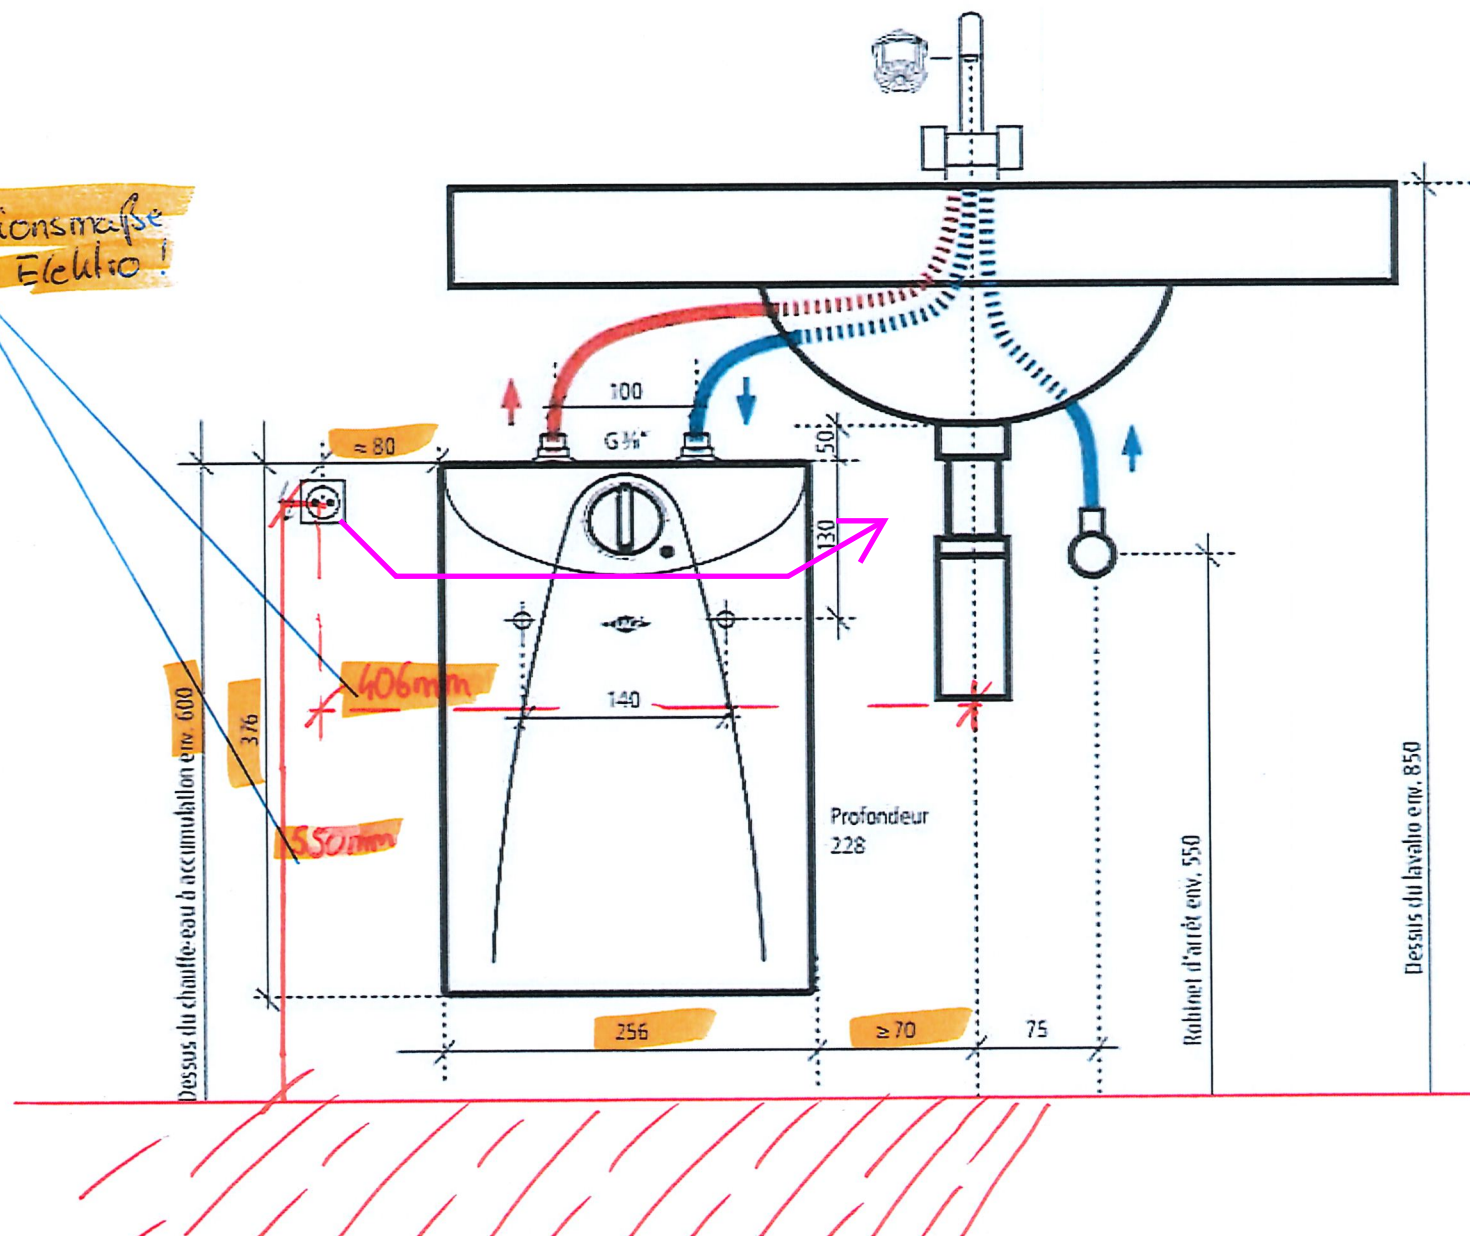

DOUFER
