



Schipp & Westerburg GmbH
Entsorgungsfachbetrieb
Industrie- u. Gewerbegebiet Str. A Nr.9
02991 Lauta ☎ 03 57 22/ 3 15 55

- schiwes -

- Rohr- und Kanalreinigung
- TV- Kanal Inspektion
- Abwasserentsorgung
- Dichtheitsprüfung
- Kanalsanierung



Projektzusammenfassung

Auftrag für

Laussitzer Pumpenservice GmbH
Am Stadthafen 2
01968 Senftenberg

Projekt

LPS 001

Inspektionsdatum

05.03.2025 - 05.03.2025

 Untersucht von:	Geprüft von:	Abgenommen von:
--	--------------	-----------------



Schipp & Westerburg GmbH
Entsorgungsfachbetrieb
Industrie- u. Gewerbegebiet Str. A Nr.9
02991 Lauta ☎ 03 57 22/ 3 15 55

- *schiwes* -

- Rohr- und Kanalreinigung
- TV- Kanal Inspektion
- Abwasserentsorgung
- Dichtheitsprüfung
- Kanalsanierung



Inhalt

Statistik Schächte	3
Schacht PST.IBA- Terrassen Haus 1	4



Projekt Statistik (Schächte)

Datum 05.03.2025

Auftragsnr.	Auftrag für	Arbeitsbeginn
LPS 001		05.03.2025
Stadt	Straße	Arbeitsende
Senftenberg	Am Stadthafen 2	05.03.2025

Datum	SchachtNr.	Straße	Kanalart	Schacht DN	Klasse	Unterteil Mat.	Tiefe
05.03.2...	PST.IBA- Ter...	IBA- Terrassen	Geschlo...	1500	Z	B	6.70
Schachtunterteil DN (1500)							1 Inspektionen (6.70m)
Anzahl Bilder							8
Inspektionsdatum (05.03.2025)							1 Inspektionen (6.70m)
Anzahl Bilder							8

Gesamt inspiziert: 1 (6.70m)

Gesamtzahl Bilder: 8



Schacht Berichtsnr. 1

Datum 05.03.2025

Auftragsnr.	Kundenname	Schachtnummer	Steighilfen	Deckelklasse Kode
LPS 001	Laussitzer Pumpenservice GmbH	PST.IBA- Terrassen Haus 1	Ja	Z
Stadt		Kanalart	Ausgleichsring	Steigeisen (Nur Text)
Großbräschen		Geschlossene Freispiegell...	Ja	Steigleiter
Straße			Konusring	Anzahl Steigeisen
IBA- Terrassen			Nein	21
Inspektionsdatum	Inspektionsgrund	Schacht DN	Deckel DN	Schachtunterteil DN
05.03.2025	Sonstiges	1500	800	1500

Messdaten

Hochwert (GK) 0.000 Deckelhöhe [mNN] 0.000
Rechtswert (GK) 0.000 Sohlhöhe [mNN] 0.000

☐ gegenauigkeit

Höhengenaugigkeit

Deckel Höhengenaugigkeit

Deckel

Form Rund
Durchmesser DN800
Klasse Z

Schachtunterteil

Form Rund
Durchmesser DN1500
Höhe 2

Schacht


Form Rund
Durchmesser DN1500

Material

Konusring kein Eintrag
Gerinne Beton
Schachtoberteil Beton
Schachtunterteil Beton
Innenschutz Beschichtung werkseitig



Daten

Gesamtzustand optisch mängelfrei
Steigeisen Steigleiter
Gerinneform
Baujahr
Steighilfen
Abdeckplatte
Ausgleichsring

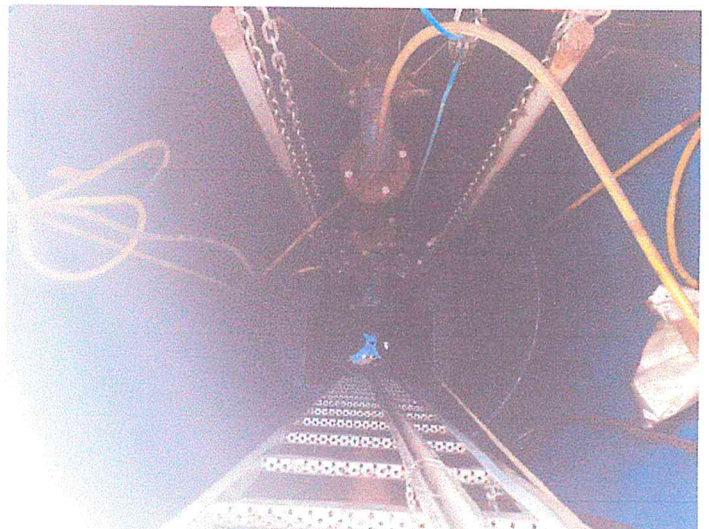

Schacht Berichtsnr. 1

Datum 05.03.2025

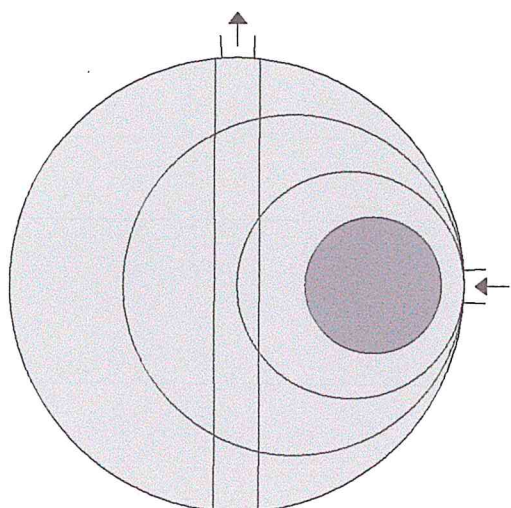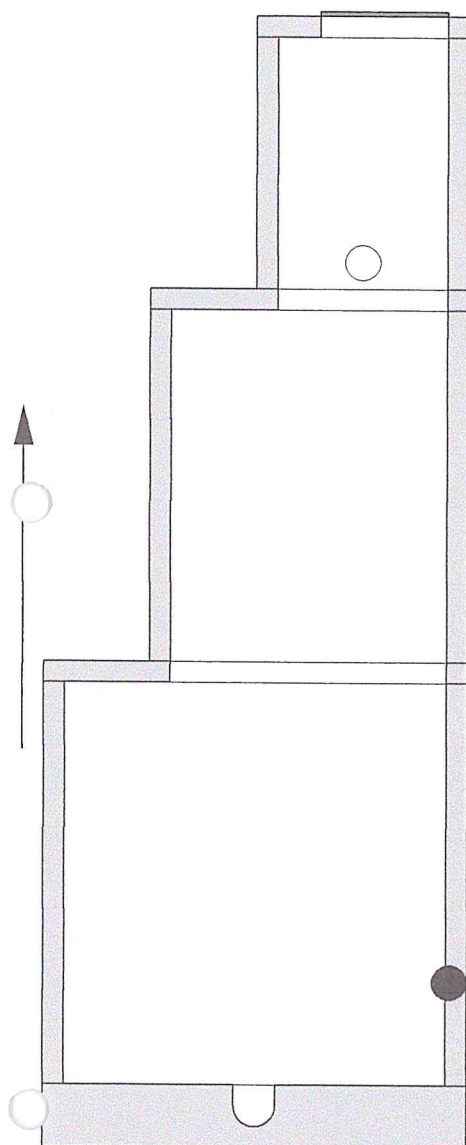

Distanz (m)	Ereignis	Bild	Video
6.70	[DDBB] Inspektionsende, Lage: 12 bis 12	00000006	00:13:08
6.00	[DCAZ] Anschluss, andere Anschlussart, 100.00, Lage: 5, Versorgungsleitungen	00000007	00:13:08
5.19	[DCGAB] Anschlussleitung, Kreisförmig, entwässert aus dem Schacht, 80.00mm, 80.00mm, Lage: 12, Druckleitung	00000003	00:13:08
2.32	[DCHB] Auftritt nicht schadhaft, Lage: 12 bis 12		00:13:08
0.85	[DCGAA] Anschlussleitung, Kreisförmig, entwässert in Schacht, 150.00mm, 150.00mm, Lage: 3	00000004	00:13:08
0.50	[DDA] Allgemeines Foto, Lage: 12 bis 12	00000008	00:13:08
0.00	[DDBA] Inspektionsanfang	00000009	00:13:08

Distanz	Position	Typ	Durchmesser	Material	Bezeichnung
0.85	3	Einlauf	150	PVC	NN
5.19	12	Auslauf	80	GG	Druckleitung


Text: + -



Schacht Berichtsnr. 1

Datum 05.03.2025

Auftragsnr.	Kundenname	Schachtnummer	Steighilfen	Deckelklasse Kode
LPS 001	Laussitzer Pumpenservice GmbH	PST.IBA- Terrassen Haus 1	Ja	Z
Stadt		Kanalart	Ausgleichsring	Steigeisen (Nur Text)
Großbräschen		Geschlossene Freispiegell...	Ja	Steigleiter
Straße			Konusring	Anzahl Steigeisen
IBA- Terrassen			Nein	21
Inspektionsdatum	Inspektionsgrund	Schacht DN	Deckel DN	Schachtunterteil DN
05.03.2025	Sonstiges	1500	800	1500

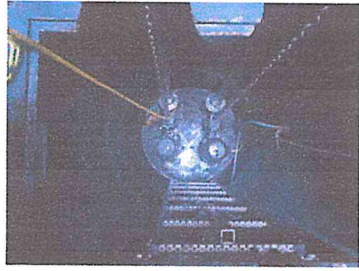Distanz (m)	Ereignis	Bild	Video
0.00	[DDBA] Inspektionsanfang		00000009 00:13:08
0.50	[DDA] Allgemeines Foto, Lage: 12 bis 12		00000008 00:13:08

Distanz	Position	Typ	Durchmesser	Material	Bezeichnung
0.85	3	Einlauf	150	PVCM	NN
5.19	12	Auslauf	80	GG	Druckleitung

Text: +  -

Schachttiefe
6.70 m



- *schiwes* -

- Rohr- und Kanalreinigung
- TV- Kanal Inspektion
- Abwasserentsorgung
- Dichtheitsprüfung
- Kanalsanierung



Datum 05.03.2025

Auftragsnr.	Kundenname		Schachtnummer	Steighilfen	Deckelklasse Code
LPS 001	Laussitzer Pumpenservice GmbH		PST.IBA- Terrassen Haus 1	Ja	Z
Stadt			Kanalart	Ausgleichsring	Steigeisen (Nur Text)
Großbräschen			Geschlossene Freispiegell...	Ja	Steigleiter
Straße				Konusring	Anzahl Steigeisen
IBA- Terrassen				Nein	21
Inspektionsdatum	Inspektionsgrund		Schacht DN	Deckel DN	Schachtunterteil DN
05.03.2025	Sonstiges		1500	800	1500

Distanz (m)	Ereignis	Bild	Video
0.85	[DCGAA] Anschlussleitung, Kreisförmig, entwässert in Schacht, 150.00mm, 150.00mm,Lage: 3		00000004 00:13:08
2.32	[DCHB] Auftritt nicht schadhaft,Lage: 12 bis 12		00:13:08
5.19	[DCGAB] Anschlussleitung, Kreisförmig, entwässert aus dem Schacht, 80.00mm, 80.00mm,Lage: 12, Druckleitung		00000003 00:13:08

Distanz	Position	Typ	Durchmesser	Material	Bezeichnung

Text: +          -


Schachttiefe
6.70 m



Schacht Berichtsnr. 1

Datum 05.03.2025

Auftragsnr.	Kundenname	Schachtnummer	Steighilfen	Deckelklasse Kode
LPS 001	Laussitzer Pumpenservice GmbH	PST.IBA- Terrassen Haus 1	Ja	Z
Stadt		Kanalart	Ausgleichsring	Steigeisen (Nur Text)
Großbräschen		Geschlossene Freispiegell...	Ja	Steigleiter
Straße			Konusring	Anzahl Steigeisen
IBA- Terrassen			Nein	21
Inspektionsdatum	Inspektionsgrund	Schacht DN	Deckel DN	Schachtunterteil DN
05.03.2025	Sonstiges	1500	800	1500

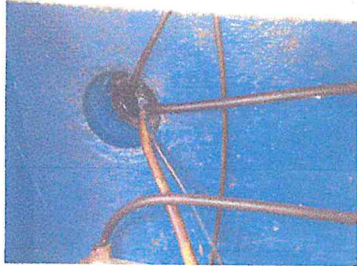Distanz (m)	Ereignis	Bild	Video
6.00	[DCAZ] Anschluss, andere Anschlussart, 100.00,Lage: 5, Versorgungsleitungen		00000007 00:13:08
6.70	[DDBB] Inspektionsende,Lage: 12 bis 12		00000006 00:13:08

Distanz Position Typ Durchm esser Material Bezeichnung

--	--	--	--	--	--

Text: + -

Schachttiefe
6.70 m

Prüfprotokoll über die Durchführung einer Wasserdruckprüfung		
Prüfprotokoll-Nr. = Dokumentname: _____		
Auftraggeber: LPS Lausitzer Pumpenservice GmbH	Auftragnehmer: Schipp & Westerburg GmbH	
Auftragsbezeichnung: Zustandserfassung	Bei der Prüfung anwesend: LPS H. Tübner	
Auftragsdatum:		
Auftragskennung:	Datum der Prüfung: 05.03.2015	Auftragsnummer:
Ort der Prüfung: SW-PW-IBA-Terrassen Großräschen		
Straßenname: Seestraße		
Prüfanlass (Prüfgrund): ☒ Prüfung bestehender Anlagen ☐ Abnahme nach Neubau oder Sanierung	Prüfumfang: ☒ Objekt ☐ abschnittsweise (z.B. zw. zwei Anschlüssen) ☒ punktuell: Innenbeschichtung prüfen	
Prüfvorschrift: (Mehrfachankreuzung möglich) ☐ ATV-DVWK-M 143-6 ☒ DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 139 ☐ Merkblatt 4.3/6 - 2 (LfW Bayern)	☐ DIN EN 1610 ☐ DIN EN 12889 ☐ ATV-DVWK-A 142	Geprüfte Anlage(n): (Mehrfachankreuzung möglich) ☐ Kanal ☐ Leitung ☐ Anschlussleitung(en) ☐ Schacht/Schächte ☒ Bauwerk
Anzahl geprüfte Anschlussleitungen: keine		
Bezeichnung der Objekte: PST. IBA - Terrassen Haus 1		
Kanal/Leitung: _____	geprüft ☐	
Schacht/Inspektionsöffnung (Anfangsknoten) : _____	geprüft ☐	
Schacht/Inspektionsöffnung (Endknoten) : _____	geprüft ☐	
Anschlussleitung 1: _____	geprüft ☐	
Anschlussleitung 2: _____	geprüft ☐	
Anschlussleitung 3: _____	geprüft ☐	
Bauwerk: Behälterprüfung DIN EN 1610 "W"	geprüft ☒ s. Anlage	
Kanal/Leitung: Länge: _____ m Kanalart: (2) _____ Nennweite: _____ mm bzw. Höhe: _____ mm, Breite: _____ mm	Profilart: (1) _____ Material: (3) _____	Schacht/Inspektionsöffnung (Anfangsknoten): Tiefe: 6,70 m DN 1500 Schacht/Inspektionsöffnung (Endknoten): Tiefe: _____ m
Bemerkungen: Untersuchung des Bauwerkes durch TV-Schachtinspektion sowie manuelle Begutachtung durch Einsteigen und Fotodokumentation entsprechend AS-Richtlinien Ergebnis der Sichtprüfung: optisch mangelfrei Ergebnis der TV-Schachtprüfung s. TV-Bericht Projekt Nr.: LPS 001 beiliegend Ergebnis der Dichtheitsprüfung s. Protokoll beiliegenden		

Schipp & Westerburg Gesellschaft
 für Umweltberatung
 Industrieanlagenreinigung und Sonderabfalltransporte mbH
 Industrie- u. Gewerbegebiet Lauta, Straße A Nr. 9
 02901 Lauta
 Tel: 03 57 22 15 55, Fax: 03 57 22 15 56

[-schiwes- • Industrie- und Gewerbegebiet Lauta Straße A Nr. 9 • 02991 Lauta]

Wasserdrukprüfung Schacht

Methode: DIN EN 1610 W

Ausf. Firma: SCHIPP & WESTERBURG GMBH

Prüfer: Zanier, Steve

Ingenieurbüro:

Bauaufsicht:

Kunde: Lausitzer Pumpenservice GmbH

Bauvorhaben: SW- Pumpwerk

IBA- Terrassen Haus 1

Datum: 05.03.2025

Auftrags-Nr.: 2


Prüf-Nr.: 3

Straße: IBA- Terrassen

Ort: 01983 Großräschen

Haltung: PST. IBA- Terrassen Haus 1 Wasser: 0 m

Schachtfläche: 33,23 m² Tiefe: 6,59 m

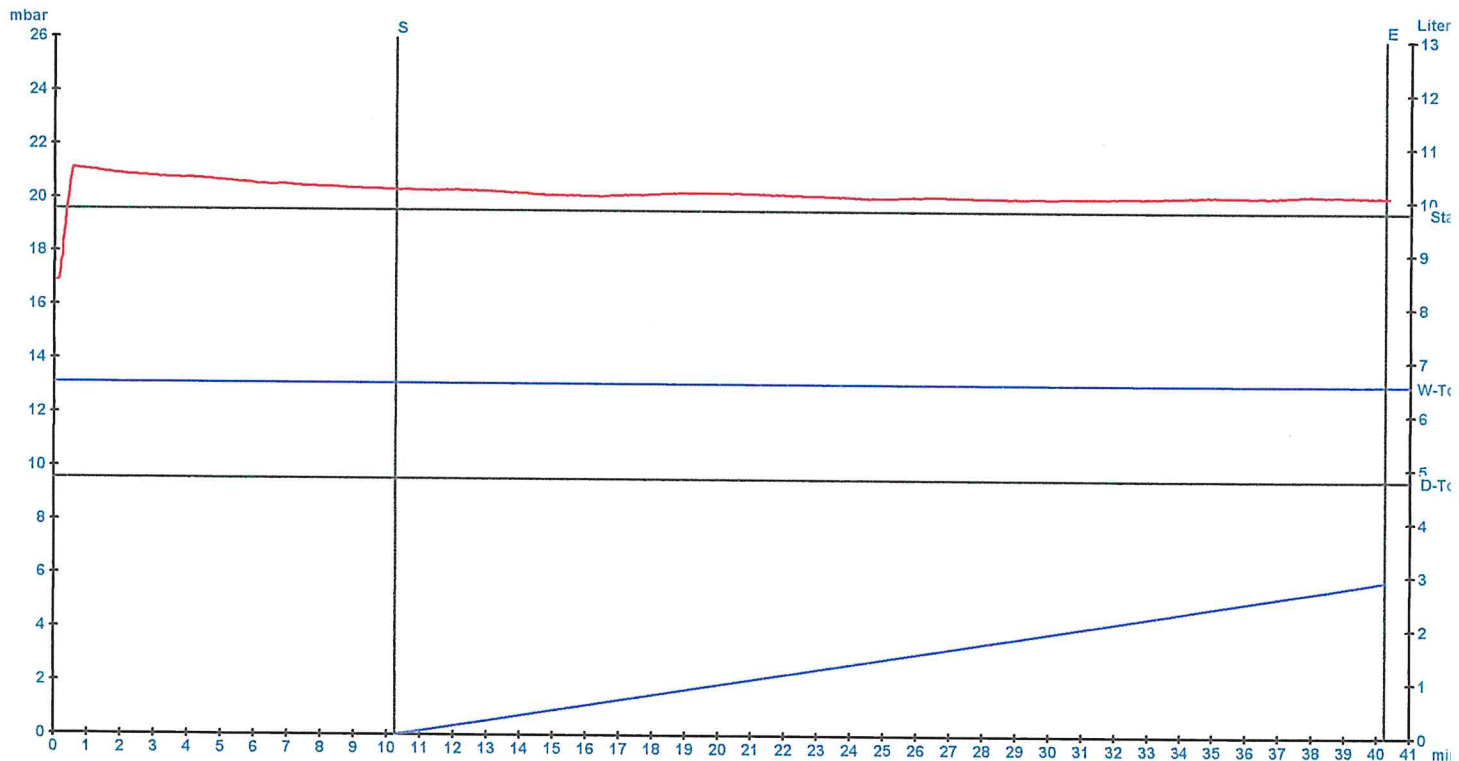

Anmerkung:

Anfangsdruck: 20,3 mbar

Enddruck: 20,2 mbar

Druckabfall: 0,2 mbar

Wasserverlust: 2,916 l

Zuläss. Verlust: 6,550 l

Messanfang: 13:01:06

Messende: 13:31:06

Messdauer: 00:30:00

Soll-Messdauer: 00:30:00

Prüfergebnis: Prüfkriterium erfüllt

Wasserdruckprüfung Schacht

Methode: DIN EN 1610 W

Datum: 05.03.2025
Prüf-Nr.: 3

Ausf. Firma: SCHIPP & WESTERBURG GMBH

Prüfer: Zanier, Steve

Ingenieurbüro:

Bauaufsicht:

Kunde: Lausitzer Pumpenservice GmbH

Bauvorhaben: SW- Pumpwerk
IBA- Terrassen Haus 1

Straße: IBA- Terrassen

Ort: 01983 Großräschen


Schacht-Nr.: 1 von 1
Name: PST. IBA Terrassen Haus 1
Material: Beton
Baujahr: unbekannt

Anzahl Anschlüsse: 0
Schachttiefe: 6,590 m
Schachtfläche: 33,229 m²
Schachtvolumen: 11,152 m³
Pegelstand: 3,100 m
Wasseroberfläche: 1,7671 m²
Benetzte Schachtfläche: 16,376 m²
Benetztes Schachtvolumen: 5,478 m³
Fläche gesamt: 33,229 m²
Volumen gesamt: 11,152 m³
Benetzte Fläche gesamt: 16,376 m²
Benetztes Volumen gesamt: 5,478 m³

d3 = Zylinder-Durchmesser: 0,800 m
h3 = Zylinder-Höhe: 0,390 m
a3 = Zylinder-Fläche: 0,980 m²
v3 = Zylinder-Volumen: 0,196 m³
Zylinder benetzte Fläche: 0,000 m²

d2 = Zylinder-Durchmesser: 1,500 m
h2 = Zylinder-Höhe: 3,880 m
a2 = Zylinder-Fläche: 19,549 m²
v2 = Zylinder-Volumen: 6,857 m³
Zylinder benetzte Fläche: 3,676 m²

d1 = Zylinder-Durchmesser: 1,500 m
h1 = Zylinder-Höhe: 2,320 m
a1 = Zylinder-Fläche: 12,700 m²
v1 = Zylinder-Volumen: 4,100 m³
Zylinder benetzte Fläche: 12,700 m²

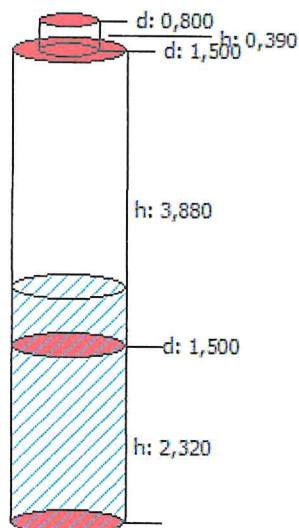

Anmerkung:
