

Außenwandaufbau HPL / Eingangsbereich
(von außen nach innen)

- Außenwandbekleidung mit HPL-Paneele, mit Dekor bedruckt, verdeckt befestigt, Stoß- / Schattenfugen 10mm
- Metall-Unterkonstruktion, Hinterlüftung mit Insektengitter Vorderseite im Fugenbereich dunkel eingefärbt
- FT-Betonwand, D = 12 cm gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, D = 5 cm, Anschlussstreifen mit geschlossenzelliger Dämmung, beschichtet Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellerangaben

Außenwandaufbau WC-Kabine
(von außen nach innen)

- Außenwandbekleidung, Gitterrostfassade, verzinkt, Maschenweiten nach Angabe (individuelle Fertigung), verdeckte Befestigung mit unterschiedlichen Distanzen zur Betonfassade, Aufteilung Gitterrost-Element nach Angabe
- Stahlunterkonstruktion zur Befestigung der Gitterrostfassade, verzinkt, gem. Statik
- FT-Betonwand, D = 12 cm, gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, tw. XPS, D = 5 cm, Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellervorgaben

Türen:

- wärmegeädämmtes Edelstahl-Türelement mit Türblatt und geschlossener Profizarge, Schließ- und Antriebstechnik sowie Dichtungssystem nach Angabe
- Befestigung mit Montagewinkeln, Schwelle vorgelüftet für wasserdichten Anschluss der Sockelabdichtung
- Türblatt außenseitig mit HPL-Bekleidung (Dekor) bekleidet, Unterschneidung als Zuströmoöffnung
- Übergang zur Innenwandbekleidung mit gekantetem Edelstahl-Leibungsblech, dreiseitig umlaufend
- Griffstange außen / Stoßgriff innen
- kabinenseitig montierter Kleiderhaken

Fußbodenaufbau Kabine:
(von oben nach unten)

- Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit Gewebeeinlage, Hohlekehle umlaufend, Rutschfestigkeit R11
- Farbton nach Angabe
- Gefälleestrich, Gefälle ca. 2 % mit elektr. Heizmatte
- Abdichtung / Trennlage
- Schaumglasdämmung, D = min. 8 cm WLS 035
- FT-Betonfertigteile-Sohle, D = 20 cm, gem. Statik
- Höhenausgleich, Auflager gem. Statik
- Fuge unter Wänden hohlraumfrei ausgemörtelt
- Ortbeton-Sohlplatte als WU-Konstruktion, D = 25 cm gem. Statik, auf Trennlage
- Sauberkeitsschicht, Magerbeton, D = ca. 5 cm

Dachaufbau
(von oben nach unten)

- Kiesschüttung
- Kunststoffdachbahn, wurzelfest nach FLL, mechanisch befestigt, Fläche + Attika
- Grund- und Gefälledämmung, trittfest, WLS 035, D = min. 8 cm, Gefälle in der Fläche $\approx$ 2%, Dachreiter und Ketten $<$ 2%
- Dampfsperre auf Voranstrich
- FT-Betondecke, D = 18 cm, gem. Statik
- Unterdeckenanstrich und Fugenversiegelung (RAL-Farbt nach Angabe, z.B. RAL 9016)

Außenwandaufbau Technikbereich
(von außen nach innen)

- Aufbau gem. Außenwand WC-Kabine, jedoch:
- an Außenwänden: Schaumglasdämmung mit Innenputz, armiert, systemkonform zum Untergrund
- Anstrich, z.B. RAL 9016

Wandaufbau Technikbereich zu WC-Kabine
(von Technikbereich zu Kabine)

- Anstrich (ca. RAL 9016)
- FT-Betonwand, D: 12 cm, gem. Statik
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellerangaben

Vordachbekleidung HPL, unterseitig
(von oben nach unten)


- Deckenbekleidung mit HPL-Paneele, bedruckt, unterseitig verdeckt befestigt, winddruck- und -sogfest, Stoß- / Schattenfuge 10 mm
- Metall-Unterkonstruktion, Hinterlüftung mit Insektenschutz, Vorderseite im Fugenbereich dunkel eingefärbt

Fußbodenaufbau Technikraum:
(von oben nach unten)

- Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit Gewebeeinlage, Hohlekehle umlaufend, R11, Farbton nach Angabe
- Dünnschichtestrich
- Abdichtung / Trennlage / Untergrundvorbereitung
- Ortbeton-Sohlplatte als WU-Konstruktion, D = 25 cm gem. Statik, auf Trennlage
- Sauberkeitsschicht, Magerbeton, D = ca. 5 cm

Oberlicht / Lichtkuppel:

- doppelschalige Lichtkuppel, opal, starr, wärmegeädämmt, gem. WS-Nachweis
- Aufsetzkranz, außenseitig wärmegeädämmt, innenseitig weiß lackiert
- mit Klemmschiene zur Dachbahn-Fixierung
- U-Wert nach Vorgabe Fachplanung
- dauerhaft durchstrichsicher

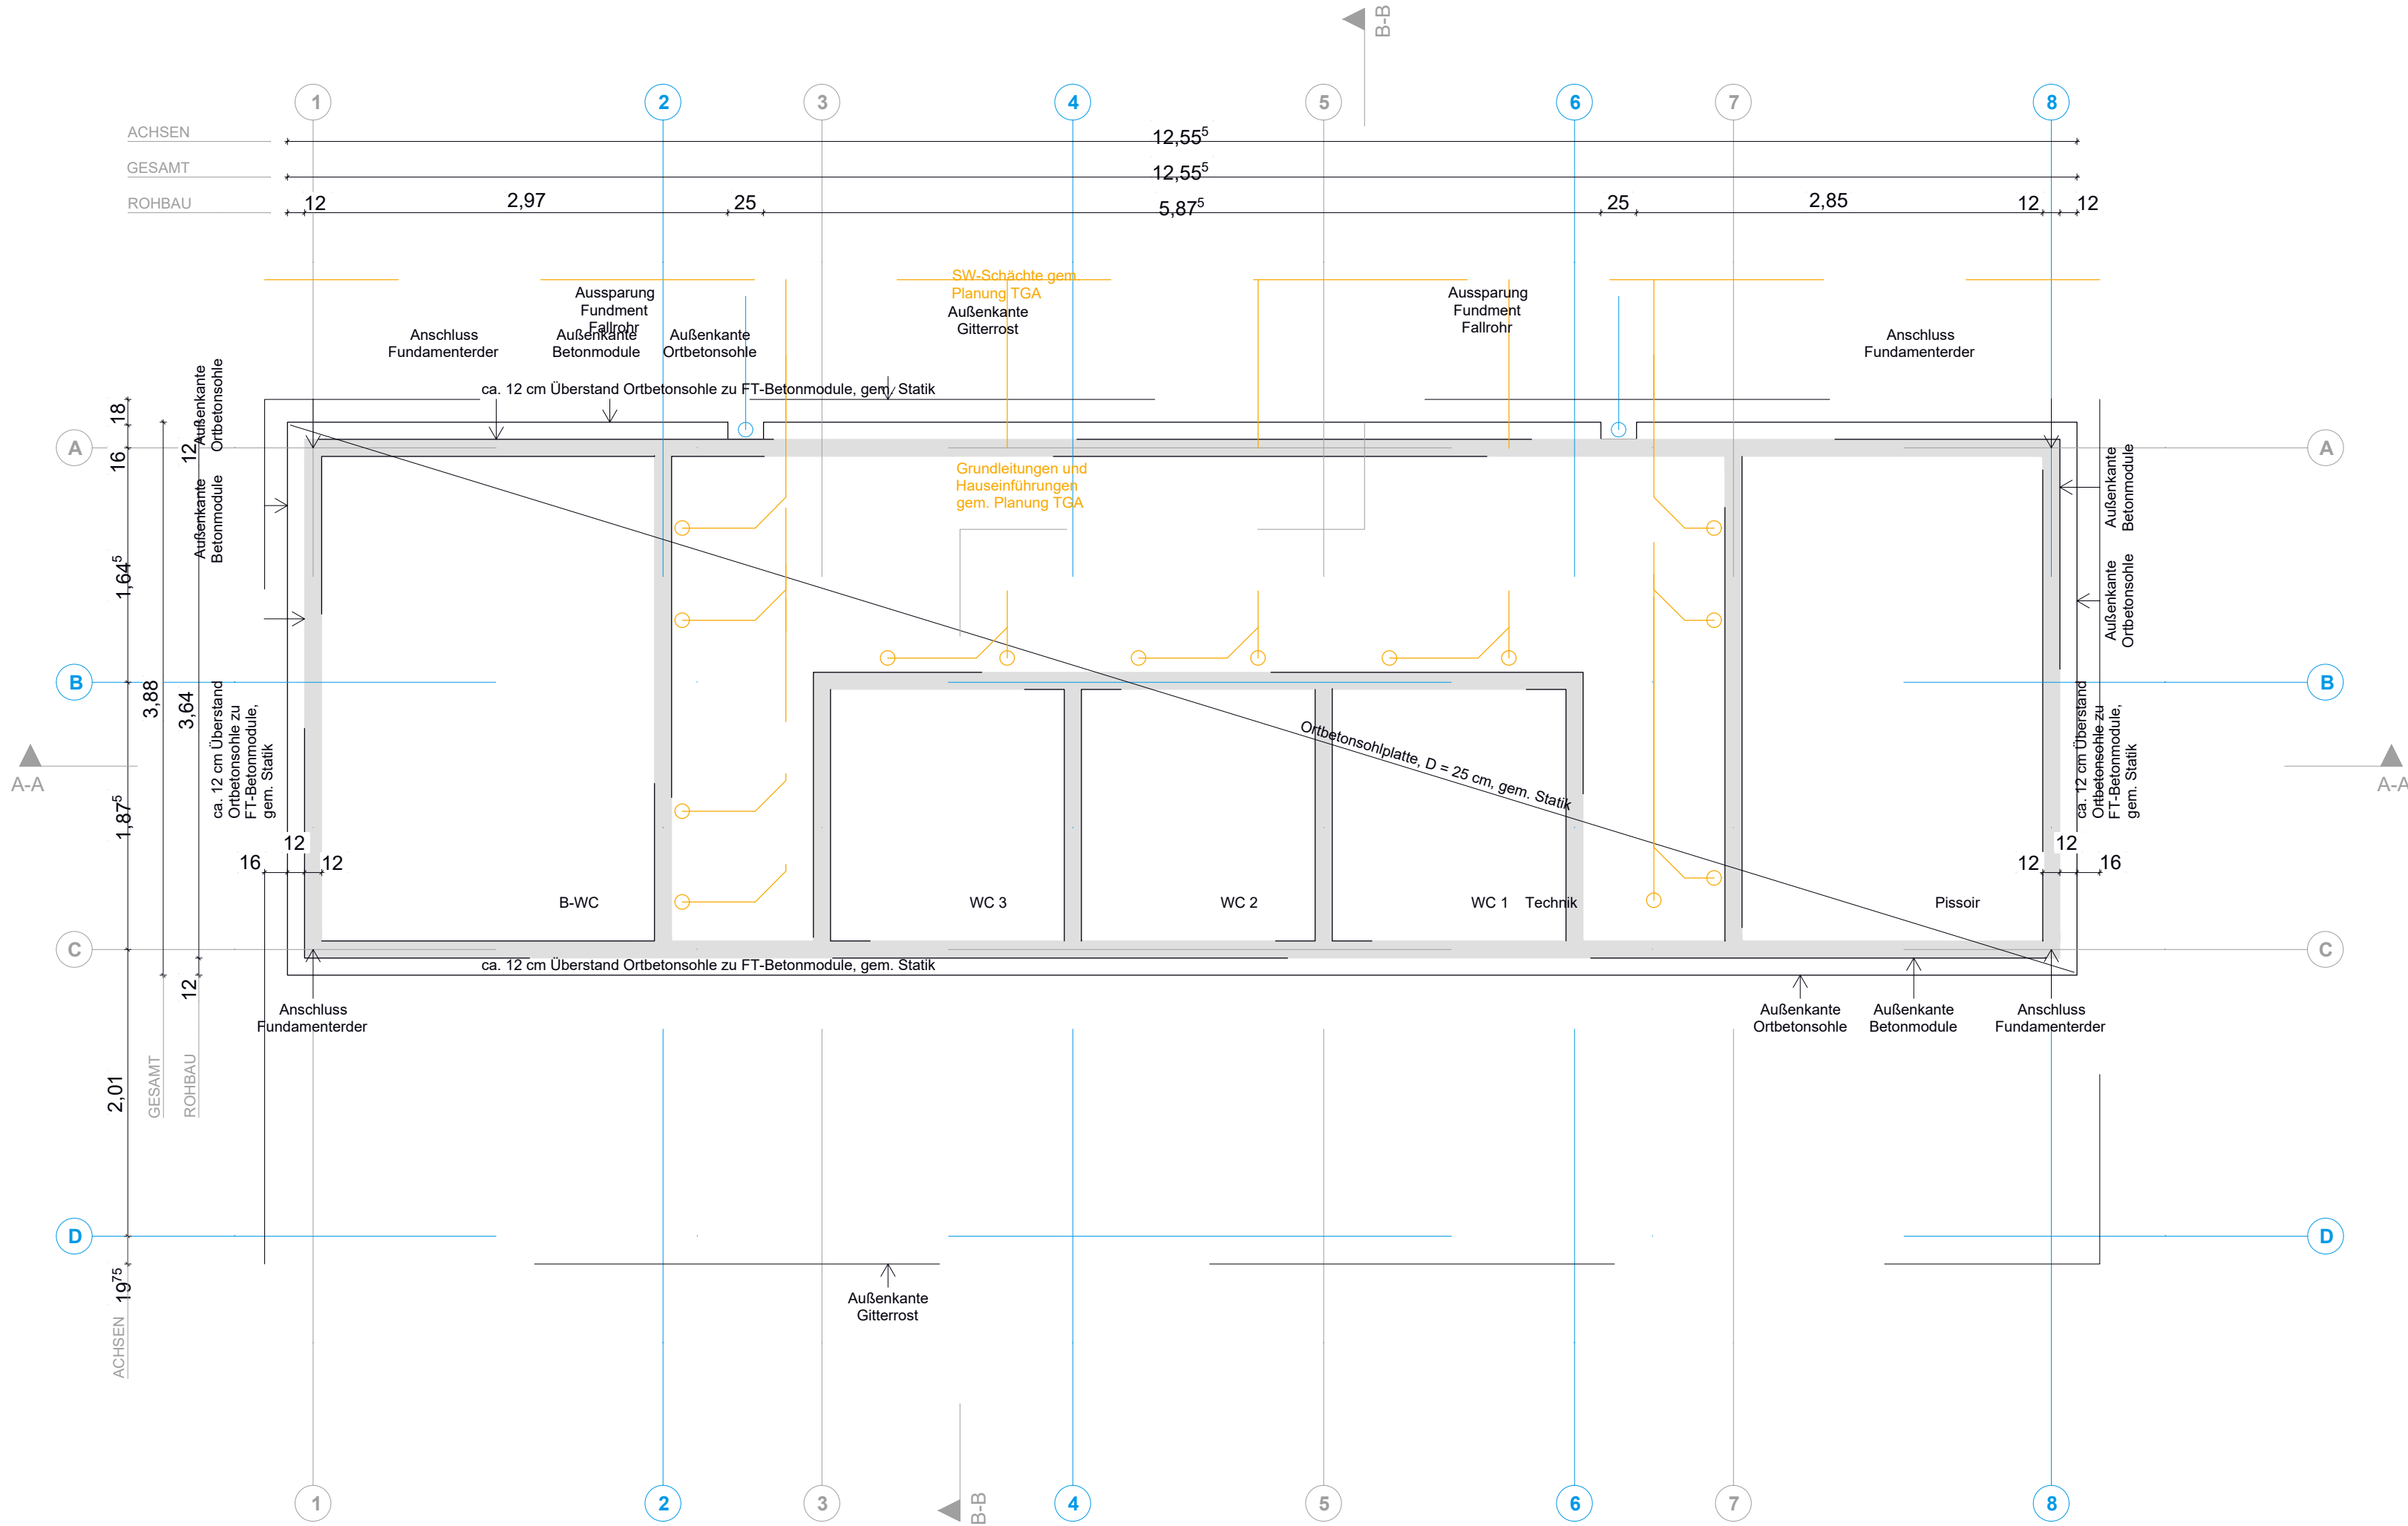

HÖHENANGABE OK FF EG: $\pm 0,00 \pm 454,55$ m ü.NHN

- BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH (DD)

ABHANGDECKE (AD)

STAHLBETON (STB)

MAUERWERK (MW)

TROCKENBAUWAND (TB)

TB-VORSATZSCHALE, halbhoch

TB-VORSATZSCHALE
- OK FERTIGFUSSBODEN
ü.NHN

HÖHENKOTE AUSBAU

HÖHENKOTE ROHBAU

SCHNITTLINIE

ACHSE

Hinweise:

01. Angegebene Flächen = Nettoflächen (NGF) mit Abzug von Putz und Fliesenflächen
02. Tragwerk = Ausführung gem. Fachplanung
03. Haustechnik = Ausführung gem. Fachplanung
04. Brandschutz = Ausführung gem. Brandschutzgutachten
05. Freianlagen = Ausführung gem. Freiflächenplan Fachplaner
06. Brüstungshöhen (BRH) = Fertigmaße zu OKFF
07. Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmenden zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.
08. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültiger DIN- bzw. EN-Normen.

Ausschreibung

Ausschreibung		Projekt-Nr.:		
			Datum	Zeichen
		Bearb.:	06.05.2026	
		Gez.:		
		Gepr.:		
Geändert		Datum	Gez.	Geprüft
a				
b				
c				
d				

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Flaschenhofstraße 55
90402 Nürnberg

SAP - Projekt-Nr.:
A.02045.00

Baumaßnahme:

BAB A3
PWC-Anlage O ttenberg (Pilsach)
Neubau eines WC-Gebäudes

Plandarstellung:

ARC_6_GR_N Gründung

C6 - Abt. Hochbau

Maßstab: 1:50

Aufgestellt: Nürnberg, 06.05.2026
Niederlassung Nordbayern
