

Außenwandaufbau HPL / Eingangsbereich
(von außen nach innen)

- Außenwandbekleidung mit HPL-Paneelen, mit Dekor bedruckt, verdeckt befestigt, Stoß- / Schattenfugen 10mm
- Metall-Unterkonstruktion, Hinterlüftung mit Insektengitter Vorderseite im Fugenbereich dunkel eingefärbt
- FT-Betonwand, D = 12 cm gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, D = 5 cm, Anschlussstreifen mit geschlossenzelliger Dämmung, beschichtet Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellerangaben

Außenwandaufbau WC-Kabine
(von außen nach innen)

- Außenwandbekleidung, Gitterrostfassade, verzinkt, Maschenweiten nach Angabe (individuelle Fertigung), verdeckte Befestigung mit unterschiedlichen Distanzen zur Betonfassade, Aufteilung Gitterrost-Element nach Angabe
- Stahlunterkonstruktion zur Befestigung der Gitterrostfassade, verzinkt, gem. Statik
- FT-Betonwand, D = 12 cm, gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, tw. XPS, D = 5 cm, Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellervorgaben

Türen:

- wärmegeädmmtes Edelstahl-Türelement mit Türblatt und geschlossener Profilhänge, Schließ- und Antriebstechnik sowie Dichtungssystem nach Angabe
- Befestigung mit Montagewinkeln, Schwelle vorgestrichen für wasserdichten Anschluss der Sockelabdichtung
- Türblatt außenseitig mit HPL-Bekleidung (Dekor) bekleidet, Unterschneidung als Zuströmöffnung
- Übergang zur Innenwandbekleidung mit gekantetem Edelstahl-Leibungsblech, dreiseitig umlaufend
- Griffstange außen / Stoßgriff innen
- kabinenseitig montierter Kleiderhaken

Fußbodenaufbau Kabine:
(von oben nach unten)

- Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit Gewebeeinlage, Hohlkehle umlaufend, Rutschfestigkeit R11
- Farbton nach Angabe
- Gefälleestrich, Gefälle ca. 2 % mit elektr. Heizmatte
- Abdichtung / Trennlage
- Schaumglasdämmung, D = min. 8 cm WLS 035
- FT-Betonfertigteil-Sohle, D = 20 cm, gem. Statik
- Höhenausgleich, Auflager gem. Statik, Fuge unter Wänden hohlräumfrei ausgemörtelt
- Ortbeton-Sohlplatte als WU-Konstruktion, D = 25 cm gem. Statik, auf Trennlage
- Sauberkeitsschicht, Magerbeton, D = ca. 5 cm

Dachaufbau
(von oben nach unten)

- Kiesschüttung
- Kunststoffdachbahn, wurzelfest nach FLL, mechanisch befestigt, Fläche + Attika
- Grund- und Gefälledämmung, trittfest, WLS 035, D = min. 8 cm, Gefälle in der Fläche = 2%, Dachreiter und Kehlen < 2%
- Dampfsperre auf Voranstrich
- FT-Betondecke, D = 18 cm, gem. Statik
- Unterdeckenanstrich und Fugenversiegelung (RAL-Farbtton nach Angabe, z.B. RAL 9016)

Oberlicht / Lichtkuppel:

- doppelschalige Lichtkuppel, opal, starr, wärmegeädmmt, gem. WS-Nachweis
- Aufsetzkranz, außenseitig wärmegeädmmt, innenseitig weiß lackiert
- mit Klemmschiene zur Dachbahn-Fixierung
- U-Wert nach Vorgabe Fachplanung
- dauerhaft durchsturz sicher

Fußbodenaufbau Technikraum:
(von oben nach unten)


- Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit Gewebeeinlage, Hohlkehle umlaufend, R11, Farbton nach Angabe
- Dünnschichtestrich
- Abdichtung / Trennlage / Untergrundvorbereitung
- Ortbeton-Sohlplatte als WU-Konstruktion, D = 25 cm gem. Statik, auf Trennlage
- Sauberkeitsschicht, Magerbeton, D = ca. 5 cm

Wandaufbau Technikbereich zu WC-Kabine
(von Technikbereich zu Kabine)

- Anstrich (ca. RAL 9016)
- FT-Betonwand, D: 12 cm, gem. Statik
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellerangaben

Vordachbekleidung HPL, unterseitig
(von oben nach unten)

- Deckenbekleidung mit HPL-Paneelen, bedruckt, unterseitig verdeckt befestigt, winddruck- und -sogfest, Stoß- / Schattenfuge 10 mm
- Metall-Unterkonstruktion, Hinterlüftung mit Insekenschutz, Vorderseite im Fugenbereich dunkel eingefärbt

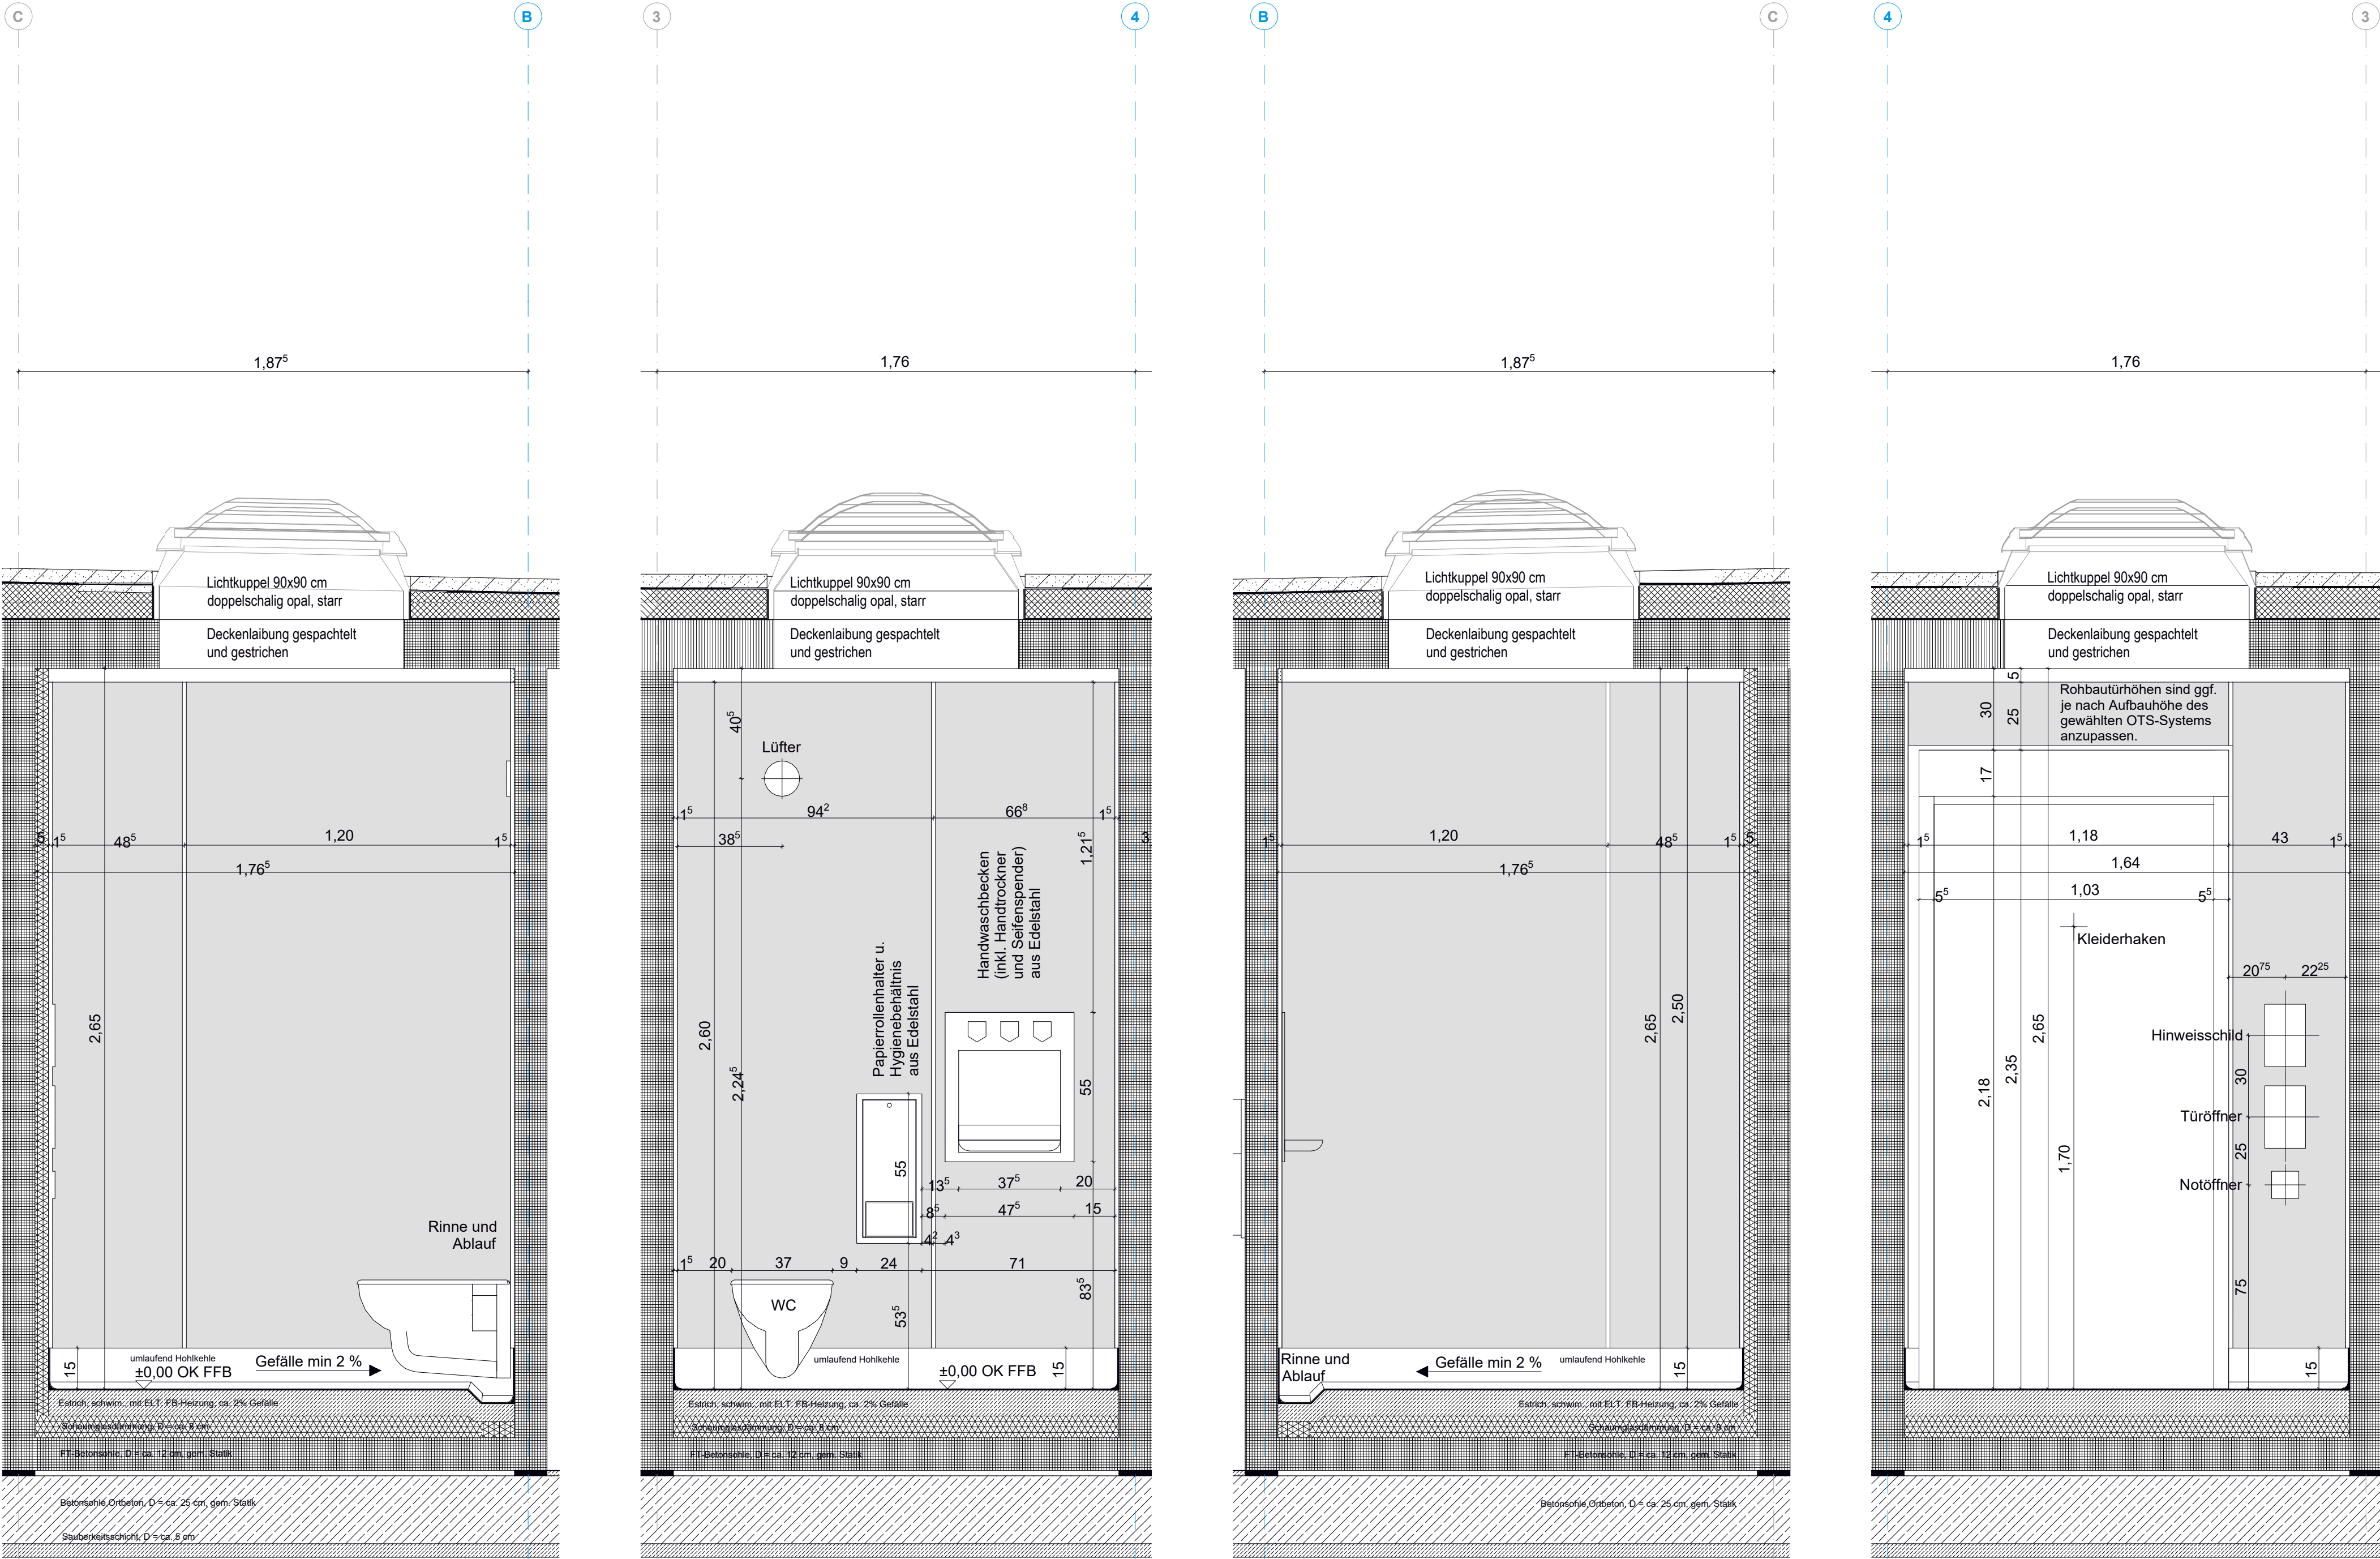

HÖHENANGABE OK FF EG: ± 0,00 ± 454,55 m ü.NHN

- BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH (DD)

ABHANGDECKE (AD)

STAHLBETON (STB)

MAUERWERK (MW)

TROCKENBAUWAND (TB)

TB-VORSATZSCHALE, halbhoch

TB-VORSATZSCHALE
- OK FERTIGFUSSBODEN

ü.NHN

HÖHENKOTE AUSBAU

HÖHENKOTE ROHBAU

SCHNITTLINIE

ACHSE

Hinweise:

01. Angegebene Flächen = Nettoflächen (NGF) mit Abzug von Putz und Fliesenflächen
02. Tragwerk = Ausführung gem. Fachplanung
03. Haustechnik = Ausführung gem. Fachplanung
04. Brandschutz = Ausführung gem. Brandschutzgutachten
05. Freianlagen = Ausführung gem. Freiflächenplan Fachplaner
06. Brüstungshöhen (BRH) = Fertigmaße zu OKFF
07. Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmenden zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.
08. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültiger DIN- bzw. EN-Normen.

Ausschreibung

Projekt-Nr.:

Datum

Zeichen

Bearb.: 07.05.2026


Gez.:

Gepr.:

Datum

Gez.

Geprüft



Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Flaschenhofstraße 55
90402 Nürnberg

SAP - Projekt-Nr.:
A.02045.00

Baumaßnahme:

BAB A3

PWC-Anlage O ttenberg (Pilsach)

Neubau eines WC-Gebäudes

Datum

Zeichen

Bearb.:

Gez.:

Gepr.:

C6 - Abt. Hochbau

ARC_6_SN_WC1_N Abwicklung Kabine

Maßstab: 1: 20

Aufgestellt: Nürnberg, 07.05.2026
Niederlassung Nordbayern
