




Titelblatt

Bauwerksbuch

nach DIN 1076

Bauwerksname	LSW A1 FR Bremen von km 358,41-361,49
Teilbauwerksname	LSW A1 FR Bremen von km 359,892-360,520
Nächst gelegener Ort	Sprockhövel
Verwaltung/Gemarkung	Stadt Sprockhövel
Bemerkungen	LSW wird von folgenden Bauwerken unterbrochen: BW 4609521, 4609522, 4609760

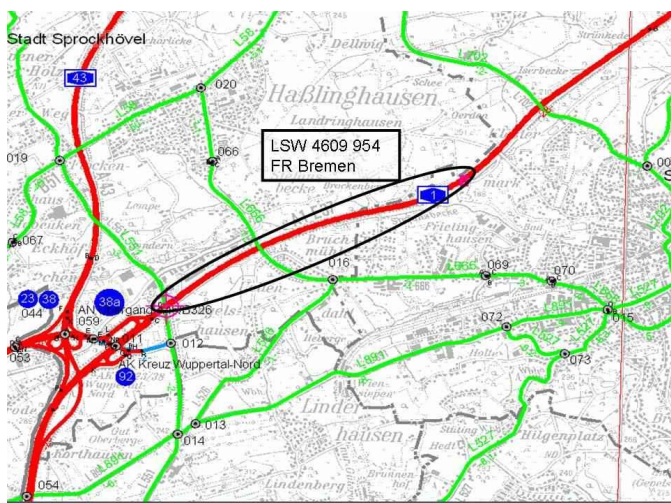

2 Übersichtsblatt

Name: **LSW A1 FR Bremen von km 358,41-361,49/LSW A1 FR Bremen von km 359,892-...**

Zustand: **2,8** Baujahr: **1993**

HP: 31.01.2024 Prüfwahl: 2023

EP: 03.03.2026 Prüfljahr: 2026

Ges.länge: **650,00 m**

Mittl.Höhe: **4,07 m**

Fläche **2646 m²**

Anz. Segm.: 13

UI/UA: **UI/UA bei SBV**

Baulast: **Bund**

Bemerkung: **Das Baujahr ist geschätzt!**

Art: **Lärmschutzwand**

Ort: **Sprockhövel**

Konstrukt.: **Stahlbetonwand mit Aluminiumvorsatzschale**

Stadium: **Bauwerk unter Verkehr**

Stat.Sys.L: In Längsrichtung gleichartige Bauteile

Stat.Sys.Q:

Amt: **AS Dillenburg**

SM: **AM Hagen**

Brkl:

MLC R|K:

Baustoff 1: **Beton/Stahlbeton**

Fläche 1: **2646,20 m²**

Baustoff 2:

Fläche 2:

Baustoff 3:

Fläche 3:

Baustoff 4:

Fläche 4:



Lage	Straße	Von Nk	Nach Nk	Netzknoten abschnitt	Station Mitte [m]	KM
*E:	A 1	4609011A	4610009A	28	1849	360,190
Lage	Min B [m]	Min H [m]	Schilder StVO/Menge			
*E:						



Inhaltsverzeichnis Bauwerksbuch Lärmschutzbauwerk

(Fortsetzung)

Seite	Inhalt	Stand
1	Titelblatt	08.04.2019
2	Übersichtsblatt Bauwerksbuch	. .
3	Inhaltsverzeichnis	04.08.2026
4	Bestandsunterlagen	
	4.1 Bauwerksskizze	08.04.2019
5	Hauptbauteile	
	5.1 Teilbauwerk	08.04.2019
	5.2 Lärmschutzbauwerke	18.02.2010
	5.3 Segmente Lärmschutzbauwerke	27.04.2010
	5.4 Statisches System / Tragfähigkeit	25.07.2012
	5.5 Nachrechnung	. .
	5.6 Baustoffe	27.04.2010
6	Konstruktionsteile	
	6.2 Gründungen	22.02.2010
	6.3 Erd- und Felsanker	. .
	6.5 Lager	. .
	6.7 Abdichtungen	. .
	6.9 Schutzeinrichtungen	. .
	6.10 Ausstattungen	27.04.2010
	6.11 Gestaltung	27.04.2010
	6.12 Leitungen	. .
	6.13 Verfüllungen von Rissen und Hohlräumen	. .
	6.14 Betonersatzsysteme	. .
	6.15 Oberflächenschutzsystem für Beton	. .
	6.17 Baustoffe der Konstruktionsteile	27.04.2010
7	Prüfung / Zustand	



Inhaltsverzeichnis Bauwerksbuch Lärmschutzbauwerk

(Fortsetzung)

Seite	Inhalt	Stand
	7.1 Prüfanweisungen	18.02.2010
	7.2 Notwendige Prüffahrzeuge / Prüfgeräte	. .
	7.3 Durchgeführte Prüfungen	06.03.2026
	7.4 Schäden	06.03.2026
	7.5 Bewertung	06.03.2026
	7.6 Empfehlungen	13.03.2026
8	Planung / Bau / Verwaltung	
	8.1 Entwürfe, Berechnungen	22.02.2010
	8.2 Verwaltungsmaßnahmen, Sondervereinbarungen	. .
	8.3 Bau- und Erhaltungsmaßnahmen	13.10.2014
9	Sachverhalte	
	9.1 Straße	12.05.2010
	9.2 Netzzuordnung	24.01.2012
	9.3 Strasseninfo	05.05.2023
	9.4 Durchfahrtshöhen	. .
	9.5 Beläge	. .
	9.6 Beschilderung	. .
	9.7 Verkehrsmengen	29.12.2018
11	Bauwerksbilder	
12	Anlage BW-BUCH	18.02.2010




4 Bauwerksskizze BESTAND03

(Fortsetzung)

Lage:
(entlang (neben) liegend/Ast der BAB)
Konstruktion:
Stütze:
(verkehrsseitig/mittig/anliegerseitig/verdeckt)
Wand:
Absorptionschale:
Sockel:
Gründung:
Ausstattung:
Gestaltung:
Leitungen:
Sonstiges:

Wie A
Tür zw. 627/628 u. 683/684

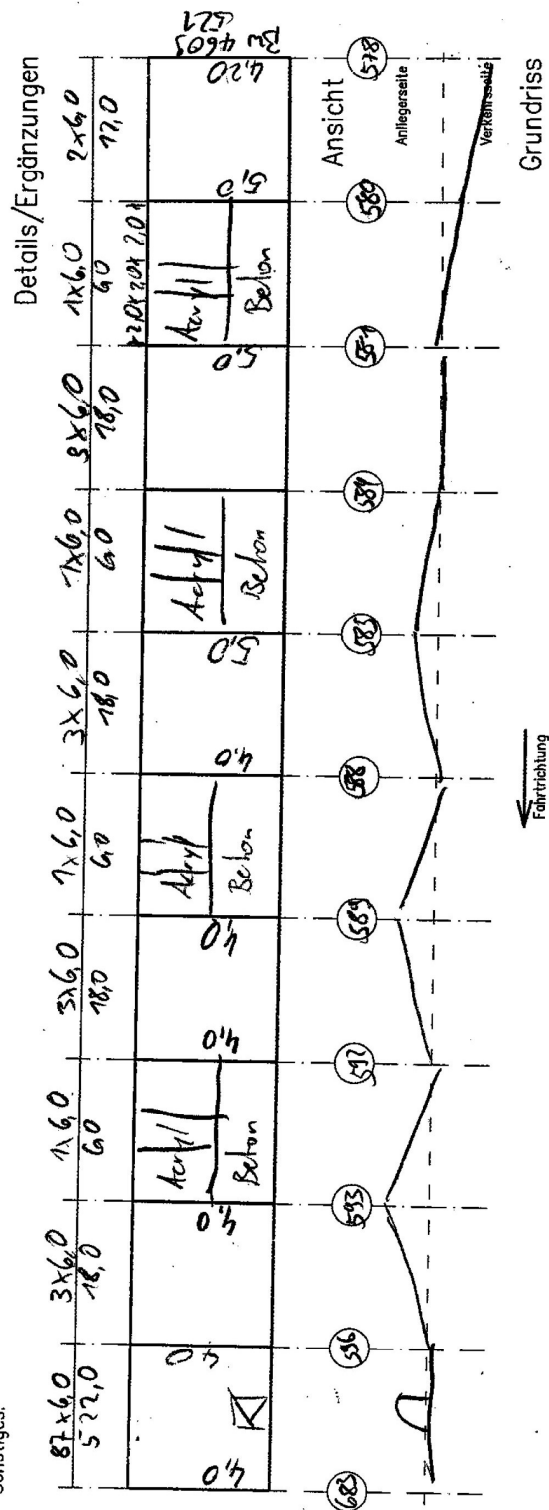

BAB	1	Beuren	4609954	B	von km bis km	650,0 m	Sprockhörd	Verwaltung	19.04.10	RP	1/2
Fährtrichtung		Bauwerksnummer		Teilbauwerk		Übrige Teilbauwerk		nächstgelegener Ort		Datum	
										Bearbeiter	
										Seite	



4 Bauwerksskizze BESTAND04

(Fortsetzung)

Lage:
(entlang (neben) liegend/Ast der BAB)

Konstruktion:

Stütze:

(verkehrsseitig/mittig/anliegerseitig/verdeckt)

Wand:

Absorbitionsschale:

Sockel:

Gründung:

Ausstattung:

Gestaltung:


Leitungen:

Sonstiges:

wie "A"

wie "A"

Details/Ergänzungen

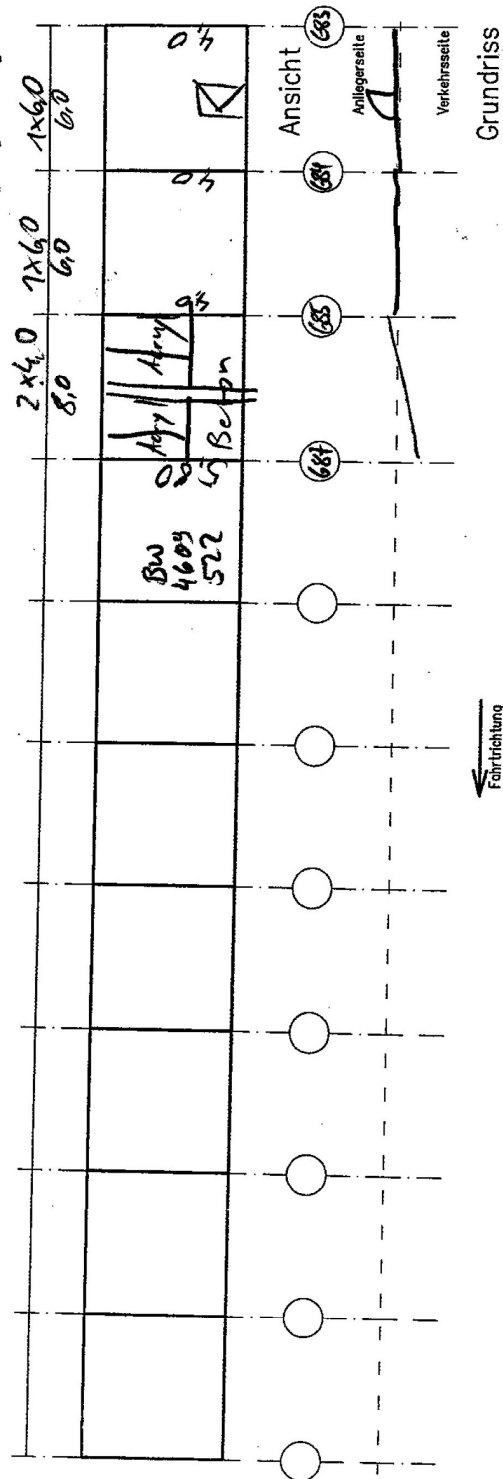

M 1:200

1	Bauen	4609954	B	650,0m	Spreckhövel	19.04.10	2/2
BAB	Fährtrichtung	Bauwerksnummer	Teilbauwerk	Länge Teilbauwerk	inbegriffener Ort	Datum	Seite



5 Hauptbauteile

5.1 Teilbauwerk

Bauwerksart	Lärmschutzwand		
Stadium	Bauwerk unter Verkehr		
Teilbauwerksname	LSW A1 FR Bremen von km 359,892-360,520		
Konstruktion	Stahlbetonwand mit Aluminiumvorsatzschale		
BW-Stationierung	In Stationierungsrichtung		
BW-Richtung	FR Bremen		
Amt	AS Dillenburg		
Meisterei	AM Hagen		
UI/...	UI/UA bei SBV		
- pflichtiger Partner			
Baulast Konstrukt	Bund		
Unterhaltungslast Übb			
Konkretisierung Überb.	--		
Unterhaltungslast Untb			
Konkretisierung Unterb.	--		
Bauwerksakte-Nr.			
Baujahr	1993		
Datenerf. abgeschl.	Ja	Int. Sortierschlüssel	A1-360,190
Denkmalschutz			
Bemerkungen	Das Baujahr ist geschätzt!		
Unterlagen	Digitale Bestandsunterlagen vorhanden		

5.1.1 GIS-Koordinaten

Gauß-Krüger-Koordinaten

Bezugssystem	DE_DHDN_3GK_NW177
Rechtswert	2590218,030
Hochwert	5688393,500

UTM-Koordinaten

Bezugssystem	ETRS_UTM_NW489
X-Koord./Hochw.	5687144,890
Y-Koord./Rechtsw.	381101,330



5 Hauptbauteile

5.2 Lärmschutz- /Schutzbauwerk

Gesamtlänge	650,00 m	
Fläche	2646 m²	
Anzahl Segmente	13	
Mtl. Segmenthöhe	4,07 m	Max. Segmenthöhe 5,00 m
Baustoffklasse 1	Beton/Stahlbeton	Fläche 2646,20 m²
Baustoffklasse 2		Fläche
Baustoffklasse 3		Fläche
Baustoffklasse 4		Fläche
Bemerkung		

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

<u>Segment-Nr.</u>	1	
Länge	12,00 m	
Anfangshöhe	4,20 m	Endhöhe 5,00 m
Pfostenabstand	6,00 m	
Standort des Pfostens	Anliegerseitig	
Baustoff Pfosten	Stahlbeton	
Untergrund	Damm / Wall	
Baustoff Wandelement	Stahlbeton	
Fangvorrichtung		
Vogelschutz		
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale	Hochabsorbierend	
Pflanzungen auf der Verkehrsseite		
Pflanzungen auf der Anliegerseite		
Besichtigungsweg auf Anliegerseite	Ohne	
Bemerkung	Anschluß an BW 4609521; Pfosten 578-580	



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **2**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **5,00 m** Endhöhe **5,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 580-581,
Segment mit Acrylglaselement**

Segment-Nr. **3**
Länge **18,00 m**
Anfangshöhe **5,00 m** Endhöhe **5,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 581-584**



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **4**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **5,00 m** Endhöhe **5,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 584-585,**
 Segment mit Acrylglaselement

Segment-Nr. **5**
Länge **18,00 m**
Anfangshöhe **5,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 585-588**



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **6**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 588-589**
 Segment mit Acrylglaselement

Segment-Nr. **7**
Länge **18,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 589-592**



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **8**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 592-593**
 Segment mit Acrylglaselement

Segment-Nr. **9**
Länge **18,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 593-596**



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **10**
Länge **522,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 596-683;**
 Fluchttür Pfosten 627/628

Segment-Nr. **11**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 683-684;**
 Fluchttür



5 Hauptbauteile

5.3 Segmente Lärmschutz- /Schutzbauwerk

(Fortsetzung)

Segment-Nr. **12**
Länge **6,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **6,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 684-685**

Segment-Nr. **13**
Länge **8,00 m**
Anfangshöhe **4,00 m** Endhöhe **4,00 m**
Pfostenabstand **4,00 m**
Standort des Pfostens **Anliegerseitig**
Baustoff Pfosten **Stahlbeton**
Untergrund **Damm / Wall**
Baustoff Wandelement **Stahlbeton**
Fangvorrichtung
Vogelschutz
Akustische Eigenschaften, Vorsatzschale **Hochabsorbierend**
Pflanzungen auf der Verkehrsseite
Pflanzungen auf der Anliegerseite
Besichtigungsweg auf Anliegerseite **Ohne**
Bemerkung **Pfosten 685-687;
Segment mit Acrylglaselament**



5 Hauptbauteile

5.4 Statisches System / Tragfähigkeit

<u>Bauteil</u>	Gesamtes Teilbauwerk
Stat. System längs	In Längsrichtung gleichartige Bauteile
Stat. System quer	
Tragfähigkeit	Windlasten
	Maßgebende Tragfähigkeiten
Ziellastniveau	
Traglastindex	

5.5 Nachrechnung

Keine Angaben



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Wandelement - Segment Nr. 1
Hauptbaustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	

<u>Bauteil</u>	Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 1
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 1**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 1**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 1**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 1

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 2

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 2**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 2**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 2**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 2**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 2**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Wandelement - Segment Nr. 3
Hauptbaustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	

<u>Bauteil</u>	Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 3
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße
Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 3**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 3**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 3**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 3

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 4

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 4**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 4**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 4**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 4**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 4**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Wandelement - Segment Nr. 5
Hauptbaustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	

<u>Bauteil</u>	Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 5
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 5**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 5**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 5**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 5

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 6

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 6**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 6**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 6**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 6**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 6**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Wandelement - Segment Nr. 7
Hauptbaustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	

<u>Bauteil</u>	Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 7
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße
Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 7**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 7**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 7**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 7

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 8

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 8**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 8**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 8**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 8**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 8**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Wandelement - Segment Nr. 9
Hauptbaustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	

<u>Bauteil</u>	Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 9
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße
Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 9**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 9**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 9**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 9

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 10

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 10**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 10**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 10**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 10**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 10**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil **Wandelement - Segment Nr. 11**

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 11**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 11**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 11**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 11**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 11

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil Wandelement - Segment Nr. 12

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 12**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 12**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 12**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 12**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**

Bauteil **Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 12**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Bauteil **Wandelement - Segment Nr. 13**

Hauptbaustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Pfosten der Lärmschutzwand - Segment Nr. 13**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 13**

Baustoff **Stahlbeton**

Zement **Unbekannt**

Zementgehalt

Oberfläche **Sichtbeton**

Festigkeit **Festigkeitsklasse nicht bekannt**

Betonstahlgüte

Fertigteile **Ja**

Lieferfirma **unbekannt**

Zuschlagstoff

Betonzusatz

Korngröße

Konsistenz

Bauteil **Wandelement der Lärmschutzwand - Segment Nr. 13**

Baustoff **Acryl**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Wandelemente tw. mit Acrylglasflächen**

Bauteil **Absorbtionsschale der Lärmschutzwand - Segment Nr. 13**

Baustoff **Aluminium**

Lieferfirma **unbekannt**

Bemerkung **Aluminium-Lochblech mit mineralischer Dämmung, senkrecht verbaut**



5 Hauptbauteile

5.6 Baustoffe

(Fortsetzung)

<u>Bauteil</u>	Sockel der Lärmschutzwand - Segment Nr. 13
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	Sichtbeton
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Ja
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	



6 Konstruktionsteile

6.1 Vorspannungen **Keine Angaben**

6.2 Gründungen

<u>Bauteil</u>	Gesamtes Teilbauwerk
Art	Bohrpfähle über 50 cm Durchmesser
Typenbez.	Großbohrpfähle
Einbauort	
Einbaujahr	--

6.3 Erd- und Felsanker **Keine Angaben**

6.4 Brückenseile und -kabel **Keine Angaben**

6.5 Lager **Keine Angaben**

6.6 Fahrbahnübergänge **Keine Angaben**

6.7 Abdichtungen **Keine Angaben**

6.8 Kappen **Keine Angaben**

6.9 Schutzeinrichtungen **Keine Angaben**

6.10 Ausstattungen

<u>Bauteil</u>	Gesamtes Teilbauwerk
Art	Fluchttür
Einbauort	Pfosten 727/628 und 683/684

6.11 Gestaltung

<u>Bauteil</u>	Wandelement der Lärmschutzwand
Art	Acrylelemente in Wandelementen
Einbauort	Segment-Nr. 2, 4, 6, 8, 13
Bemerkung	mit Betonsockel

6.12 Leitungen **Keine Angaben**



6 Konstruktionsteile

6.13	Verfüllung von Rissen und Hohlräumen	Keine Angaben
6.14	Betonersatzsysteme	Keine Angaben
6.15	Oberflächenschutzsystem für Beton	Keine Angaben
6.16	Reaktionsharzgebundene Dünnbeläge	Keine Angaben



6 Konstruktionsteile

6.17 Baustoffe (Gründungen)

(Fortsetzung)

Konstruktionsbauteil Gesamtes Teilbauwerk

Einbauort

Bauteil	Pfahlgründung auf Bohrpfählen über 50 cm Durchmesser
Baustoff	Stahlbeton
Zement	Unbekannt
Zementgehalt	
Oberfläche	
Festigkeit	Festigkeitsklasse nicht bekannt
Betonstahlgüte	
Fertigteile	Nein
Lieferfirma	unbekannt
Zuschlagstoff	
Betonzusatz	
Korngröße	
Konsistenz	



7 Prüfung / Zustand

7.1 Prüfanweisungen

Prüfpflicht
Prüfanweisungen
Tauchereinsatz
Prüfung elektrischer Anlagen
Prüfung maschineller Anlagen
Setzungsmessung
Prüfung Lichtraumprofil

7.2 Notwendige Prüffahrzeuge, Prüfgeräte

Keine Angaben

7.3 Durchgeführte Prüfungen

Art	Datum	Zyklus	Zustand
Einfache Prüfung	03.03.2026	72 Monate	2,8
Hauptprüfung	31.01.2024	72 Monate	2,7
Einfache Prüfung	06.02.2019	72 Monate	2,4
Hauptprüfung	16.04.2018	72 Monate	2,4
Einfache Prüfung	12.11.2013	72 Monate	2,4
Hauptprüfung	19.04.2010	72 Monate	2,2

7 Prüfung / Zustand

7.4 Schäden

Lärmsch-BW

[24] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 110-13

Lärmschutz- / Schutzbauwerk, Bereichsweise, Sichtbehinderung durch Bewuchs, Straßen- und Anliegerseite, Straßenseite Berme bewachsen, Sockel teilweise nicht prüfbar, Maßnahme {1}

[26] S=0, V=0, D=0 BSP-ID 110-19

Lärmschutzwand, Stellenweise, Gefahr durch Bewuchs, Rückseite, [stellenweise Baumeinwuchs hinter Sockelelement]


- wurde saniert bei EP26, Maßnahme {1},
Bild:BÄUME ENTFERNT EP26



BÄUME ENTFERNT EP26

[27] S=1, V=0, D=3 EP BSP-ID 110-19

Pfosten der Lärmschutzwand, Rohr, Eine Stelle, Aufgewölbt, Am Anfang des Bauwerks, [Pfosten durch Frost aus stehendem Wasser verformt], zwischen Pfosten 588 und 589, Maßnahme {4}, Bild:PFOSTEN AUFGEWÖLBT EP26

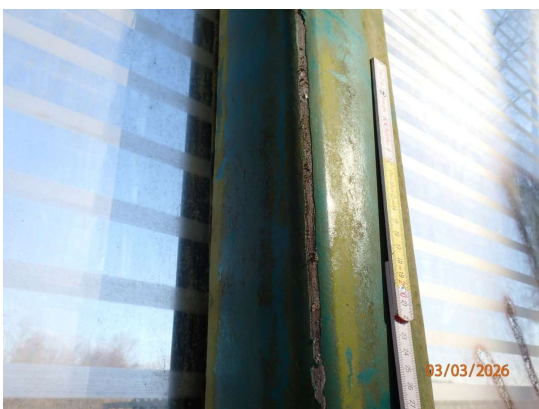

PFOSTEN AUFGEWÖLBT EP26

[17] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 111-06

Pfosten der Lärmschutzwand, Beton, Stellenweise, Abgeplatzt, Rückseite

[31] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 117-04

Pfosten der Lärmschutzwand, Mutter, Eine Stelle, Angerostet, Glaselement, im Feld zw. Pfosten 592/593, Mutter + Kontermutter, Bild:MUTTER ANGEROSTET EP26



MUTTER ANGEROSTET EP26

[34] S=0, V=0, D=3 BSP-ID 115-06

Pfosten der Lärmschutzwand, Beton, Ein Stück, Rissig, Anliegerseite, bis 0,4 mm, Längs- und Querrisse, z. T. mit Aussinterung, letzter Pfosten im Gelände RRB (vorletzter des TBWs), Bild:PFOSTEN RISSIG EP26



PFOSTEN RISSIG EP26

7 Prüfung / Zustand

7.4 Schäden

[21] S=1, V=0, D=2 BSP-ID 110-17

Pfosten der Lärmschutzwand, Pfostenverguss, Mörtel, Mehrfach, Herausgebrochen, Rückseite, Maßnahme {4}, Bild:PFOSTENVERGUSS HERAUSGEBROCHEN EP26



PFOSTENVERGUSS HERAUSGEBROCHEN EP26

[32] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 117-03

Wandelement der Lärmschutzwand, Schraube, Ein Stück, Fehlt, Anliegerseite, Unten, Glaselement, Winkel, Verankerung, letztes Feld RRB, Bild:WINKEL SCHRAUBE FEHLT EP26



WINKEL SCHRAUBE FEHLT EP26

[3] S=0, V=0, D=2 BSP-ID 110-05

Wandelement der Lärmschutzwand, Vereinzelt, Schadhaf, Vorderseite, [Alublech zerstört, Dämmung nicht vollflächig; vereinzelt mit Moosbefall; stellenweise verformt mit Loch]

[7] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 119-06

Wandelement der Lärmschutzwand, Winkel, Stellenweise, Verformt, Vorderseite, Unten, [unterer Abschlusswinkel verformt]

[30] S=0, V=0, D=0 BSP-ID 110-17

Wandelement der Lärmschutzwand, Sonstige Verbindung, Alle, An ungünstiger Stelle, [die obere Verankerung des unteren Segments sowie alle Verankerungen des oberen Segments sind nicht prüfbar, da diese durch die Alu-Lärmschutzverkleidung verdeckt sind]

[18] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 110-02

Wandelement der Lärmschutzwand, Winkel, Stellenweise, Abgeplatzte Beschichtung, Verzinkung in Ordnung, Vorder- und Rückseite, [im Bereich der Acrylelementen die unteren Haltewinkel], Bild:WINKEL BESCHICHTUNG ABGEPLATZT EP26



WINKEL BESCHICHTUNG ABGEPLATZT EP26

7 Prüfung / Zustand

7.4 Schäden

[20] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 111-04
Sockel der Lärmschutzwand, Beton, Mehrfach,
Bemoost, Beidseitig, und Nässespuren im Bereich der
Glaselemente

[25] S=0, V=0, D=2 BSP-ID 111-06
Sockel der Lärmschutzwand, Beton, Vereinzelt,
Abgeplatzt, Vorderseite, [im Bereich der Anker]

[8] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 110-07
Sockel der Lärmschutzwand, Häufig, Unterspült,
Beidseitig

[28] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 110-04
Abdeckung der Lärmschutzwand, Sonstige
Verbindung, Vereinzelt, Nicht kraftschlüssig, Oben,
[Klemmung der Abdeckbleche vor den Pfeilerköpfen:
Muttern nicht fachgerecht montiert bzw. fehlend; Lage
der Verankerung z.T. zu dicht an der Außenkante des
Pfeilers], Bild:2023H_Schaden_28



2023H_Schaden_28

Ausstattungen

[13] S=0, V=2, D=0 BSP-ID 253-12
Böschungstreppe, Bereichsweise, Bewachsen,
Rückseite, [Tür 627/628], Maßnahme {1}

[29] S=0, V=2, D=0 BSP-ID 110-16
Fluchtwegtür, Eine Stelle, Nicht funktionsfähig, Mitte
längs am Bauwerk, Tür vor dem
Regenrückhaltebecken (quer); Türabstand >500m, Tür
versiegelt

[33] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 110-02
Fluchtwegtür, Beschichtung, Teilweise, Abgeplatzt,
und angerostet, im Feld 627/628, Bild:TÜR
ANGEROSTET EP26



TÜR ANGEROSTET EP26

Beschilderung

[2] S=0, V=0, D=0 BSP-ID 250-01
Schild sonstiger Beschilderung, Größtenteils, Fehlt,
Beidseitig, nur jede 5. Stütze nummeriert und teilweise
fehlt über längere Strecke



7 Prüfung / Zustand

7.5 Bewertung

Standsicherheit (max S = 1)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils, hat jedoch keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Schadensbeseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung.

Verkehrssicherheit (max V = 2)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit; die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben. Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Böschungstreppe
- Fluchtwegtür

Dauerhaftigkeit (max D = 3)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten. Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Pfosten der Lärmschutzwand

Zustandsnote: 2,8

7.6 Empfehlungen

Maßnahmenempfehlung {4}

Art der Leistung Unterbauinstands. von Stahlbauteilen und Stahlbauverbindungen (ohne ME -E-)

Menge -- Geschätzte Kosten -- EURO

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Dringlichkeit Kurzfristig

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Projektbezeichnung

Bemerkung nach dem Ende der Frostperiode an allen Stahlpfosten an den Acrylelementen über der Fußplatte Entwässerungsbohrungen einbringen
Unterstopfung erneu

Zugeordnete Schäden:

[21], [27]

Maßnahmenempfehlung {1}

Art der Leistung Bewuchsbeseitigung (ohne ME -H-)

Menge -- Geschätzte Kosten -- EURO

Dauer der Maßnahme Ausführungsjahr

Dringlichkeit Kurzfristig

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt

Projektbezeichnung AM HAGEN

Bemerkung Fluchtwege (Treppen, Türen) zweimal jährlich freischneiden [13]
Bewuchs mit Sprengwirkung beseitigen [26]
mittelfristig: LSW rückseitig freischneiden (evtl. Fremdvergabe) [24]

Zugeordnete Schäden:

[13], [24], [26]



7 Prüfung / Zustand

7.6 Empfehlungen

(Fortsetzung)

Maßnahmenempfehlung {2}

Art der Leistung	Bauwerksnummernschild anbringen / verändern	
Menge	--	Geschätzte Kosten -- EURO
Dauer der Maßnahme		Ausführungsjahr
Dringlichkeit	Mittelfristig	
Maßnahmenfixierung	Keine Maßnahme festgelegt	
Projektbezeichnung	AM HAGEN	
Bemerkung	am Bauwerksanfang [1]	



8 Planung / Bau / Verwaltung

8.1 Entwürfe, Berechnungen

<u>Bauteil</u>	Gesamtes Teilbauwerk
Art	Datenerfassung
Aufsteller	hlm ingenieure Münster, Hindenburgplatz 72, 48143 Münster
Bearbeiter	H.Fabel
Aufstellungsjahr	2010
Bemerkungen	Auf Grundlage örtlicher Bestandsaufnahme

8.2 Verwaltungsmaßnahmen, Sondervereinbarungen

Keine Angaben

8.3 Bau- und Erhaltungsmaßnahmen

<u>Maßnahme</u>	
Art	Neubau des Teilbauwerks
Veranlassung	
Auftraggeber	
Auftragnehmer	
Auftragssumme --	Abschlags-/Abrechnungssumme --
Baubeginn	Bauende
Baujahr 1993	Ablauf der Frist für Mängelansprüche
Bauüberwachg.	



9 Sachverhalt

(Fortsetzung)

Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzkn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-KM Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/ SM	UI	OD
A 1	4609011A	4610009A	28	--	1849	--	360,190	entlang	Bund	62	04	SBV	F
A 1	4609011A	4610009A	28	1528	--	2170	--		Bund	62	04	SBV	F

Straße A 1
Lage Entlang (neben) liegend
Sachverhalt Bundesautobahn
Name FR Bremen
Unterh. zuordn. Ja

Netzzuordnung A 1

Punktobjekt: bei Station: **1849**
Von AbschNullp. **4609011A** NachAbschNullp. **4610009A** Netzknotenabsch. **28**
Kilometrierung **360,190 Km** Block-Nr. **01**

Streckenobjekt von Station **1528** nach Station **2170**
Von AbschNullp. **4609011A** NachAbschNullp. **4610009A** Netzknotenabsch. **28**
Kilometrierung Block-Nr.

Strasseninfo A 1

Amt AS Dillenburg
Meisterei AM Hagen
Anzahl Fahrstreifen **3** **Minimale Durchfahrtsbreite** **--** **Nutzbare Fahrbahnbreite** **--**
in Stat.richtung **3** **geg. Stat.richtung** **3** **--** **--**
Baulastträger Bund
UI-Partner Straßenbauverwaltung
Ortsdf./fr.Strecke Freie Strecke **Abst.v.d.Bestandsachse** **0,00 m**
Routing 1
Routing 2
Umfahrt Schwer.
Umfahrt ÖPNV
Umfahrt PKW



9 Sachverhalt

(Fortsetzung)

Verkehrsmengen A 1

DTV - Gesamt **95041**

DTV - Jahr **2015**

LKW - Anteil **14 %**

Zul. Geschw. **--**

Bemerkung **automatische Datenübernahme aus der Verkehrszählung 2**

11 Bauwerksbilder

(Fortsetzung)

SEITENANSICHT 2013



SEITENANSICHT_2018





11 Bauwerksbilder

(Fortsetzung)

SEITENANSICHT_2024





12 Sonstige Anlagen
