


Infrastruktur: **MA-Industriehafen**
Betriebsstelle: **GI 24**
Weiche-Nr.: **251 Stw**
EW 49-190-1:7,5 (H), L
Baulänge: **30.050 mm**
Verlegepl.-Nr.:
Lieferwerk:
Einbau: **SwE 2026**



Weichenmesspunkte

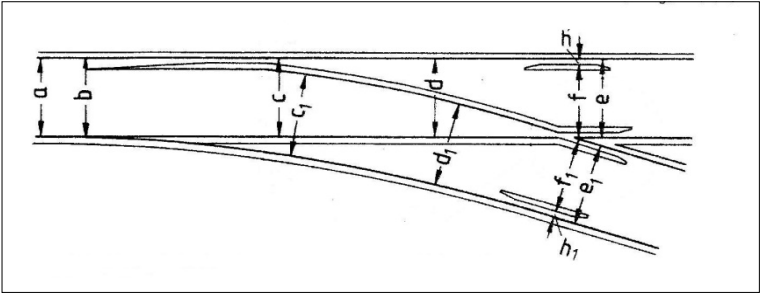

SOLLWERTE UND ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN (mm)

Spurweiten										Leitweite		Rillenweite				Datum der Prüfung/ Name Prüfender	Der ordnungsgemäße Zustand der Weiche wird bescheinigt. EBL
Weichen- anfang	Zungen- spitze	Zungenbereich (Angstlasche)		Weichenmitte		Herzstück		Weichenende				Radlenker		Herzstück			
1441	1445	1435	1441	1435	1441	1435	1441	1435	1441	1394		41	47	44	50		
10	10	10		10		8		8		4		4		4			
-3	-4	-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3			
a (sa)	b (s1)	c (s2)	c1 (s2z)	d (s3)	d1 (s3z)	e (sh)	e1 (shz)	- (se)	- (sez)	f (l)	f1 (lz)	h (-)	h1 (-)	i (h)	i1 (hz)		
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																	
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																	
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																	
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																	
Vorgefundene Mängel /erforderliche Maßnahmen:																	

Die c1/sz-Maße sind bei abzweigender Lage der Zungenvorrichtung zu messen
