


Vorhaben: **B 194 Deckenerneuerung von Poggendorf bis A 20 AS Grimmen-Ost**

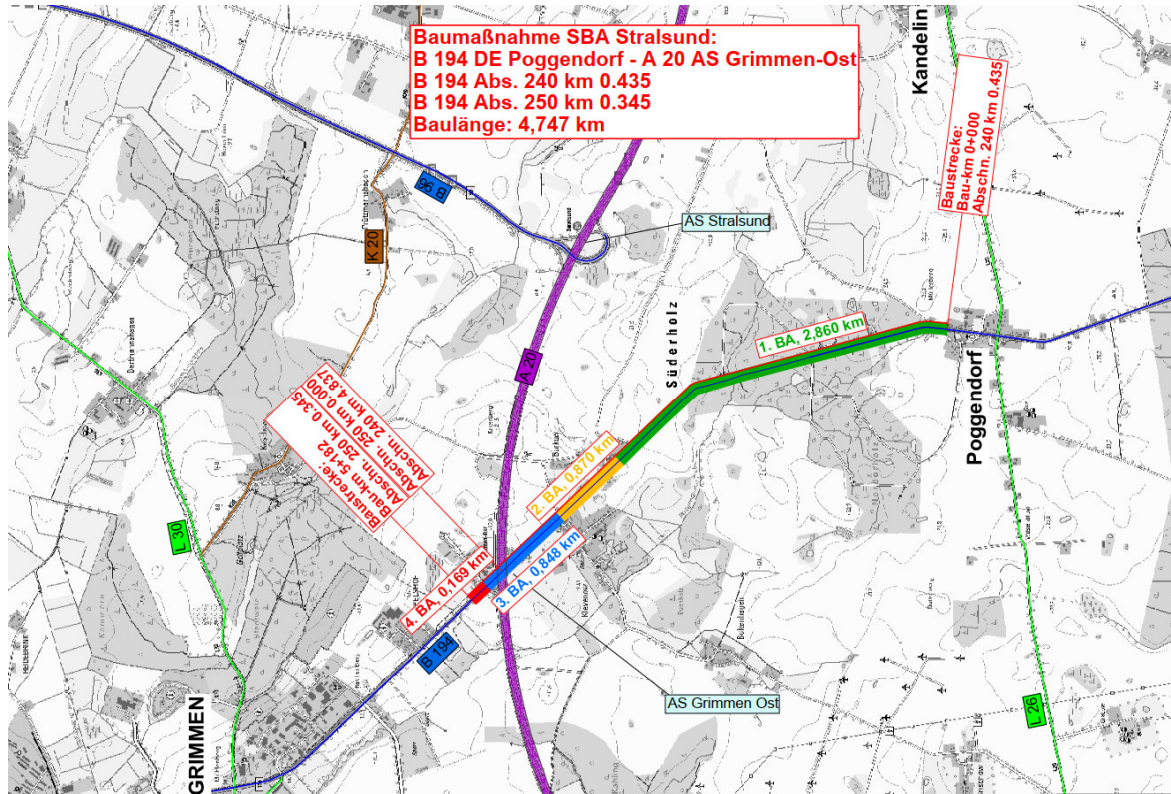

Quelle: GAJA-MV

- 1. Bauabschnitt:** Baulänge = 2,860 km
Bau-km 0+435 (= Abs. 240, km 0,435) bis
Bau-km 3+295 (= Abs. 240, km 3+295)
- 2. Bauabschnitt:** Baulänge = 0,870 km
Bau-km 3+295 (= Abs. 240 km 3,295) bis
Bau-km 4+165 (= Abs. 240 km 4,165)
- 3. Bauabschnitt:** Baulänge = 0,848 km
Bau-km 4+165, (Abs. 240 km 4,165 bis km 4+837) bis
Bau-km 5+013 (= Abs. 250 km 0,176)
- 4. Bauabschnitt:** Baulänge = 0,169 km
Bau-km 5+013 (Abs. 250 km 0,176) bis
Bau-km 5+182 (Abs. 250 km 0,345)

Grobablaufplan

1. Bauabschnitt (OA Poggendorf – OE Barkow, südl. d. Einmündung „An den Birken“)

1. Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht (12 cm)
2. Erneuerung / Profilierung der Bankette 1 m breit (Einbau eines Kantenschutzes aus Schotter BxH 50x30 cm) in Teilabschnitten
3. Erneuerung der Markierung im 1. BA
4. Bauzeit: 13.04. – 16.05.2026

2. Bauabschnitt (OE Barkow, südl. d. Einmündung „An den Birken“ – südlich der Kreuzung „An der Dorfstraße“ / „An den Kastanien“, Höhe OL Klevenow)

1. Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht (12 cm)
2. Von Bau-km 3+800 bis 3+900 ist zusätzlich die Asphalttragschicht zu erneuern.
3. Grabenverrohrung mit Teilsickerrohr DN 300 auf einer Länge von 80 m
4. Erneuerung / Profilierung der Bankette 1 m breit (Einbau eines Kantenschutzes aus Schotter BxH 50x30 cm) in Teilabschnitten
5. Erneuerung einer Bushaltestelle in Klevenow in Gussasphaltbauweise
6. Erneuerung von 20 m Betonsteinsteingosse
7. Erneuerung der Markierung im 2. BA
8. Bauzeit: 18.05. – 12.06.2026

3. Bauabschnitt (südlich der Kreuzung Höhe OL Klevenow – Kreuzung „Pommern-dreieck“, Höhe Verkehrsinsel)

1. Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht (12 cm; im Kreuzungsbereich „Pommern-dreieck“ nur Asphaltdeckschicht 4 cm),
2. Erneuerung einer Bushaltestelle am Abzweig Klevenow in Gussasphaltbauweise
3. Erneuerung von 20 m Betonsteinsteingosse
4. Erneuerung der SMA-Deckschicht (4 cm) auf der Brücke über die A20
5. Erneuerung der Induktionsschleifen
6. Erneuerung / Profilierung der Bankette 1 m breit (Einbau eines Kantenschutzes aus Schotter BxH 50x30 cm) in Teilabschnitten
7. Erneuerung der Markierung im 3. BA
8. Bauzeit: 15.06. – 03.07.2026

4. Bauabschnitt (Kreuzung „Pommern-dreieck“, Höhe Verkehrsinsel – Beginn der Allee Richtung Grimmen)

1. Erneuerung der Asphaltdeckschicht (4 cm)
2. Erneuerung der Induktionsschleifen
3. Erneuerung der Markierung im 4. BA
4. Bauzeit: 06.07. – 10.07.2026
