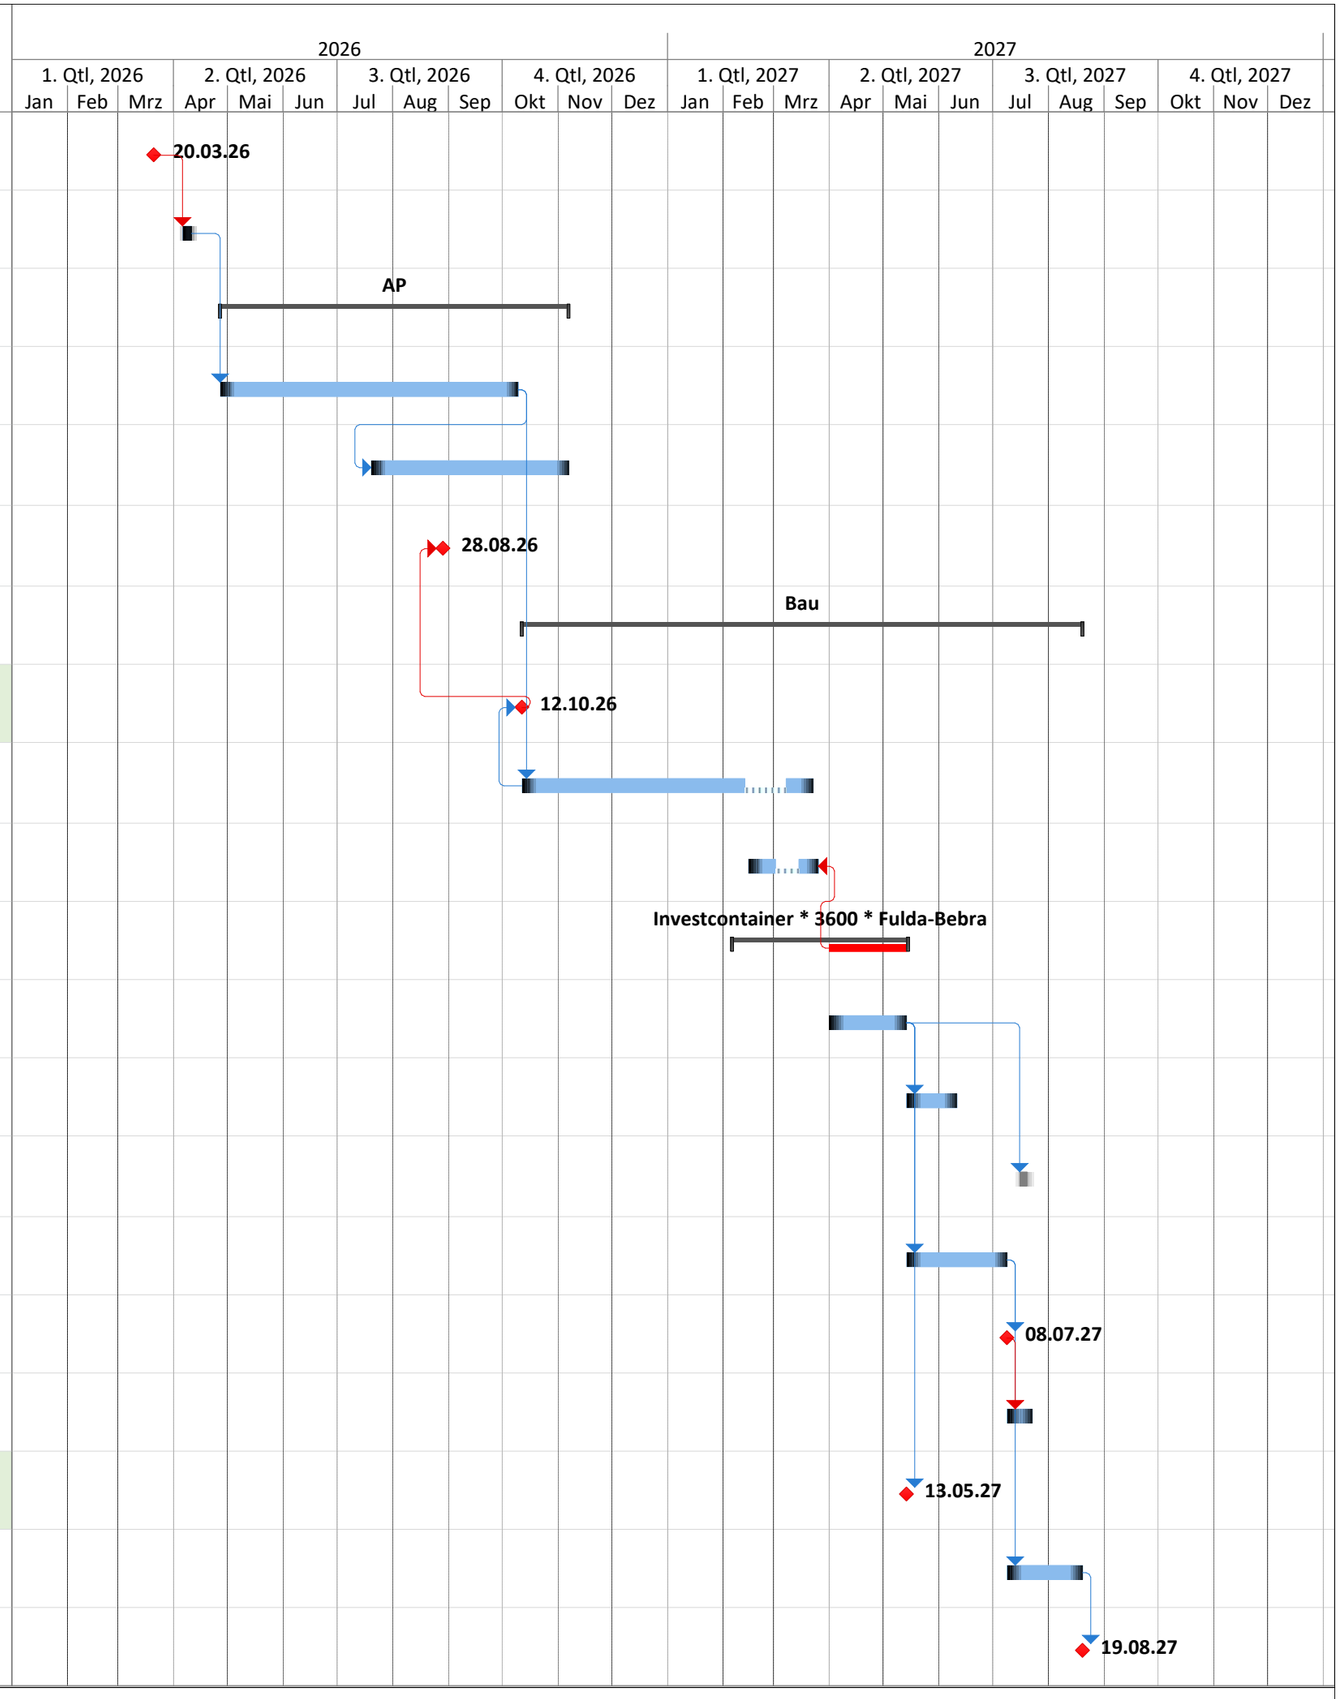Nr.	VORGANG	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
24		**Vergabe**	**20.03.26**	**20.03.26**	**0 Tage**
25		Bauauftaktgespräch mit AN einschl. Unterlagenübergabe	06.04.26	10.04.26	5 Tage
26		**Ausführungsplanung**	**27.04.26**	**06.11.26**	**140 Tage**
27		Ausführungsplanung erstellen durch den AN	27.04.26	09.10.26	120 Tage
28		Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanung und Gleichstellung	20.07.26	06.11.26	80 Tage
29		Bauvoranzeige(n) für vorlage- u. anzeigepfl. Leistungen je Gewerk b. EBA einreichen / Antrag auf IBG	03.08.26	28.08.26	20 Tage
30		**Realisierung**	**12.10.26**	**19.08.27**	**224 Tage**
31	**6.20.010**	**Baubeginn (baubetrieblich)**	**12.10.26**	**12.10.26**	**0 Tage**
32		Herstellung und Anlieferung Betonfertigteile und Stahlüberbauten	12.10.26	22.03.27	101 Tage
33		BE und Vorarbeiten	15.02.27	25.03.27	20 Tage
34		**Investcontainer * 3600 * Fulda-Bebra**	**06.02.27**	**14.05.27**	**71 Tage**
35		**TSP für Ersatzneubau EÜ**	01.04.27	13.05.27	31 Tage
36		Außenanlagen / Restarbeiten	14.05.27	10.06.27	20 Tage
37		*Belastungsstopfgänge werden vom Container-Projekt-Gleisbau erbracht*	*16.07.27*	*19.07.27*	*2 Tage*
38		Bestandsunterlagen	14.05.27	08.07.27	40 Tage
39		Bw-Prüfung vor VOB-Abnahme	08.07.27	08.07.27	0 Tage
40		Restarbeiten Bau / Mängelbeseitigung	09.07.27	22.07.27	10 Tage
41	**7.30.070**	**Inbetriebnahme EÜ**	**13.05.27**	**13.05.27**	**0 Tage**
42		Bestandsplanrückführung	09.07.27	19.08.27	30 Tage
43		VOB-Abnahme	19.08.27	19.08.27	0 Tage
