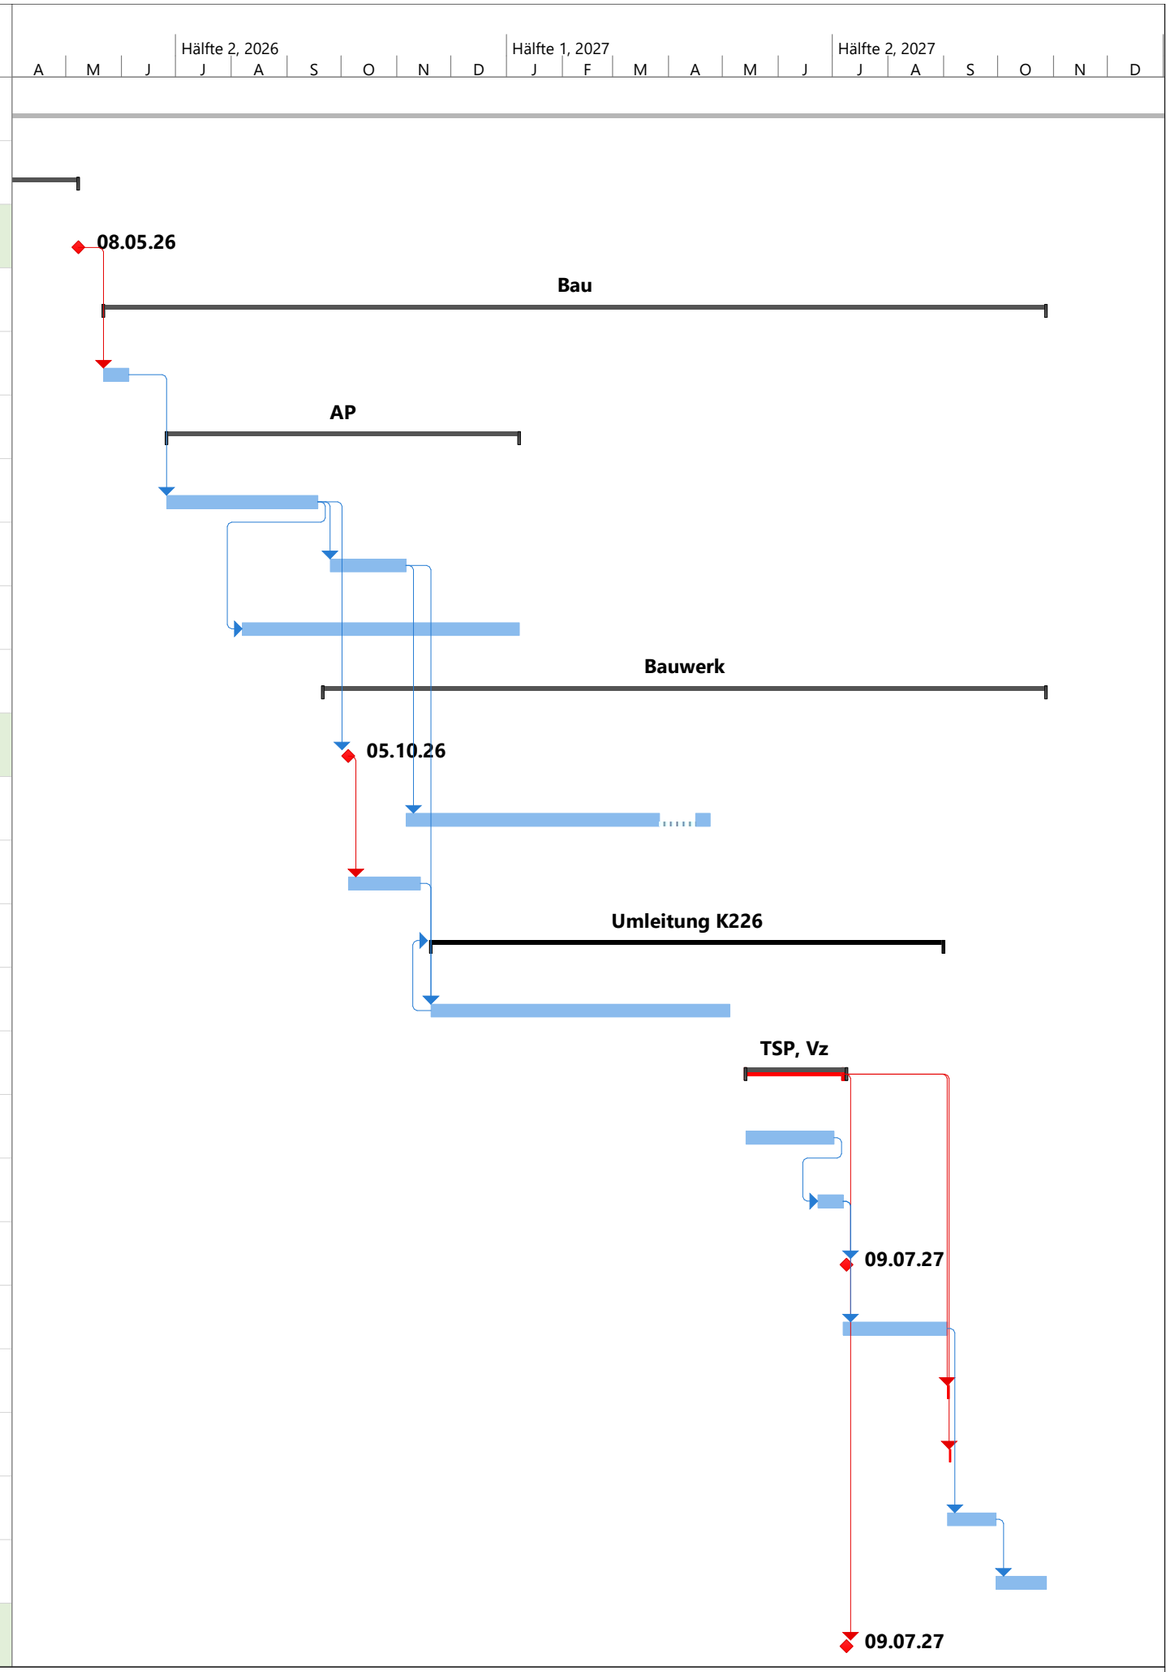Nr.	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0		**Projektterminplan - EÜ Gemeindeweg und Laubach**	**2599 Tage**	**21.01.19**	**03.01.29**
58		**Ausschreibung und Vergabe**	**394 Tage**	**04.11.24**	**08.05.26**
66	**4.30.060**	**Verträge AP/Bau/Ausrüstung abgeschlossen**	**0 Tage**	**08.05.26**	**08.05.26**
67		**Bauausführung einschl.AP**	**375 Tage**	**22.05.26**	**27.10.27**
68		**Bauauftaktgespräch mit AN einschl. Unterlagenübergabe**	**10 Tage**	**22.05.26**	**04.06.26**
69		**Ausführungsplanung**	**140 Tage**	**26.06.26**	**07.01.27**
70		Ausführungsplanung (für 1. Planpaket - Verbau + Fertigteile)	60 Tage	26.06.26	17.09.26
71		Freigabe 1.Planpaket durch PSV, BVB, PL	30 Tage	25.09.26	05.11.26
72		Ausführungsplanung komplettes Bauwerk, einschl. Freigabe	110 Tage	07.08.26	07.01.27
74		**Bauausführung**	**289 Tage**	**21.09.26**	**27.10.27**
76	**6.20.010**	**Baubeginn (physisch)**	**0 Tage**	**05.10.26**	**05.10.26**
77		Herstellung Fertigteile und Anlieferung	107 Tage	06.11.26	23.04.27
78		BE und Vorarbeiten	30 Tage	05.10.26	13.11.26
79		**Sperrung der K 226 (Haarthstraße + Talweg)**	**285 fTage**	**20.11.26**	**01.09.27**
80		Verbau (DB-Profilfrei), Baugrube und Rahmenbauwerke	118 Tage	20.11.26	04.05.27
81		**Streckensperrung *6343* TSP, Vz (56 x 24 h = 1344 h)**	**56 fTage**	**14.05.27**	**09.07.27**
82		Verbau, Baugrube und Verschubbahnen Bahnbereich, Einschub / Einheben der Brückenteile und Verfüllung	49 fTage	14.05.27	02.07.27
83		Oberbau-Lückenschluss und Streckenfreigabe	14 fTage	23.06.27	07.07.27
84		**Späteste Freigabe Strecke 6343**	**0 Tage**	**09.07.27**	**09.07.27**
85		Schrägflügel, Verfüllung, Restarbeiten -- DB-Profilfrei	42 Tage	07.07.27	02.09.27
86		**ESP 1 x 6h : Stopfarbeiten**	**1 fTag**	**03.09.27**	**04.09.27**
87		**ESP 1 x 6h : Stopfarbeiten**	**1 fTag**	**04.09.27**	**05.09.27**
88		Bestandsplanübergabe an BÜB und PL	20 Tage	03.09.27	29.09.27
89		Bauabnahmen / Mägelbeseitigung	20 Tage	30.09.27	27.10.27
90	**7.30.070**	**Inbetriebnahme erfolgt**	**0 Tage**	**09.07.27**	**09.07.27**
