HP Geeste
Neubau Bahnsteige und Zuwegungen

Stand 05.11.2025
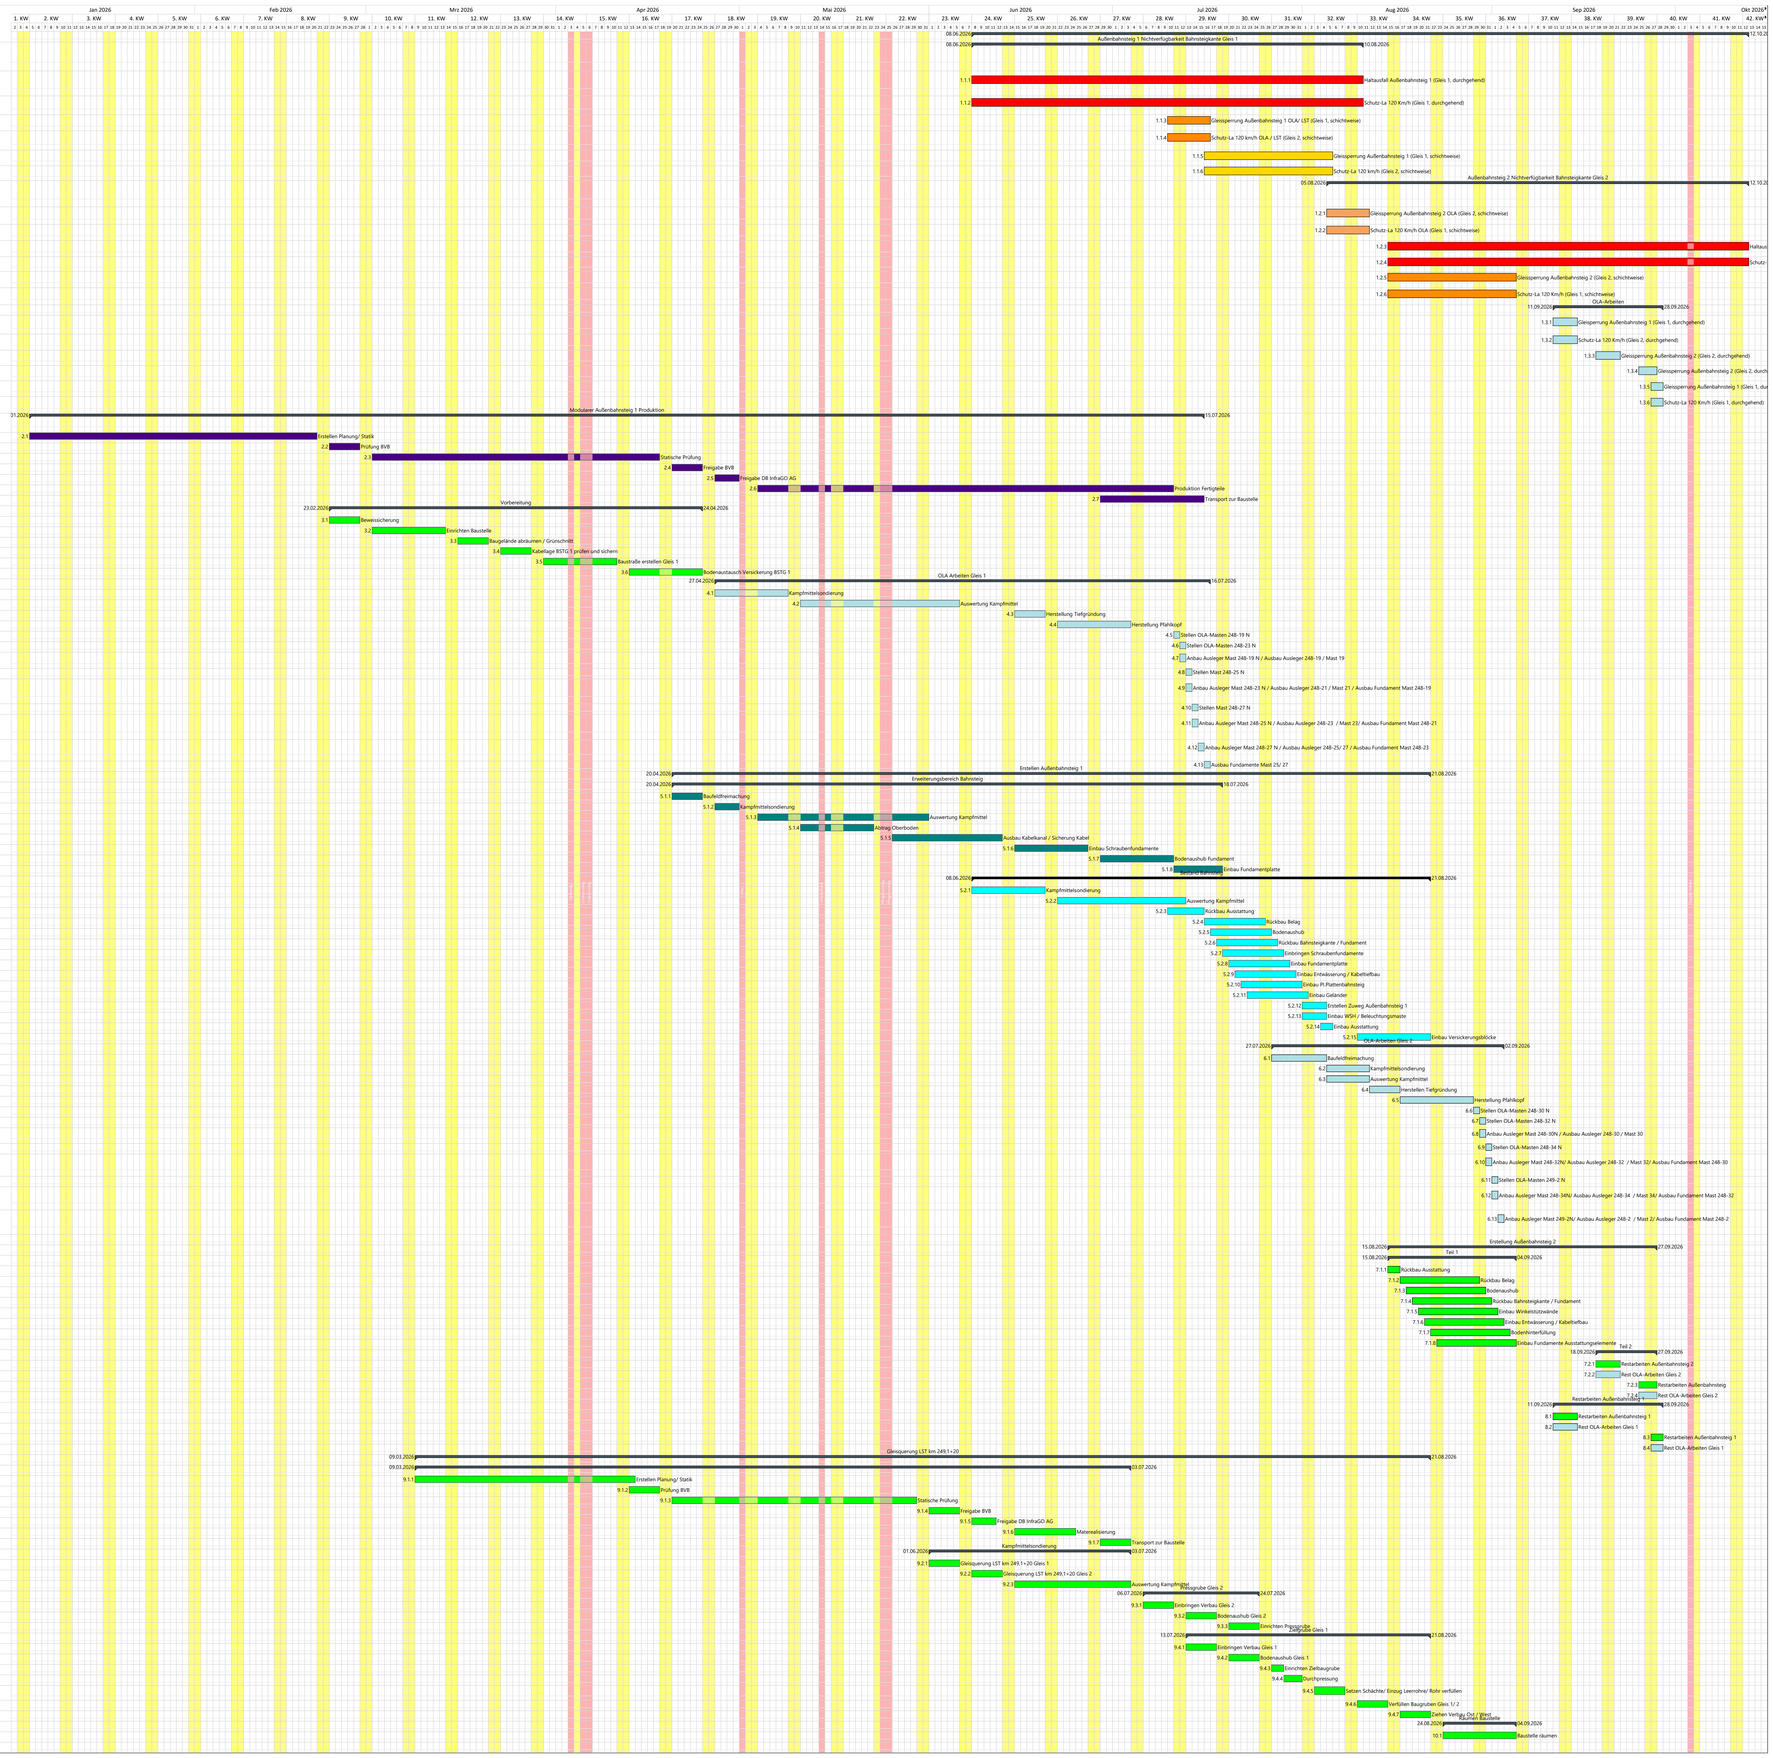
Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer	Bemerkungen
1	**Sperrpausen**	Mo, 08.06.26	Mo, 12.10.26	127 Tage	
1.1	**Außenbahnsteig 1 Nichtverfügbarkeit Bahnsteigkante Gleis 1**	Mo, 08.06.26	Mo, 10.08.26	64 Tage	
1.1.1	Hafausfall Außenbahnsteig 1 (Gleis 1, durchgehend)	Mo, 08.06.26	Mo, 10.08.26	64 Tage	Bf Meppen - Abzw. Holtausen
1.1.2	Schutz-La 120 Km/h (Gleis 1, durchgehend)	Mo, 08.06.26	Mo, 10.08.26	64 Tage	Bf Meppen - Abzw. Holtausen
1.1.3	Gleissperrung Außenbahnsteig 1 OLA/ LST (Gleis 1, schichtweise)	Fr, 10.07.26	Do, 16.07.26	7 Tage	Bf Meppen - Abzw. Holtausen; 6x6h LST / OLA -Arbeiten
1.1.4	Schutz-La 120 km/h OLA / LST (Gleis 2, schichtweise)	Fr, 10.07.26	Do, 16.07.26	7 Tage	
1.1.5	Gleissperrung Außenbahnsteig 1 (Gleis 1, schichtweise)	Do, 16.07.26	Mi, 05.08.26	21 Tage	Bf Meppen - Abzw. Holtausen; 20x6H; BSTG1-Arbeiten
1.1.6	Schutz-La 120 km/h (Gleis 2, schichtweise)	Do, 16.07.26	Mi, 05.08.26	21 Tage	
1.2	**Außenbahnsteig 2 Nichtverfügbarkeit Bahnsteigkante Gleis 2**	Mi, 05.08.26	Mo, 12.10.26	69 Tage	
1.2.1	Gleissperrung Außenbahnsteig 2 OLA (Gleis 2, schichtweise)	Mi, 05.08.26	Di, 11.08.26	7 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen: 6x6h; LST / OLA-Arbeiten
1.2.2	Schutz-La 120 Km/h OLA (Gleis 1, schichtweise)	Mi, 05.08.26	Di, 11.08.26	7 Tage	
1.2.3	Hafausfall Außenbahnsteig 2 (Gleis 2, durchgehend)	Sa, 15.08.26	Mo, 12.10.26	59 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen
1.2.4	Schutz-La 120 Km/h (Gleis 2, durchgehend)	Sa, 15.08.26	Mo, 12.10.26	59 Tage	
1.2.5	Gleissperrung Außenbahnsteig 2 (Gleis 2, schichtweise)	Sa, 15.08.26	Fr, 04.09.26	21 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen: 20x6h;BSTG 2-Arbeiten
1.2.6	Schutz-La 120 Km/h (Gleis 1, schichtweise)	Sa, 15.08.26	Fr, 04.09.26	21 Tage	
1.3	**OLA-Arbeiten**	Fr, 11.09.26	Mo, 28.09.26	18 Tage	
1.3.1	Gleissperrung Außenbahnsteig 1 (Gleis 1, durchgehend)	Fr, 11.09.26	Mo, 14.09.26	4 Tage	Bf Meppen-Abzw. Holthausen: 53 h durchgehend
1.3.2	Schutz-La 120 Km/h (Gleis 2, durchgehend)	Fr, 11.09.26	Mo, 14.09.26	4 Tage	
1.3.3	Gleissperrung Außenbahnsteig 2 (Gleis 2, durchgehend)	Fr, 18.09.26	Mo, 21.09.26	4 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen: 53h;
1.3.4	Gleissperrung Außenbahnsteig 2 (Gleis 2, durchgehend)	Fr, 25.09.26	So, 27.09.26	3 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen: 26,5h;
1.3.5	Gleissperrung Außenbahnsteig 1 (Gleis 1, durchgehend)	So, 27.09.26	Mo, 28.09.26	2 Tage	Bf Meppen - Abzw. Holtausen: 26,5h
1.3.6	Schutz-La 120 Km/h (Gleis 1, durchgehend)	So, 27.09.26	Mo, 28.09.26	2 Tage	Abzw. Holthausen - Bf Meppen
2	**Modularer Außenbahnsteig 1 Produktion**	Mo, 05.01.26	Mi, 15.07.26	192 Tage	
2.1	Erstellen Planung/ Statik	Mo, 05.01.26	Fr, 20.02.26	47 Tage	
2.2	Prüfung BVB	Mo, 23.02.26	Fr, 27.02.26	5 Tage	
2.3	Statische Prüfung	Mo, 02.03.26	Fr, 17.04.26	47 Tage	
2.4	Freigabe BVB	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26	5 Tage	
2.5	Freigabe DB InfraGO AG	Mo, 27.04.26	Do, 30.04.26	4 Tage	
2.6	Produktion Fertigteile	Mo, 04.05.26	Fr, 10.07.26	68 Tage	
2.7	Transport zur Baustelle	Mo, 29.06.26	Mi, 15.07.26	17 Tage	
3	**Vorbereitung**	Mo, 23.02.26	Fr, 24.04.26	61 Tage	
3.1	Beweissicherung	Mo, 23.02.26	Fr, 27.02.26	5 Tage	
3.2	Einrichten Baustelle	Mo, 02.03.26	Fr, 13.03.26	12 Tage	
3.3	Baugelände abräumen / Grünschnitt	Mo, 16.03.26	Fr, 20.03.26	5 Tage	
3.4	Kabellage BSTG 1 prüfen und sichern	Mo, 23.03.26	Fr, 27.03.26	5 Tage	Entlang der Strecke
3.5	Baustraße erstellen Gleis 1	Mo, 30.03.26	Fr, 10.04.26	12 Tage	
3.6	Bodenaustausch Versickerung BSTG 1	Mo, 13.04.26	Fr, 24.04.26	12 Tage	
4	**OLA Arbeiten Gleis 1**	Mo, 27.04.26	Do, 16.07.26	81 Tage	4 OLA Masten Gründung Maste stellen
4.1	Kampfmittelsondierung	Mo, 27.04.26	Fr, 08.05.26	12 Tage	
4.2	Auswertung Kampfmittel	Mo, 11.05.26	Fr, 05.06.26	26 Tage	
4.3	Herstellung Tiefgründung	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26	5 Tage	
4.4	Herstellung Pfahlkopf	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26	12 Tage	
4.5	Stellen OLA-Masten 248-19 N	Sa, 11.07.26	Sa, 11.07.26	1 Tag	
4.6	Stellen OLA-Masten 248-23 N	So, 12.07.26	So, 12.07.26	1 Tag	
4.7	Anbau Ausleger Mast 248-19 N / Ausbau Ausleger 248-19 / Mast 19	So, 12.07.26	So, 12.07.26	1 Tag	
4.8	Stellen Mast 248-25 N	Mo, 13.07.26	Mo, 13.07.26	1 Tag	
4.9	Anbau Ausleger Mast 248-23 N / Ausbau Ausleger 248-21 / Mast 21 / Ausbau Fundament Mast 248-19	Mo, 13.07.26	Mo, 13.07.26	1 Tag	
4.10	Stellen Mast 248-27 N	Di, 14.07.26	Di, 14.07.26	1 Tag	
4.11	Anbau Ausleger Mast 248-25 N / Ausbau Ausleger 248-23 / Mast 23/ Ausbau Fundament Mast 248-21	Di, 14.07.26	Di, 14.07.26	1 Tag	
4.12	Anbau Ausleger Mast 248-27 N / Ausbau Ausleger 248-25/ 27 / Ausbau Fundament Mast 248-23	Mi, 15.07.26	Mi, 15.07.26	1 Tag	
4.13	Ausbau Fundamente Mast 25/ 27	Do, 16.07.26	Do, 16.07.26	1 Tag	
5	**Erstellen Außenbahnsteig 1**	Mo, 20.04.26	Fr, 21.08.26	124 Tage	
5.1	**Erweiterungsbereich Bahnsteig**	Mo, 20.04.26	Sa, 18.07.26	90 Tage	
5.1.1	Baufeldfreimachung	Mo, 20.04.26	Fr, 24.04.26	5 Tage	Grünschnitt / Bäume fällen
5.1.2	Kampfmittelsondierung	Mo, 27.04.26	Do, 30.04.26	4 Tage	
5.1.3	Auswertung Kampfmittel	Mo, 04.05.26	So, 31.05.26	28 Tage	
5.1.4	Abtrag Oberboden	Mo, 11.05.26	Fr, 22.05.26	12 Tage	
5.1.5	Ausbau Kabelkanal / Sicherung Kabel	Di, 26.05.26	Fr, 12.06.26	18 Tage	
5.1.6	Einbau Schraubenfundamente	Mo, 15.06.26	Fr, 26.06.26	12 Tage	
5.1.7	Bodenaushub Fundament	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26	12 Tage	
5.1.8	Einbau Fundamentplatte	Sa, 11.07.26	Sa, 18.07.26	8 Tage	
5.2	**Bestand Bahnsteig**	Mo, 08.06.26	Fr, 21.08.26	75 Tage	
5.2.1	Kampfmittelsondierung	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	12 Tage	
5.2.2	Auswertung Kampfmittel	Mo, 22.06.26	So, 12.07.26	21 Tage	
5.2.3	Rückbau Ausstattung	Fr, 10.07.26	Mi, 15.07.26	6 Tage	
5.2.4	Rückbau Belag	Do, 16.07.26	Sa, 25.07.26	10 Tage	
5.2.5	Bodenaushub	Fr, 17.07.26	So, 26.07.26	10 Tage	
5.2.6	Rückbau Bahnsteigkante / Fundament	Sa, 18.07.26	Mo, 27.07.26	10 Tage	
5.2.7	Einbringen Schraubenfundamente	So, 19.07.26	Di, 28.07.26	10 Tage	
5.2.8	Einbau Fundamentplatte	Mo, 20.07.26	Mi, 29.07.26	10 Tage	
5.2.9	Einbau Entwässerung / Kabeltiefbau	Di, 21.07.26	Do, 30.07.26	10 Tage	
5.2.10	Einbau Pl.Plattenbahnsteig	Mi, 22.07.26	Fr, 31.07.26	10 Tage	
5.2.11	Einbau Geländer	Do, 23.07.26	Sa, 01.08.26	10 Tage	
5.2.12	Erstellen Zuweg Außenbahnsteig 1	Sa, 01.08.26	Di, 04.08.26	4 Tage	
5.2.13	Einbau WSH / Beleuchtungsmaste	Sa, 01.08.26	Di, 04.08.26	4 Tage	
5.2.14	Einbau Ausstattung	Di, 04.08.26	Mi, 05.08.26	2 Tage	
5.2.15	Einbau Versickerungsblöcke	Mo, 10.08.26	Fr, 21.08.26	12 Tage	
6	**OLA-Arbeiten Gleis 2**	Mo, 27.07.26	Mi, 02.09.26	38 Tage	
6.1	Baufeldfreimachung	Mo, 27.07.26	Di, 04.08.26	9 Tage	
6.2	Kampfmittelsondierung	Mi, 05.08.26	Di, 11.08.26	7 Tage	Mast 248-30 o.G / Mast 248-32 m.G/ Mast 248-34 m.G / Mast 249-2 o.G
6.3	Auswertung Kampfmittel	Mi, 05.08.26	Di, 11.08.26	7 Tage	Kleingerät m.G / Rückbau Geländer
6.4	Herstellen Tiefgründung	Mi, 12.08.26	So, 16.08.26	5 Tage	
6.5	Herstellung Pfahlkopf	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26	12 Tage	
6.6	Stellen OLA-Masten 248-30 N	Sa, 29.08.26	Sa, 29.08.26	1 Tag	
6.7	Stellen OLA-Masten 248-32 N	So, 30.08.26	So, 30.08.26	1 Tag	
6.8	Anbau Ausleger Mast 248-30N / Ausbau Ausleger 248-30 / Mast 30	So, 30.08.26	So, 30.08.26	1 Tag	
6.9	Stellen OLA-Masten 248-34 N	Mo, 31.08.26	Mo, 31.08.26	1 Tag	
6.10	Anbau Ausleger Mast 248-32N/ Ausbau Ausleger 248-32 / Mast 32/ Ausbau Fundament Mast 248-30	Mo, 31.08.26	Mo, 31.08.26	1 Tag	
6.11	Stellen OLA-Masten 249-2 N	Di, 01.09.26	Di, 01.09.26	1 Tag	
6.12	Anbau Ausleger Mast 248-34N/ Ausbau Ausleger 248-34 / Mast 34/ Ausbau Fundament Mast 248-32	Di, 01.09.26	Di, 01.09.26	1 Tag	
6.13	Anbau Ausleger Mast 249-2N/ Ausbau Ausleger 248-2 / Mast 2/ Ausbau Fundament Mast 248-2	Mi, 02.09.26	Mi, 02.09.26	1 Tag	
6.14	Stellen OLA Maste				
7	**Erstellung Außenbahnsteig 2**	Sa, 15.08.26	So, 27.09.26	44 Tage	
7.1	**Teil 1**	Sa, 15.08.26	Fr, 04.09.26	21 Tage	
7.1.1	Rückbau Ausstattung	Sa, 15.08.26	So, 16.08.26	2 Tage	
7.1.2	Rückbau Belag	Mo, 17.08.26	Sa, 29.08.26	13 Tage	
7.1.3	Bodenaushub	Di, 18.08.26	So, 30.08.26	13 Tage	
7.1.4	Rückbau Bahnsteigkante / Fundament	Mi, 19.08.26	Mo, 31.08.26	13 Tage	
7.1.5	Einbau Winkelstützwände	Do, 20.08.26	Di, 01.09.26	13 Tage	
7.1.6	Einbau Entwässerung / Kabeltiefbau	Fr, 21.08.26	Mi, 02.09.26	13 Tage	Vollständig wenn Maste rückgebaut sind
7.1.7	Bodenhinterfüllung	Sa, 22.08.26	Do, 03.09.26	13 Tage	
7.1.8	Einbau Fundamente Ausstattungselemente	So, 23.08.26	Fr, 04.09.26	13 Tage	
7.2	**Teil 2**	Fr, 18.09.26	So, 27.09.26	10 Tage	
7.2.1	Restarbeiten Außenbahnsteig 2	Fr, 18.09.26	Mo, 21.09.26	4 Tage	
7.2.2	Rest OLA-Arbeiten Gleis 2	Fr, 18.09.26	Mo, 21.09.26	4 Tage	
7.2.3	Restarbeiten Außenbahnsteig	Fr, 25.09.26	So, 27.09.26	3 Tage	
7.2.4	Rest OLA-Arbeiten Gleis 2	Fr, 25.09.26	So, 27.09.26	3 Tage	
8	**Restarbeiten Außenbahnsteig 1**	Fr, 11.09.26	Mo, 28.09.26	18 Tage	
8.1	Restarbeiten Außenbahnsteig 1	Fr, 11.09.26	Mo, 14.09.26	4 Tage	
8.2	Rest OLA-Arbeiten Gleis 1	Fr, 11.09.26	Mo, 14.09.26	4 Tage	
8.3	Restarbeiten Außenbahnsteig 1	So, 27.09.26	Mo, 28.09.26	2 Tage	
8.4	Rest OLA-Arbeiten Gleis 1	So, 27.09.26	Mo, 28.09.26	2 Tage	
9	**Gleisquerung LST km 249,1+20**	Mo, 09.03.26	Fr, 21.08.26	166 Tage	
9.1	**Vorarbeiten**	Mo, 09.03.26	Fr, 03.07.26	117 Tage	
9.1.1	Erstellen Planung/ Statik	Mo, 09.03.26	Mo, 13.04.26	36 Tage	
9.1.2	Prüfung BVB	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26	5 Tage	
9.1.3	Statische Prüfung	Mo, 20.04.26	Fr, 29.05.26	40 Tage	
9.1.4	Freigabe BVB	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage	
9.1.5	Freigabe DB InfraGO AG	Mo, 08.06.26	Do, 11.06.26	4 Tage	
9.1.6	Materialisierung	Mo, 15.06.26	Mi, 24.06.26	10 Tage	
9.1.7	Transport zur Baustelle	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26	5 Tage	
9.2	**Kampfmittelsondierung**	Mo, 01.06.26	Fr, 03.07.26	33 Tage	
9.2.1	Gleisquerung LST km 249,1+20 Gleis 1	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage	Außerhalb Gefahrenbereich
9.2.2	Gleisquerung LST km 249,1+20 Gleis 2	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26	5 Tage	Außerhalb Gefahrenbereich
9.2.3	Auswertung Kampfmittel	Mo, 15.06.26	Fr, 03.07.26	19 Tage	
9.3	**Pressgrube Gleis 2**	Mo, 06.07.26	Fr, 24.07.26	19 Tage	
9.3.1	Einbringen Verbau Gleis 2	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26	5 Tage	
9.3.2	Bodenaushub Gleis 2	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26	5 Tage	
9.3.3	Einrichten Pressgrube	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	5 Tage	
9.4	**Zielgrube Gleis 1**	Mo, 13.07.26	Fr, 21.08.26	40 Tage	
9.4.1	Einbringen Verbau Gleis 1	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26	5 Tage	
9.4.2	Bodenaushub Gleis 1	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	5 Tage	
9.4.3	Einrichten Zielbaugrube	Mo, 27.07.26	Di, 28.07.26	2 Tage	
9.4.4	Durchpressung	Mi, 29.07.26	Fr, 31.07.26	3 Tage	
9.4.5	Setzen Schächte/ Einzug Leerrohre/ Rohr verfüllen	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26	5 Tage	
9.4.6	Verfüllen Baugruben Gleis 1/ 2	Mo, 10.08.26	Fr, 14.08.26	5 Tage	
9.4.7	Ziehen Verbau Ost / West	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26	5 Tage	
10	**Räumen Baustelle**	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	12 Tage	
10.1	Baustelle räumen	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	12 Tage	
11
