Baustellennr.: 2022060

Strecke: 6651 Zwotental–Klingenthal

Baustelle: Awanst Klingenthal, Weichenerneuerungen Weichen 945 und 973, Schwellenauswechslung Gl. 1, Schwellenauswechslung EÜ über die Zwota

Stand: 14.11.2025

Bearbeiter: H. Jaekel

SOG





Sperrung (Umbaugleis)	Datum	Uhrzeit
	21.04.2026	12 / 24
	22.04.2026	12 / 24
	23.04.2026	12 / 24
	24.04.2026	12 / 24
	25.04.2026	12 / 24
	26.04.2026	12 / 24
	27.04.2026	12 / 24 / 6

Baustelleneinrichtung, Entladung Weichen und Gleisschwellen, Herstellung Baustraßen Weichenvormontage

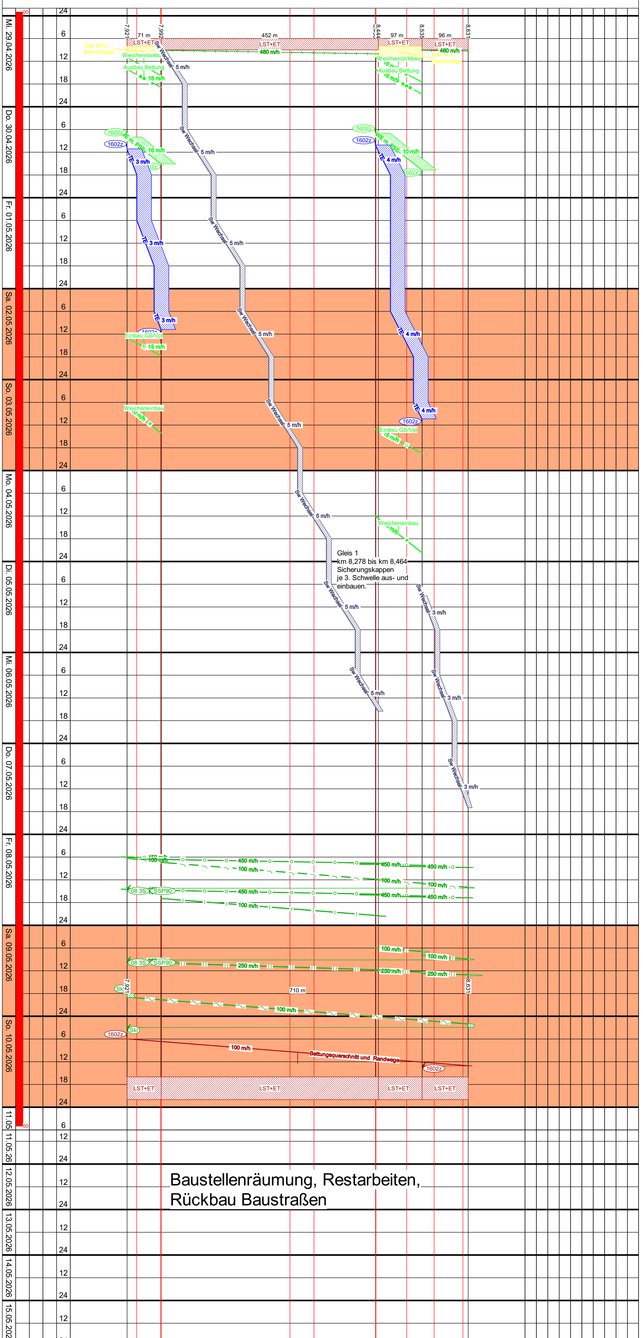

Baustellenräumung, Restarbeiten, Rückbau Baustraßen

Name	Anzahl

Legende:

- Weichen Ausbau Bettung
- 01_RAP_Entwässerung
- Weichenheizung
- LST Arbeiten
- 01_RAP_WE_PSS
- Weichenlokkabu
- Weichen Einbau GS 1/9
- Weichenenbau
- Verfüllen, Schotterzug Talb.Wg
- Stopfen,Unimat 08,verdichten B-Sw
- Stopfen,Unimat 08, II Stabi, B-Sw
- Stopfen,Unimat 08, I Stabi, B-Sw
- 03_Bettungsquerschnitt_Randwege_Kabelgraben
- Schwellen 120 m
- 01_RAP_Sw_Wechsel
- Si trennen,v Hz_+120m Si 2xSi

Baustellennr.:	2022060
Strecke:	6651 Zwotental–Klingenthal
Baustelle:	Awanst Klingenthal, Weichenerneuerungen Weichen 945 und 973, Schwellenauswechslung Gl. 1, Schwellenauswechslung EÜ über die Zwota

BS:	Bauüberwachung:	Rahmenplan erstellt:	Aufgestellt von:
	Bauleitung:	Ing.- Büro Tiedt GmbH Fuldaer Straße 28 36282 Hauneck	
Auftrags-Kurznr.:			
Oberbauanordnung Alt: W 945 EW 49-190-1:9 St Gl 1 W49 - B70 2.4 - 1588 W 973 EW 49-300-1:9 St Brücke über die Zwota W49 - B90 - 1667 u. W49 - B 93 - 1667			
bzw. Weichenart/-form Neu: W 945 EW 49-190-1:9 B Gl 1 W49 - B70 2.4 - 1538 W 973 EW 49-300-1:9 B Brücke über die Zwota W49 - B90 - 1667 u. W49 - B 93 - 1667			
Arbeitsverfahren: Weichen mit EDK Schwellenauswechslung in Einzelstoffen		Bearbeitungsvermerk des Unternehmers Bearbeitet: H. Jaekel	Zugestimmt:
Betriebsart:		Gezeichnet:	
Ausführung vom 28.04.2026 bis zum 11.05.2026		Geprüft:	
durch		Maßstab:	

erstellt mit SOG 7.0.0.1034
