BV Besucherzentrum Indeland
TERMINPLAN (Vorabzug)

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1			1 Tag	Die 28.03.23	Die 28.03.23	
2		**Vergabe Planungsleistungen**	**215 Tage**	**Die 28.03.23**	**Mon 29.01.24**	
15		**Planungsleistungen LP 2-5**	**538 Tage**	**Mit 05.04.23**	**Die 20.05.25**	
74		**LP 6 - LV Erstellung**	**154 Tage**	**Fre 11.04.25**	**Fre 21.11.25**	
98		**LP 7 - Vergabeverfahren**	**120 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Mon 08.12.25**	**80**
136		**Vorläufe/Bestellzeiten**	**93 Tage**	**Mit 24.09.25**	**Don 12.02.26**	
149		**Bauablauf**	**274 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Don 05.11.26**	
150		Baubeginn	0 Tage	Mit 08.10.25	Mit 08.10.25	138
151		**Erdarbeiten**	**15 Tage**	**Don 09.10.25**	**Mit 29.10.25**	**150**
155		**Rohbauarbeiten**	**48 Tage**	**Don 30.10.25**	**Don 15.01.26**	**154**
176		Abdichtung Bodenplatte durch Dachdecker	5 Tage	Die 13.01.26	Mon 19.01.26	173
177		Puffer (abh. V. Vorlauf Holzbautermin)	15 Tage	Die 20.01.26	Mon 09.02.26	176
178		**Zimmer- und Holzbauarbeiten**	**20 Tage**	**Don 12.02.26**	**Don 12.03.26**	**176**
181		**Fassaden- und Metallbauarbeiten**	**161 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 29.05.26**	
191		**ELT (vor baudicht)**	**3 Tage**	**Fre 13.03.26**	**Die 17.03.26**	
193		**Dachabdichtungs- und Dachdeckerarbeiten**	**83 Tage**	**Mit 18.03.26**	**Mon 20.07.26**	
199		Baudicht	0 Tage	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26	194;188
200		**weitere Bauleistungen (nach baudicht)**	**136 Tage**	**Fre 24.04.26**	**Don 05.11.26**	
201		**Schlosserarbeiten**	**68 Tage**	**Die 28.04.26**	**Mit 05.08.26**	
210		**Außenanlagen**	**83 Tage**	**Fre 24.04.26**	**Mon 24.08.26**	
218		**Trockenbauarbeiten**	**45 Tage**	**Don 07.05.26**	**Mon 13.07.26**	
219		Wände einseitig herstellen	10 Tage	Don 07.05.26	Don 21.05.26	199
220		Wände schliessen	10 Tage	Die 30.06.26	Mon 13.07.26	227;223
221		**HKLS Gewerk**	**108 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Mon 12.10.26**	
222		HKLS Rohinstallationen	9 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	219EA-8 Tage
223		HKLS Rohinstallationen in Wänden	25 Tage	Fre 22.05.26	Mon 29.06.26	219
224		HKLS Fertiginstallation	20 Tage	Die 15.09.26	Mon 12.10.26	239EA-5 Tage
225		**Elektroarbeiten**	**115 Tage**	**Die 12.05.26**	**Don 22.10.26**	
226		ELT Rohinstallationen	8 Tage	Die 12.05.26	Fre 22.05.26	219EA-7 Tage
227		ELT Rohinstallationen in Wänden	25 Tage	Fre 22.05.26	Mon 29.06.26	219
228		ELT Fertiginstallation	30 Tage	Die 01.09.26	Mon 12.10.26	239EA-15 Tage
229		ELT Fertiginstallation_Möblierung&Ausstellung	18 Tage	Die 29.09.26	Don 22.10.26	241
230		**Estrich- und Beschichtungsarbeiten**	**40 Tage**	**Die 14.07.26**	**Mon 07.09.26**	
231		Estrich inkl. Dämmung	10 Tage	Die 14.07.26	Mon 27.07.26	220
232		Trocknungszeit	15 Tage	Die 28.07.26	Mon 17.08.26	231
233		Beschichtung Bodenbelag	5 Tage	Die 01.09.26	Mon 07.09.26	236
234		**Fliesenarbeiten**	**10 Tage**	**Die 18.08.26**	**Mon 31.08.26**	
237		**Malerarbeiten**	**15 Tage**	**Die 01.09.26**	**Mon 21.09.26**	
240		**Innenausbau/Schreinerarbeiten**	**10 Tage**	**Die 22.09.26**	**Mon 05.10.26**	
241		Maßmöbel	5 Tage	Die 22.09.26	Mon 28.09.26	239
242		Innentüren	5 Tage	Die 29.09.26	Mon 05.10.26	241
243		**Baureinigung**	**3 Tage**	**Die 13.10.26**	**Don 15.10.26**	
245		Möblierung	5 Tage	Fre 16.10.26	Don 22.10.26	244
246		Inbetriebnahme	0 Tage	Don 22.10.26	Don 22.10.26	245
247		Abnahmen und Mängelbeseitigung	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26	246
248		Fertigstellung und Übergabe	0 Tage	Don 05.11.26	Don 05.11.26	247
249		Fertigstellung	0 Tage	Don 05.11.26	Don 05.11.26	248

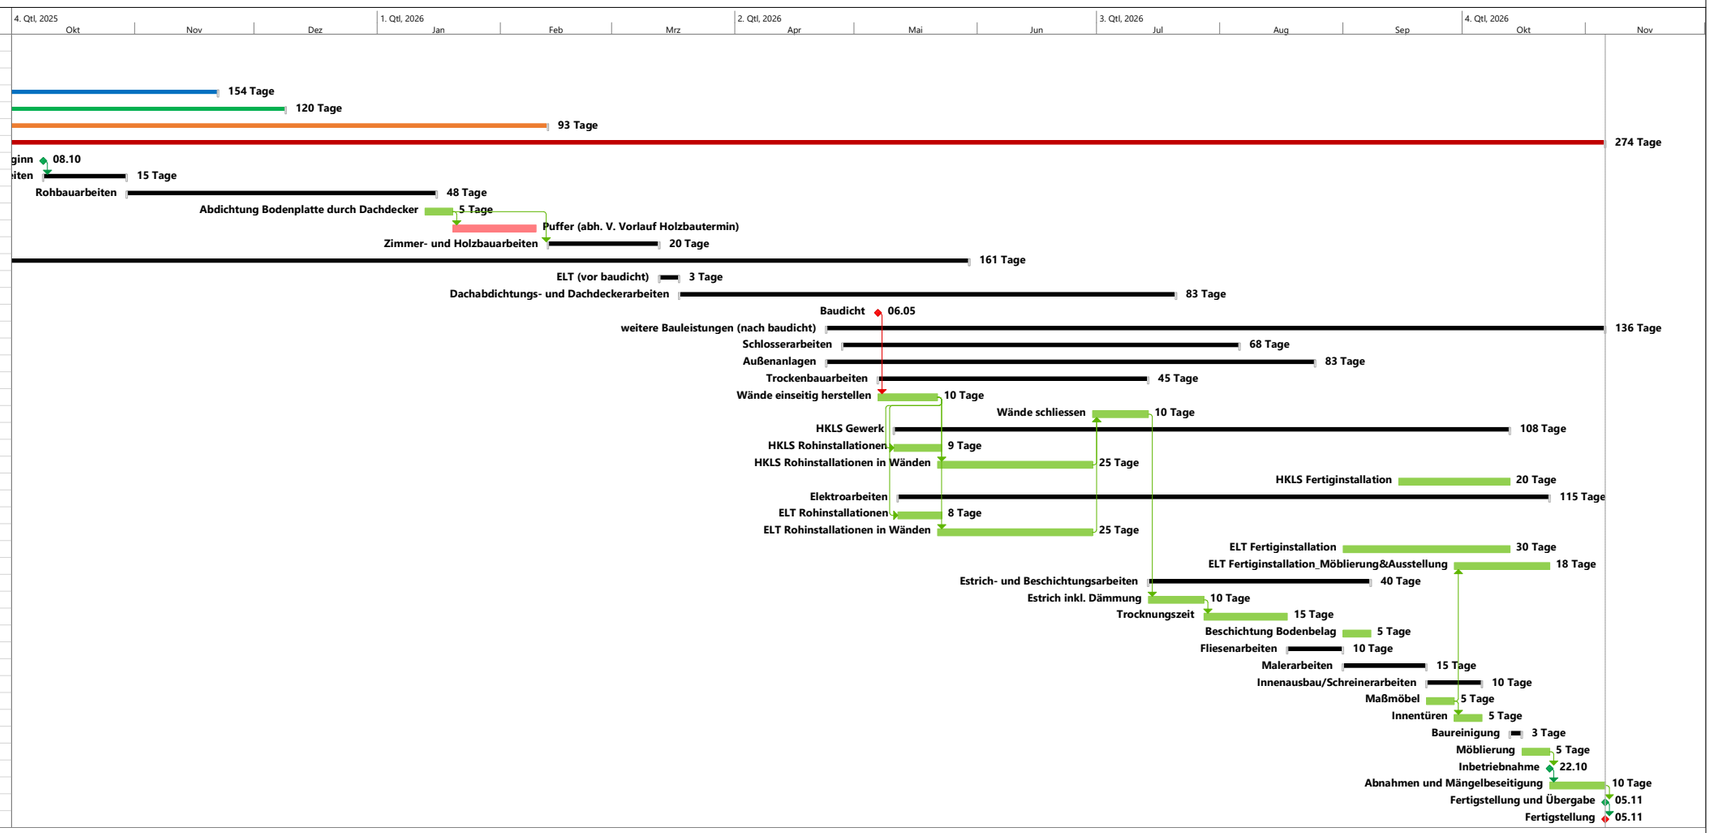

Projekt: Terminplan_IND_24-11
Datum: Die 09.09.25

Vorgang	Meilenstein	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Vorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Anfang	Externe Vorgänge	Stichtag	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Dauer	Manueller Sammelvorgang	Nur Ende	Externer Meilenstein	In Arbeit	
