		Name	Dauer	Start	Ende	Vorgän...	Verantwortlich
1		Erteilung Baugenehmigung	1 tag	16.06.25...	17.06.25,...		
2		Erstellung AF-Planungen (Geb+TGA)	65 tage	02.05.25...	31.07.25,...		
3		Fertigstellung AS-Unterlagen 1. AS-Paket	34 tage	01.08.25...	17.09.25,...	2	
4		Vergabe Bauleistungen 1. AS-Paket	30 tage	18.09.25...	29.10.25,...	3	
5		Fertigstellung AS-Unterlagen 2. AS-Paket	20 tage	18.09.25...	15.10.25,...	3	
6		Vergabe Bauleistungen 2. AS-Paket	30 tage	16.10.25...	26.11.25,...	5	
7		Fertigstellung AS-Unterlagen 3. AS-Paket	20 tage	16.10.25...	12.11.25,...	5	
8		Vergabe Bauleistungen 3. AS-Paket	55 tage	13.11.25...	28.01.26,...	7	
9		Weihnachten 2025	15 tage	22.12.25...	09.01.26,...		ALLE - Urlaubszeit
10		Tiefbauarbeiten 1. BA Erweiterungsfläche	25 tage	11.08.25...	12.09.25,...		Fa. Schmitz
11		Errichtung neues Carport + Umsetzen JuFW-Container	15 tage	22.09.25...	10.10.25,...		Fa. S+H / N.N.
12		Rückbau vorh. Carport und Transport zum JUZ	5 tage	20.10.25...	24.10.25,...		Bauhof / techn. Hochbau
13		Sperrung öffentl. Parkplatz für FW	1 tag	22.10.25...	22.10.25,...		Bauhof, ca. 85 lfdm. Bauzaun
14		Abbruch Hecken	2 tage	23.10.25...	24.10.25,...	13	Fa. Beckmann
15		Baustart + Baustelleneinrichtung Erweiterungsbau	5 tage	24.11.25...	28.11.25,...		Rohbauer
16		Erdarbeiten - Rückbau Bestandsplaster	2 tage	01.12.25...	02.12.25,...	15	Rohbauer
17		Fundamentarbeiten	8 tage	03.12.25...	12.12.25,...	16	Rohbauer
18		Grundleitungen	3 tage	15.12.25...	17.12.25,...	17	Sanitär
19		Feinplanum herstellen	2 tage	18.12.25...	19.12.25,...	18	Rohbauer
20		Weihnachten 2025	15 tage	22.12.25...	09.01.26,...		ALLE - Urlaubszeit
21		Blitzschutz unter der Sohle (Soz.-Geb.& Halle Achse 4-5)	1 tag	12.01.26...	12.01.26,...	20	Blitzschutz
22		Dämmung unter der Sohle (Soz.-Geb. & Halle Achse 4-5)	1 tag	13.01.26...	13.01.26,...	21	Rohbauer
23		Untere Bewehrung Sohle (Soz.-Geb. & Halle Achse 4-5)	3 tage	14.01.26...	16.01.26,...	22	Rohbauer
24		Obere Bewehrung Sohle (Soz.-Geb. & Halle Achse 4-5)	4 tage	19.01.26...	22.01.26,...	23	Rohbauer
25		Betonage Sohle (Soz.-Geb. & Halle Achse 4-5) + Puffer	2 tage	23.01.26...	26.01.26,...	24	Rohbauer
26		Mauerwerksarbeiten Sozialtrakt	15 tage	27.01.26...	16.02.26,...	25	Rohbauer
27		Stahlbauarbeiten Halle	10 tage	27.01.26...	09.02.26,...	25	Stahlbauer
28		Mauerwerksarbeiten Verblender Sozialtrakt	25 tage	17.02.26...	23.03.26,...	26	Rohbauer
29		Mauerwerksarbeiten Sockel + Verblender Halle	10 tage	24.03.26...	06.04.26,...	28	Rohbauer
30		StB-Decke Sozialtrakt und Halle (Empore)	10 tage	17.02.26...	02.03.26,...	26	Rohbauer
31		Attika-Herstellung Sozialtrakt	5 tage	03.03.26...	09.03.26,...	30	Rohbauer
32		Dachabdichtung Sozialtrakt	10 tage	10.03.26...	23.03.26,...	31	Dachdecker
33		Fenster + Türen ausmessen	5 tage	07.04.26...	13.04.26,...	29	Fensterbauer / Tischler
34		Dach- und Fassadenarbeiten Halle	20 tage	07.04.26...	04.05.26,...	29	Fassadenbauer
35		Blitzschutz unter der Sohle (Halle Achse 1-4)	1 tag	05.05.26...	05.05.26,...	34	Rohbauer
36		Dämmung unter der Sohle (Halle Achse 1-4)	1 tag	06.05.26...	06.05.26,...	35	Rohbauer
37		Untere Bewehrung Sohle (Halle Achse1-4)	3 tage	07.05.26...	11.05.26,...	36	Rohbauer
38		Industrie - FBH Fz-Halle (Halle Achse 1-4)	3 tage	12.05.26...	14.05.26,...	37	Rohbauer
39		Obere Bewehrung Sohle (Halle Achse 1-4)	3 tage	15.05.26...	19.05.26,...	38	Rohbauer
40		Betonage Sohle (Halle Achse 1-4) + Puffer	2 tage	20.05.26...	21.05.26,...	39	Rohbauer
41		Flex- und Stemmarbeiten Sozialtrakt	5 tage	05.05.26...	11.05.26,...	34	TGA-Gewerke
42		Einbau Fenster + Türen	5 tage	12.05.26...	18.05.26,...	41	Fensterbauer / Tischler
43		Trockenbauarbeiten	20 tage	19.05.26...	15.06.26,...	42	Trockenbauer
44		ELT- , RLT-, Sanitärinstallationsarbeiten vor Putzarb.	20 tage	19.05.26...	15.06.26,...	42	Elektriker, Sanitär, Lüftung
45		Putzarbeiten	10 tage	16.06.26...	29.06.26,...	44	Rohbauer
46		ELT- , RLT-, Sanitärinstallationsarbeiten nach Putzarb.	10 tage	30.06.26...	13.07.26,...	45	Elektriker, Sanitär, Lüftung
47		Trittschall-/Estrichdämmung	2 tage	14.07.26...	15.07.26,...	46	Rohbauer/Heizungsbauer
48		Verlegung FBH in Sozialtrakt	5 tage	14.07.26...	20.07.26,...	46	Heizungsbauer
49		Estricharbeiten	3 tage	21.07.26...	23.07.26,...	48	Rohbauer
50		URLAUBSZEIT - PUFFER	20 tage	24.07.26...	20.08.26,...	49	ALLE
51		Trockenbauarbeiten	20 tage	21.08.26...	17.09.26,...	50	Trockenbauer
52		Fliesenarbeiten	20 tage	21.08.26...	17.09.26,...	50	Fliesenleger
53		Malerarbeiten + Bodenbelagsarbeiten	20 tage	18.09.26...	15.10.26,...	52	Maler
54		Bodenbeschichtung Fz-Halle	5 tage	16.10.26...	22.10.26,...	53	Maler
55		ELT- , RLT-, Sanitär -- Endmontagen	10 tage	23.10.26...	05.11.26,...	54	Elektriker, Sanitär, Lüftung
56		Montage Sanitärtrennwände	2 tage	06.11.26...	09.11.26,...	55	Trennwand-Bauer
57		Schlosserarbeiten Fz-Halle	10 tage	23.10.26...	05.11.26,...	54	Schlosser
58		Einbau Teeküche	5 tage	16.10.26...	22.10.26,...	53	Küchenbauer
59		Puffer, Inbetriebnahmen, Abnahmen, Mängelbes.	20 tage	10.11.26...	07.12.26,...	56	ALLE
60		FERTIGSTELLUNG	5 tage	08.12.26...	14.12.26,...	59	ALLE

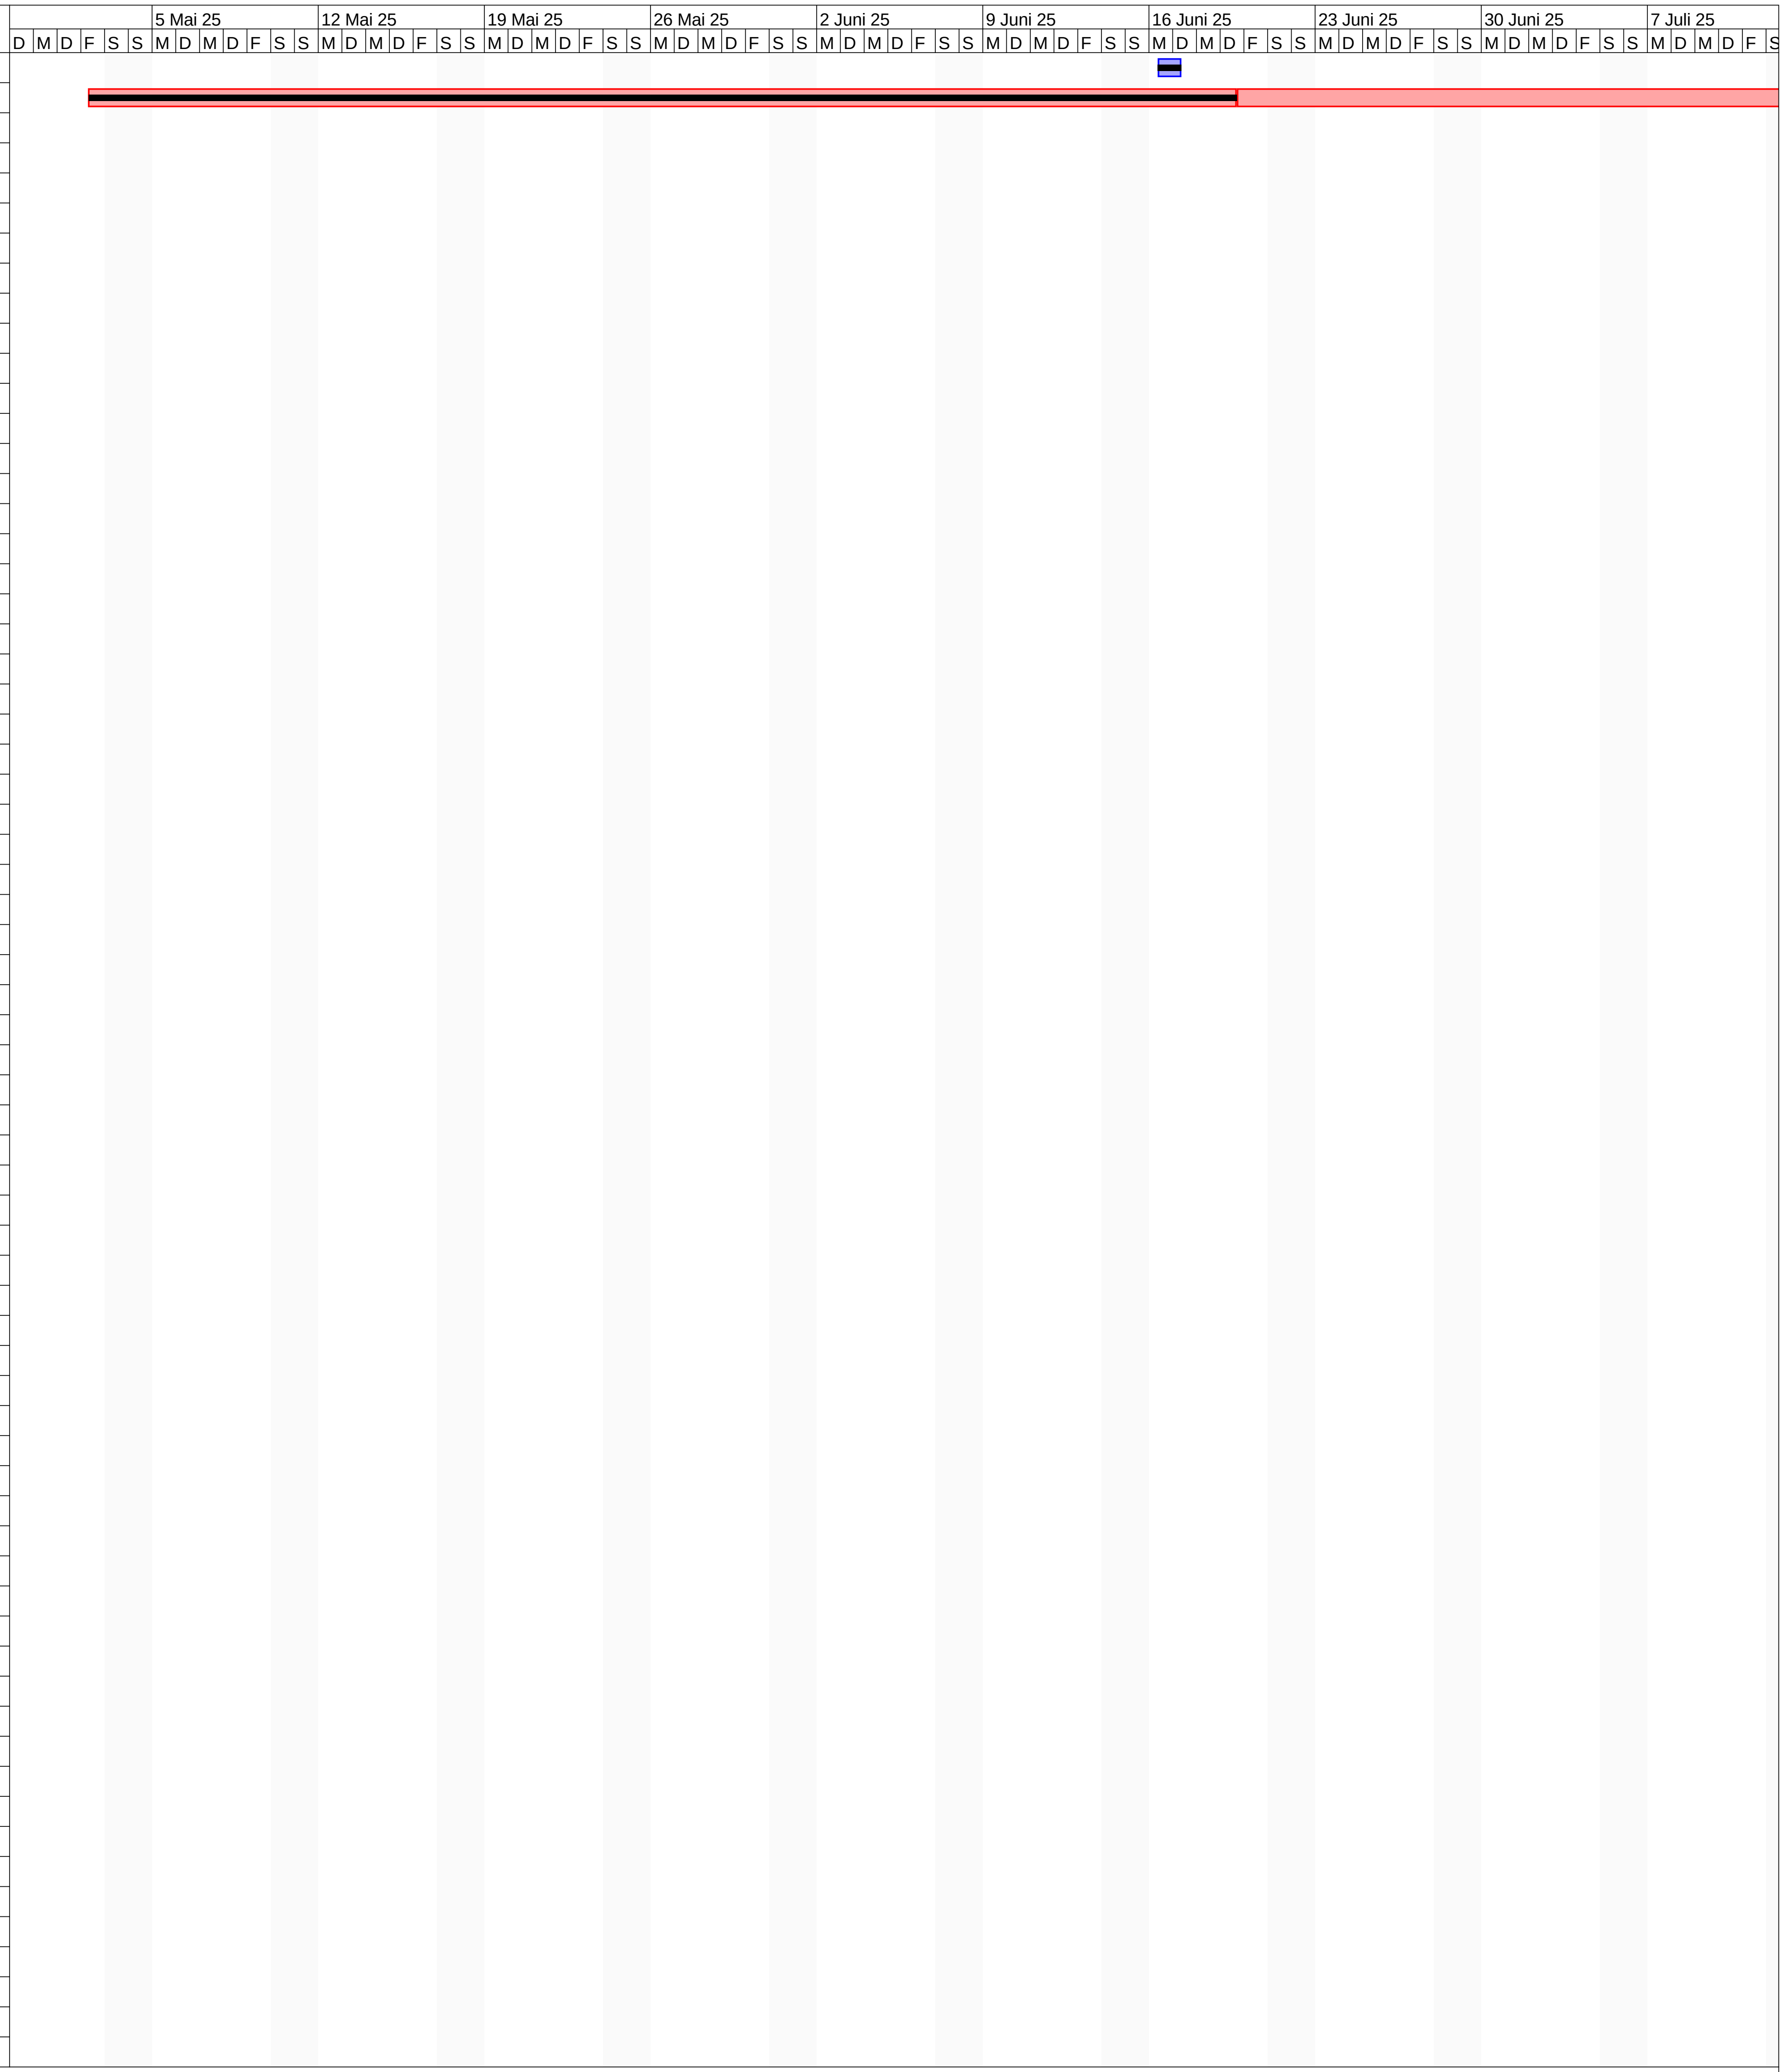

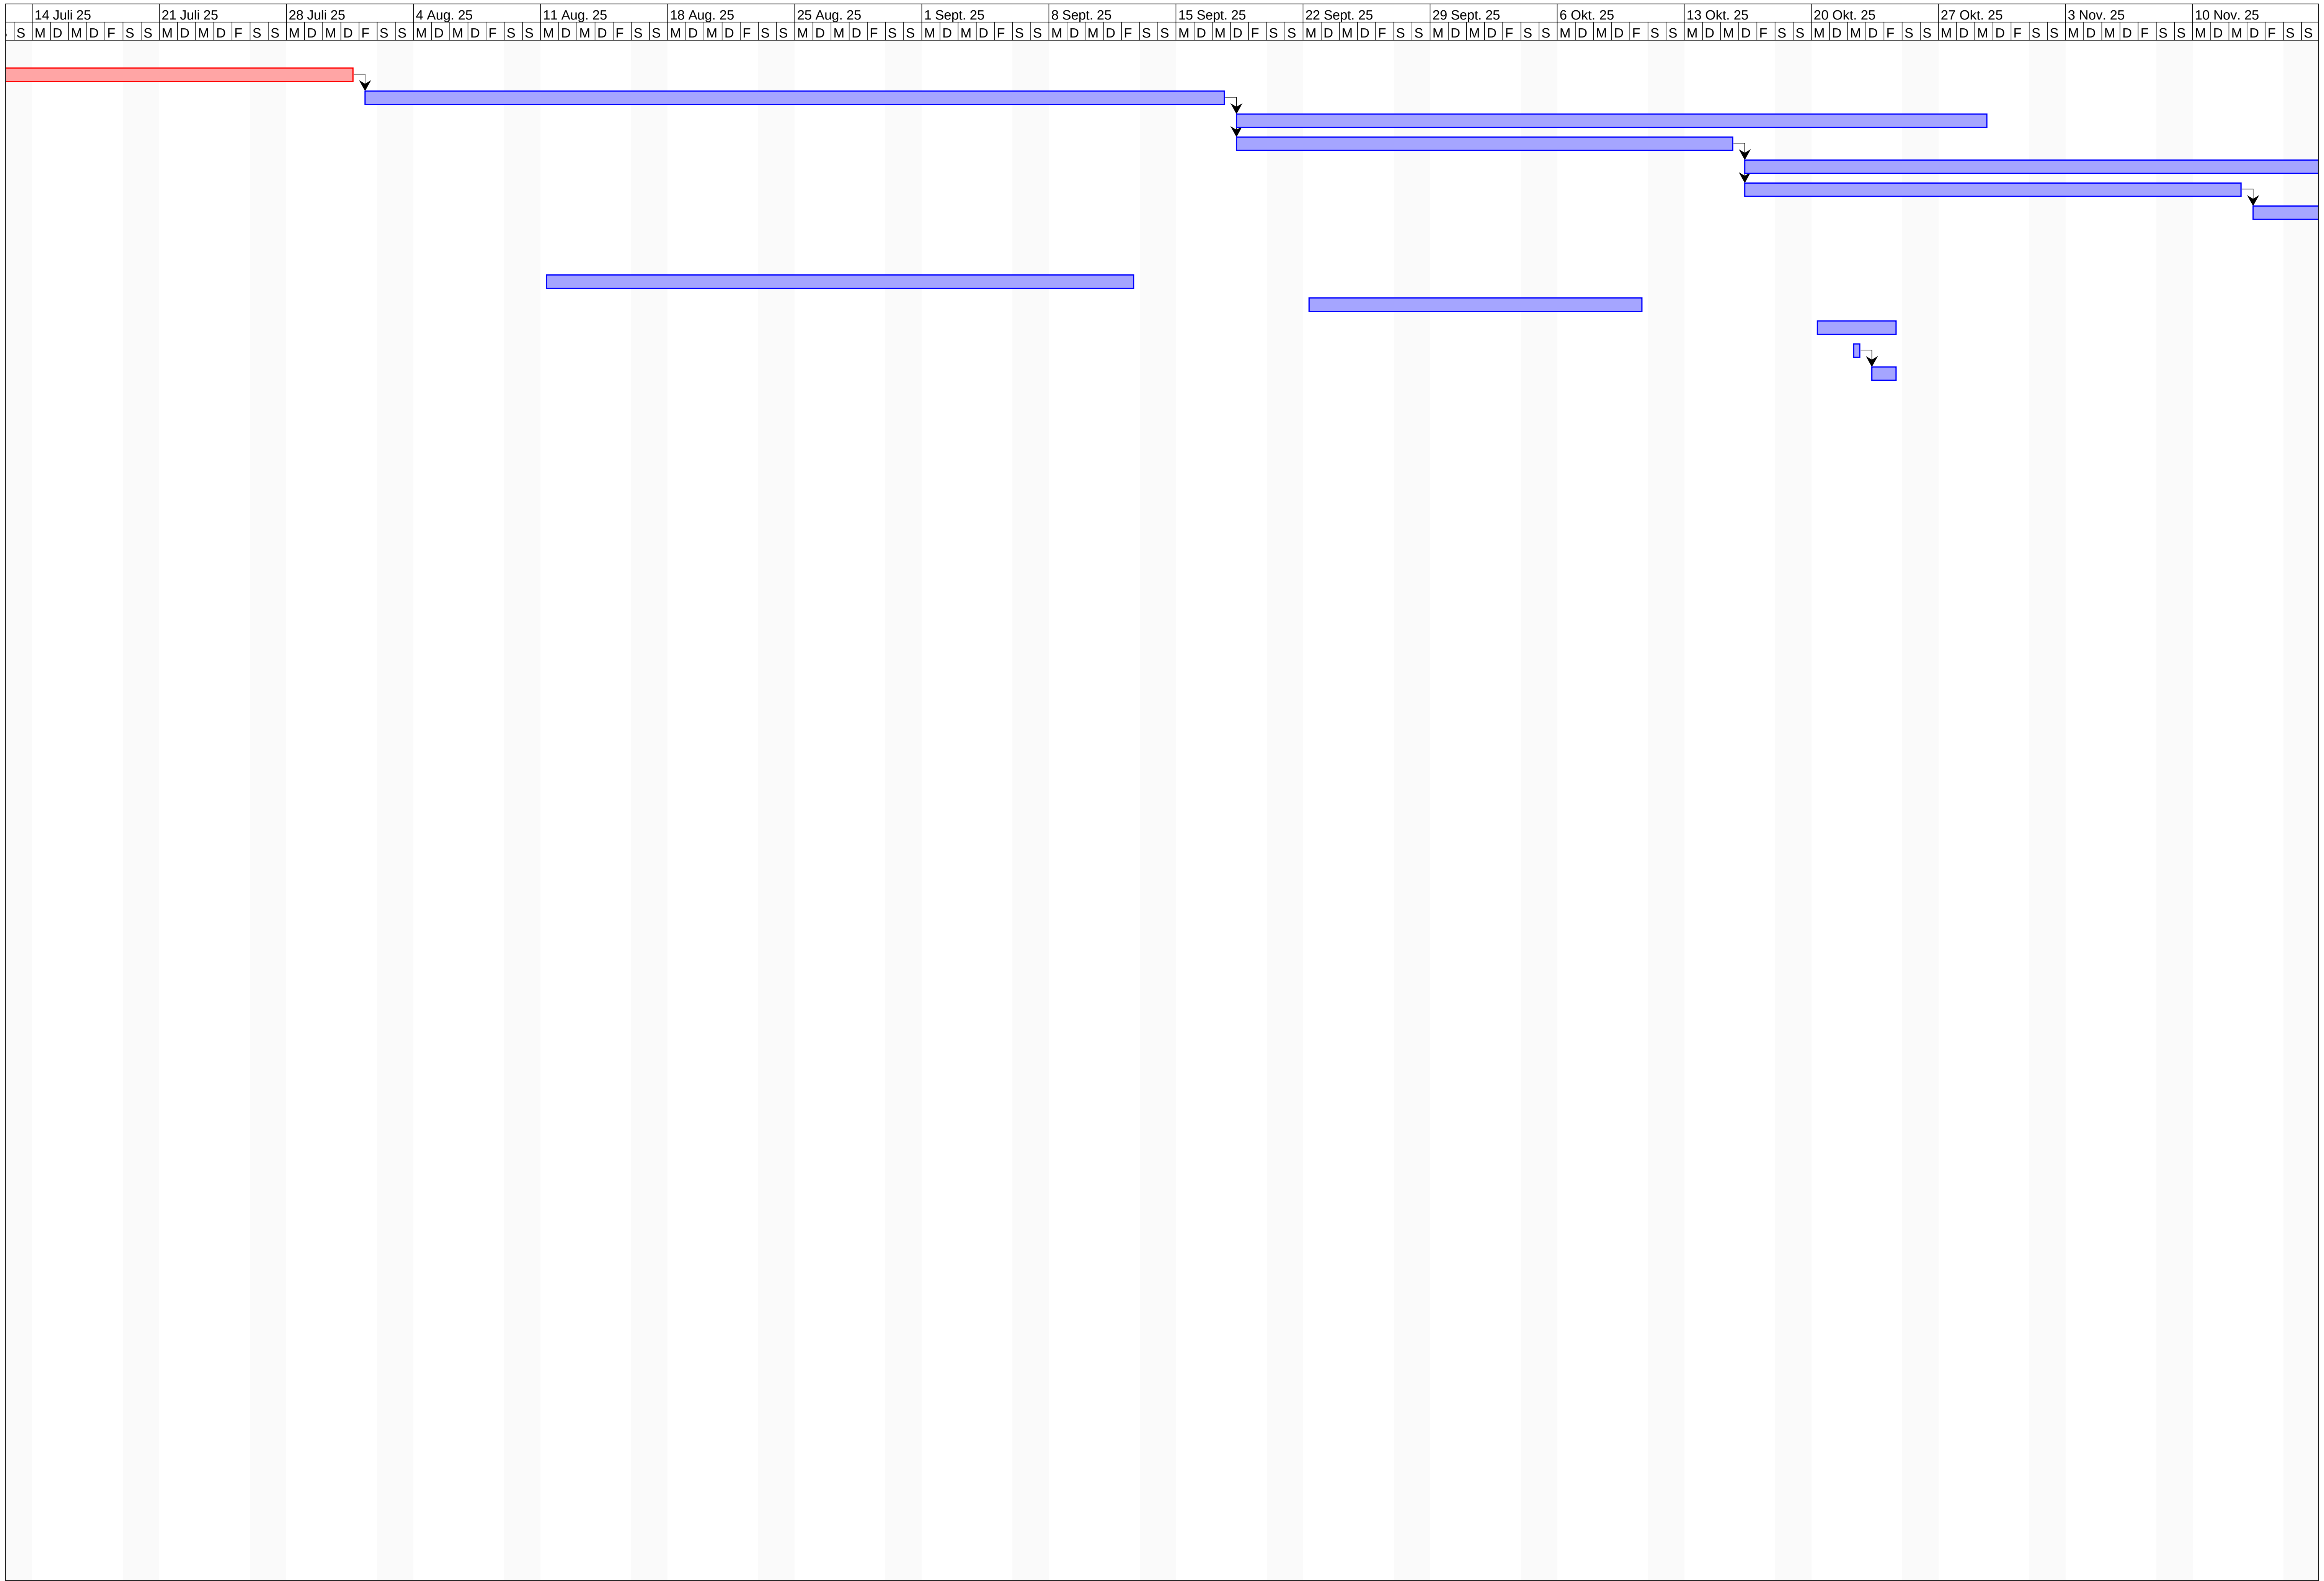
14 Juli 25
21 Juli 25
28 Juli 25
4 Aug. 25
11 Aug. 25
18 Aug. 25
25 Aug. 25
1 Sept. 25
8 Sept. 25
15 Sept. 25
22 Sept. 25
29 Sept. 25
6 Okt. 25
13 Okt. 25
20 Okt. 25
27 Okt. 25
3 Nov. 25
10 Nov. 25

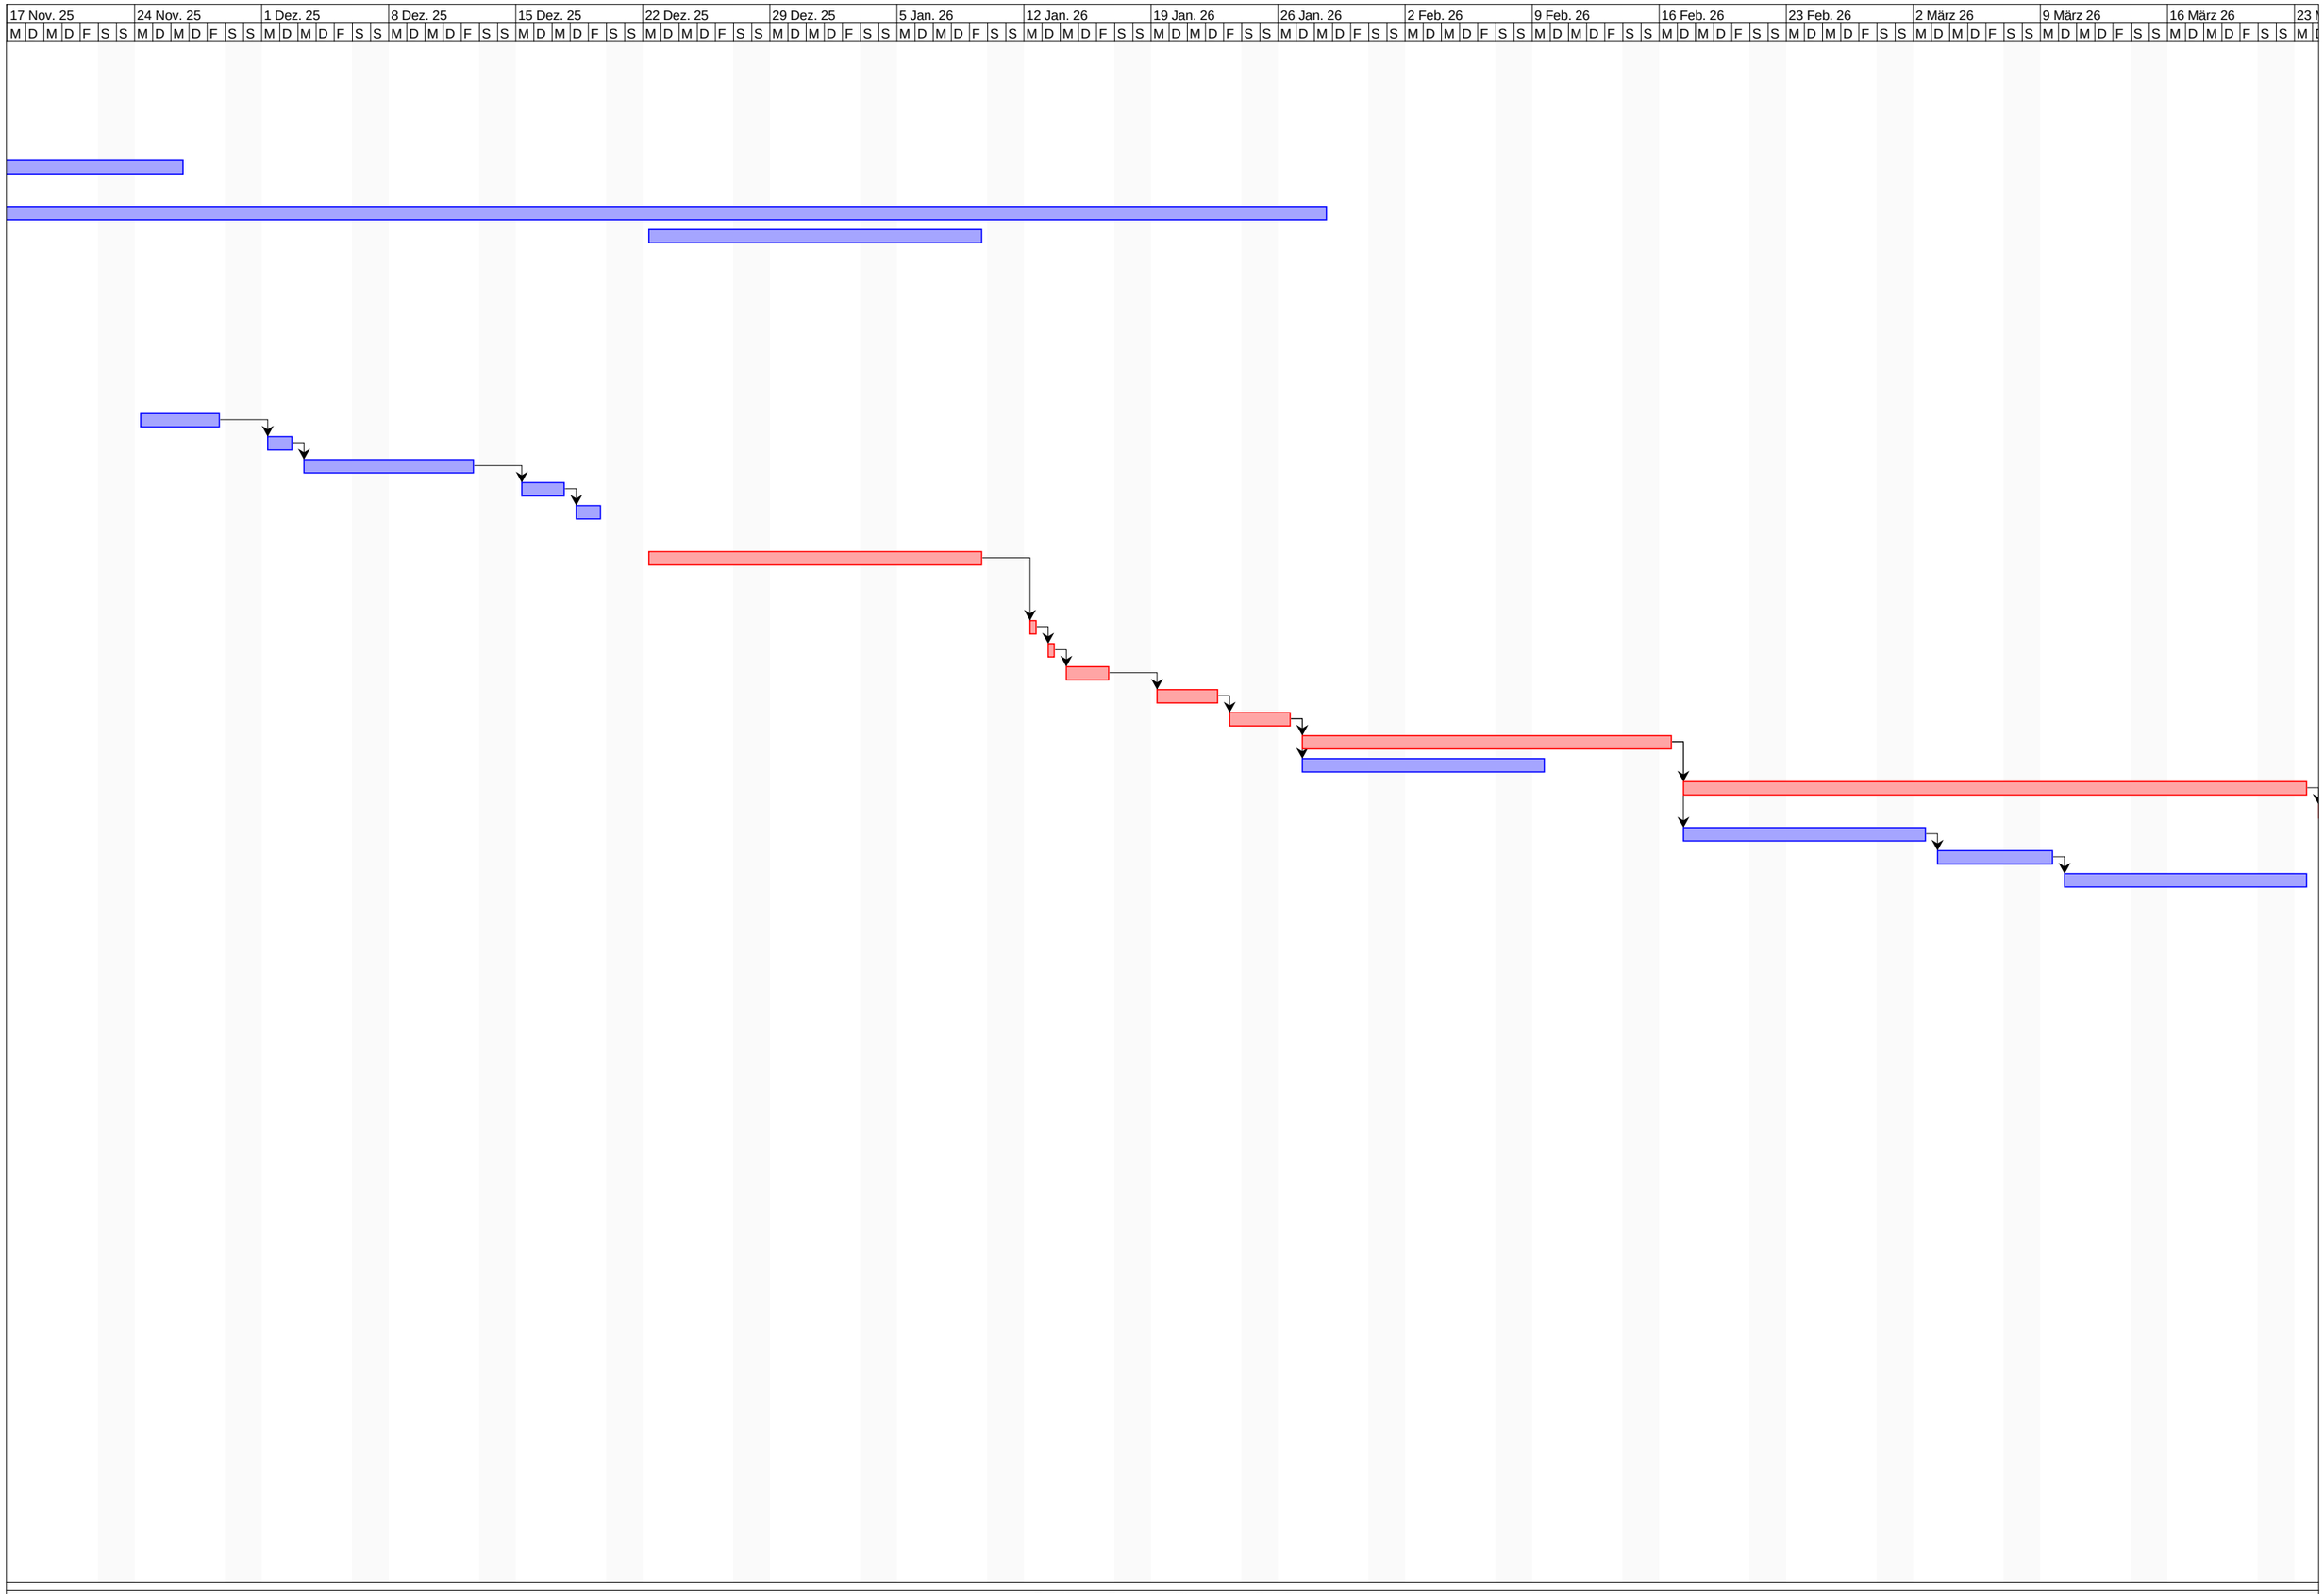
17 Nov. 25
24 Nov. 25
1 Dez. 25
8 Dez. 25
15 Dez. 25
22 Dez. 25
29 Dez. 25
5 Jan. 26
12 Jan. 26
19 Jan. 26
26 Jan. 26
2 Feb. 26
9 Feb. 26
16 Feb. 26
23 Feb. 26
2 März 26
9 März 26
16 März 26
M D M D F S S

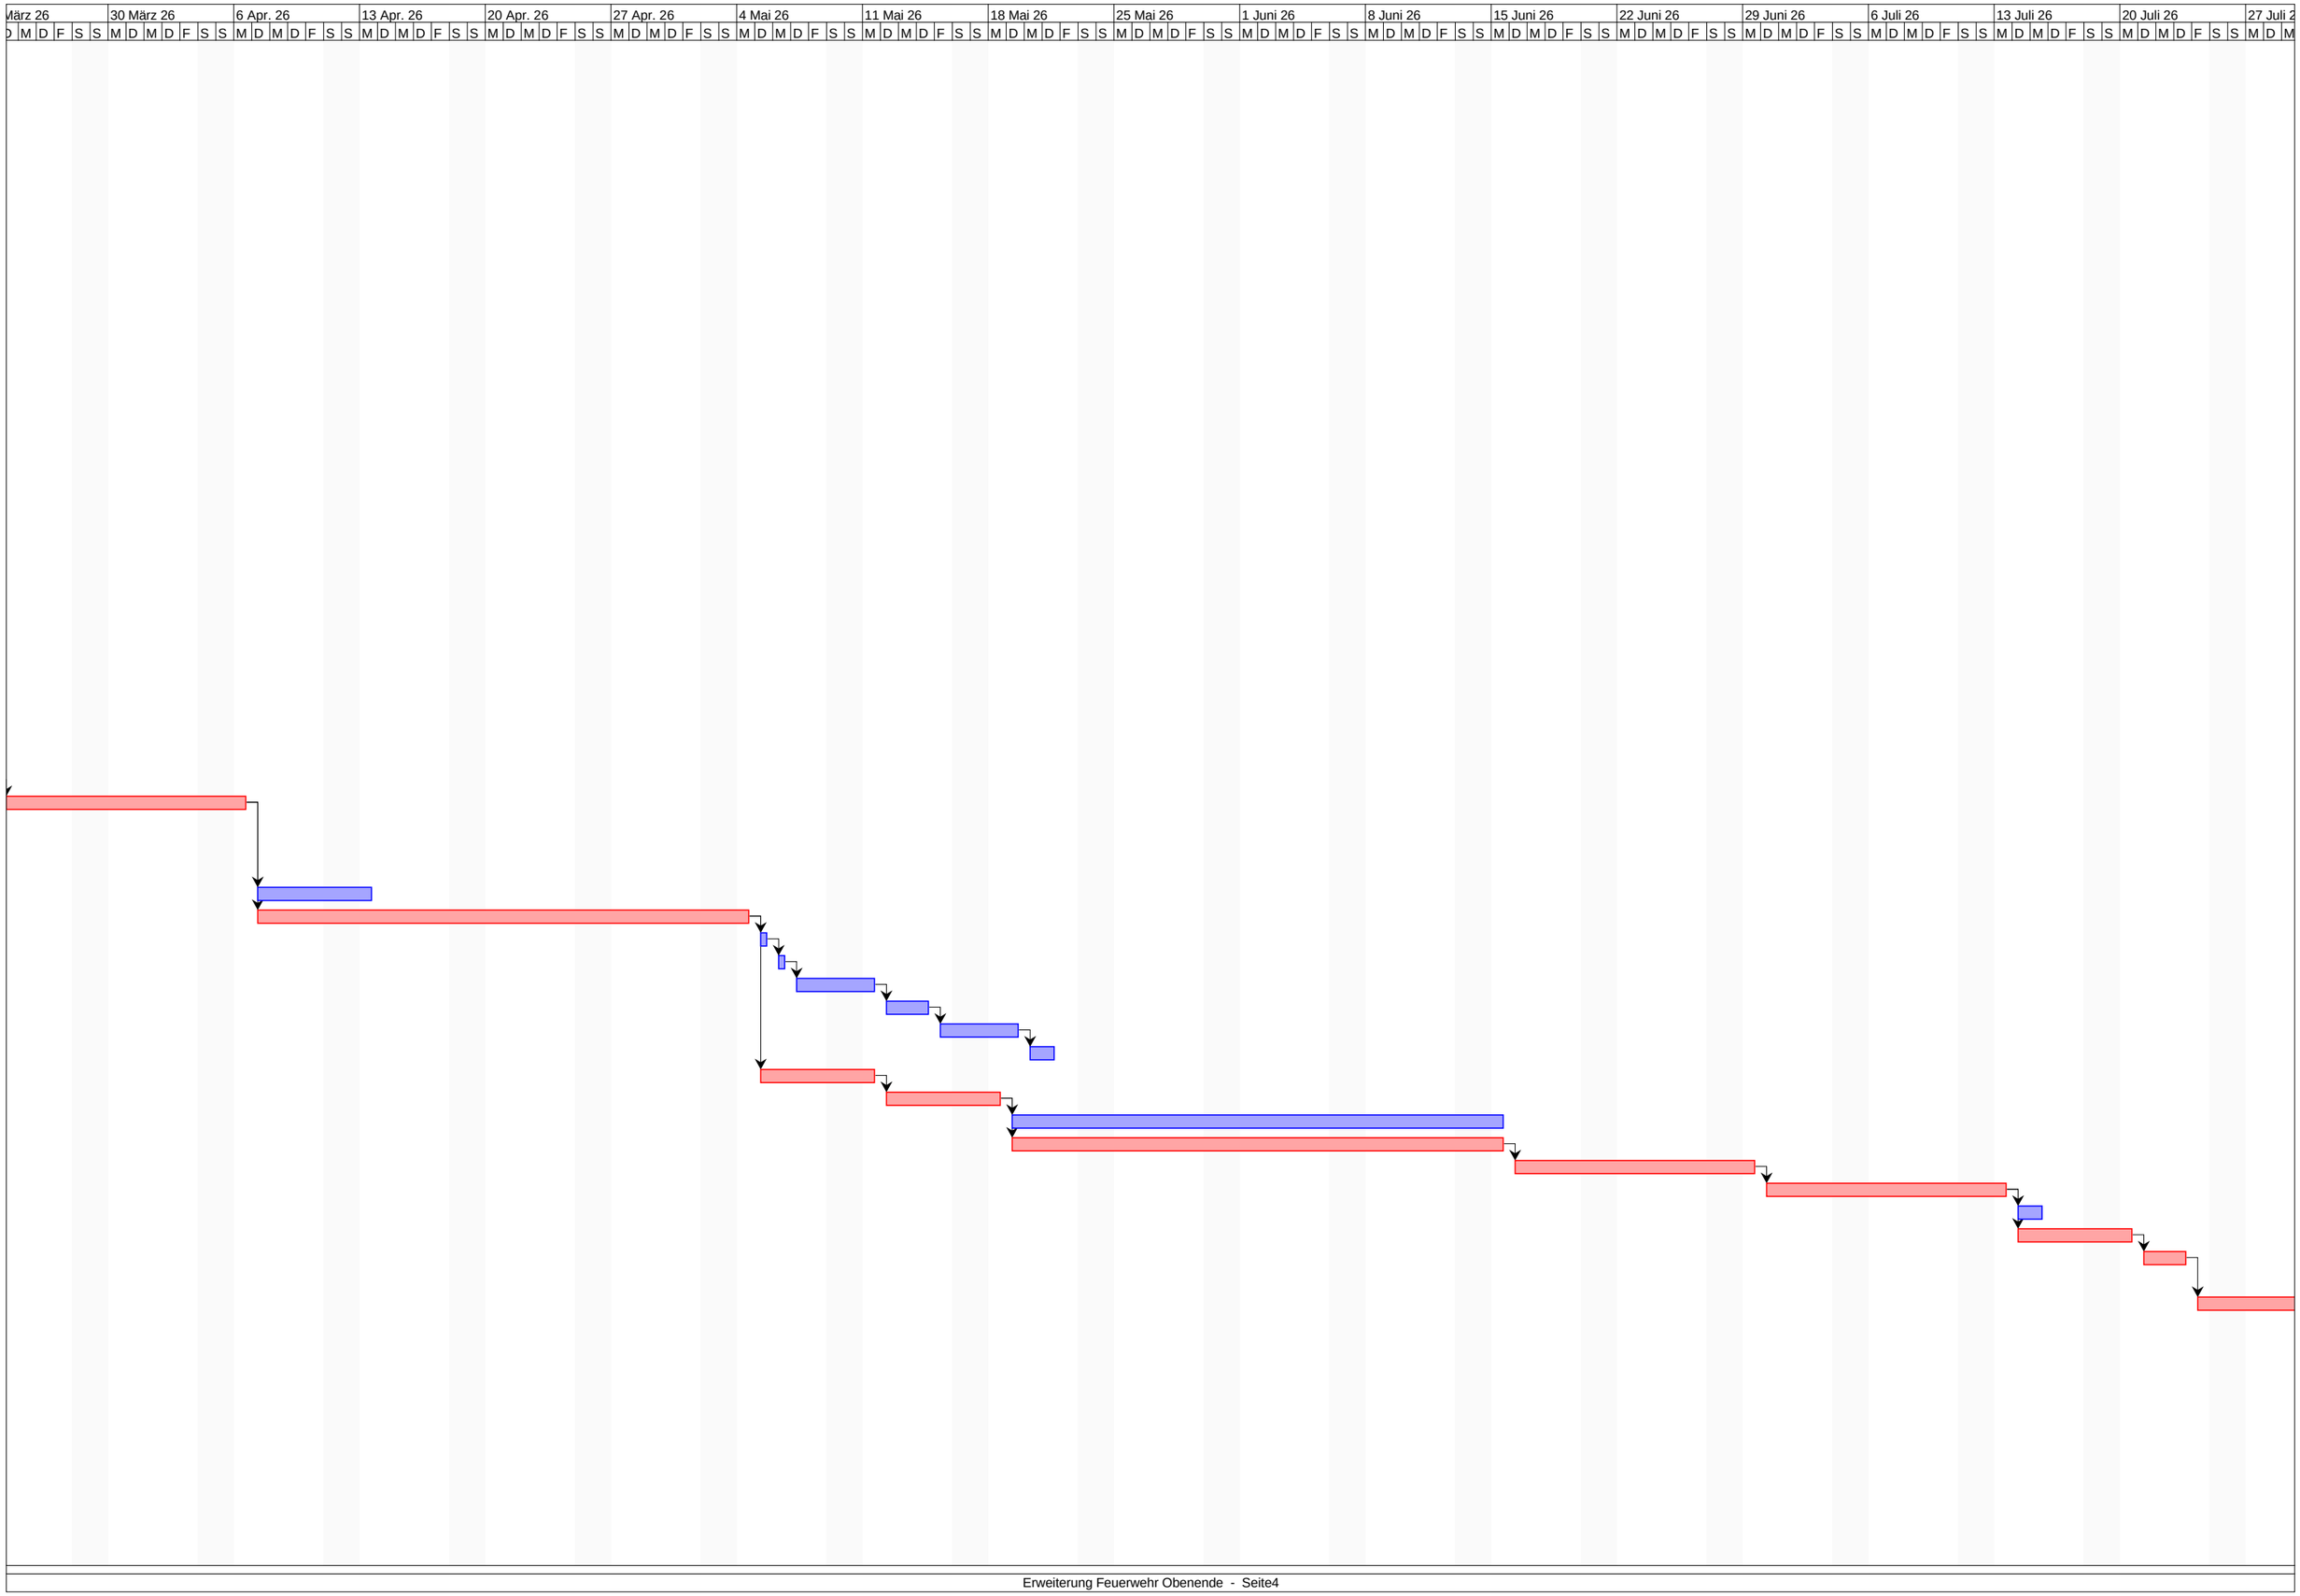
März 26
30 März 26
6 Apr. 26
13 Apr. 26
20 Apr. 26
27 Apr. 26
4 Mai 26
11 Mai 26
18 Mai 26
25 Mai 26
1 Juni 26
8 Juni 26
15 Juni 26
22 Juni 26
29 Juni 26
6 Juli 26
13 Juli 26
20 Juli 26
27 Juli 2
M D M D F S S

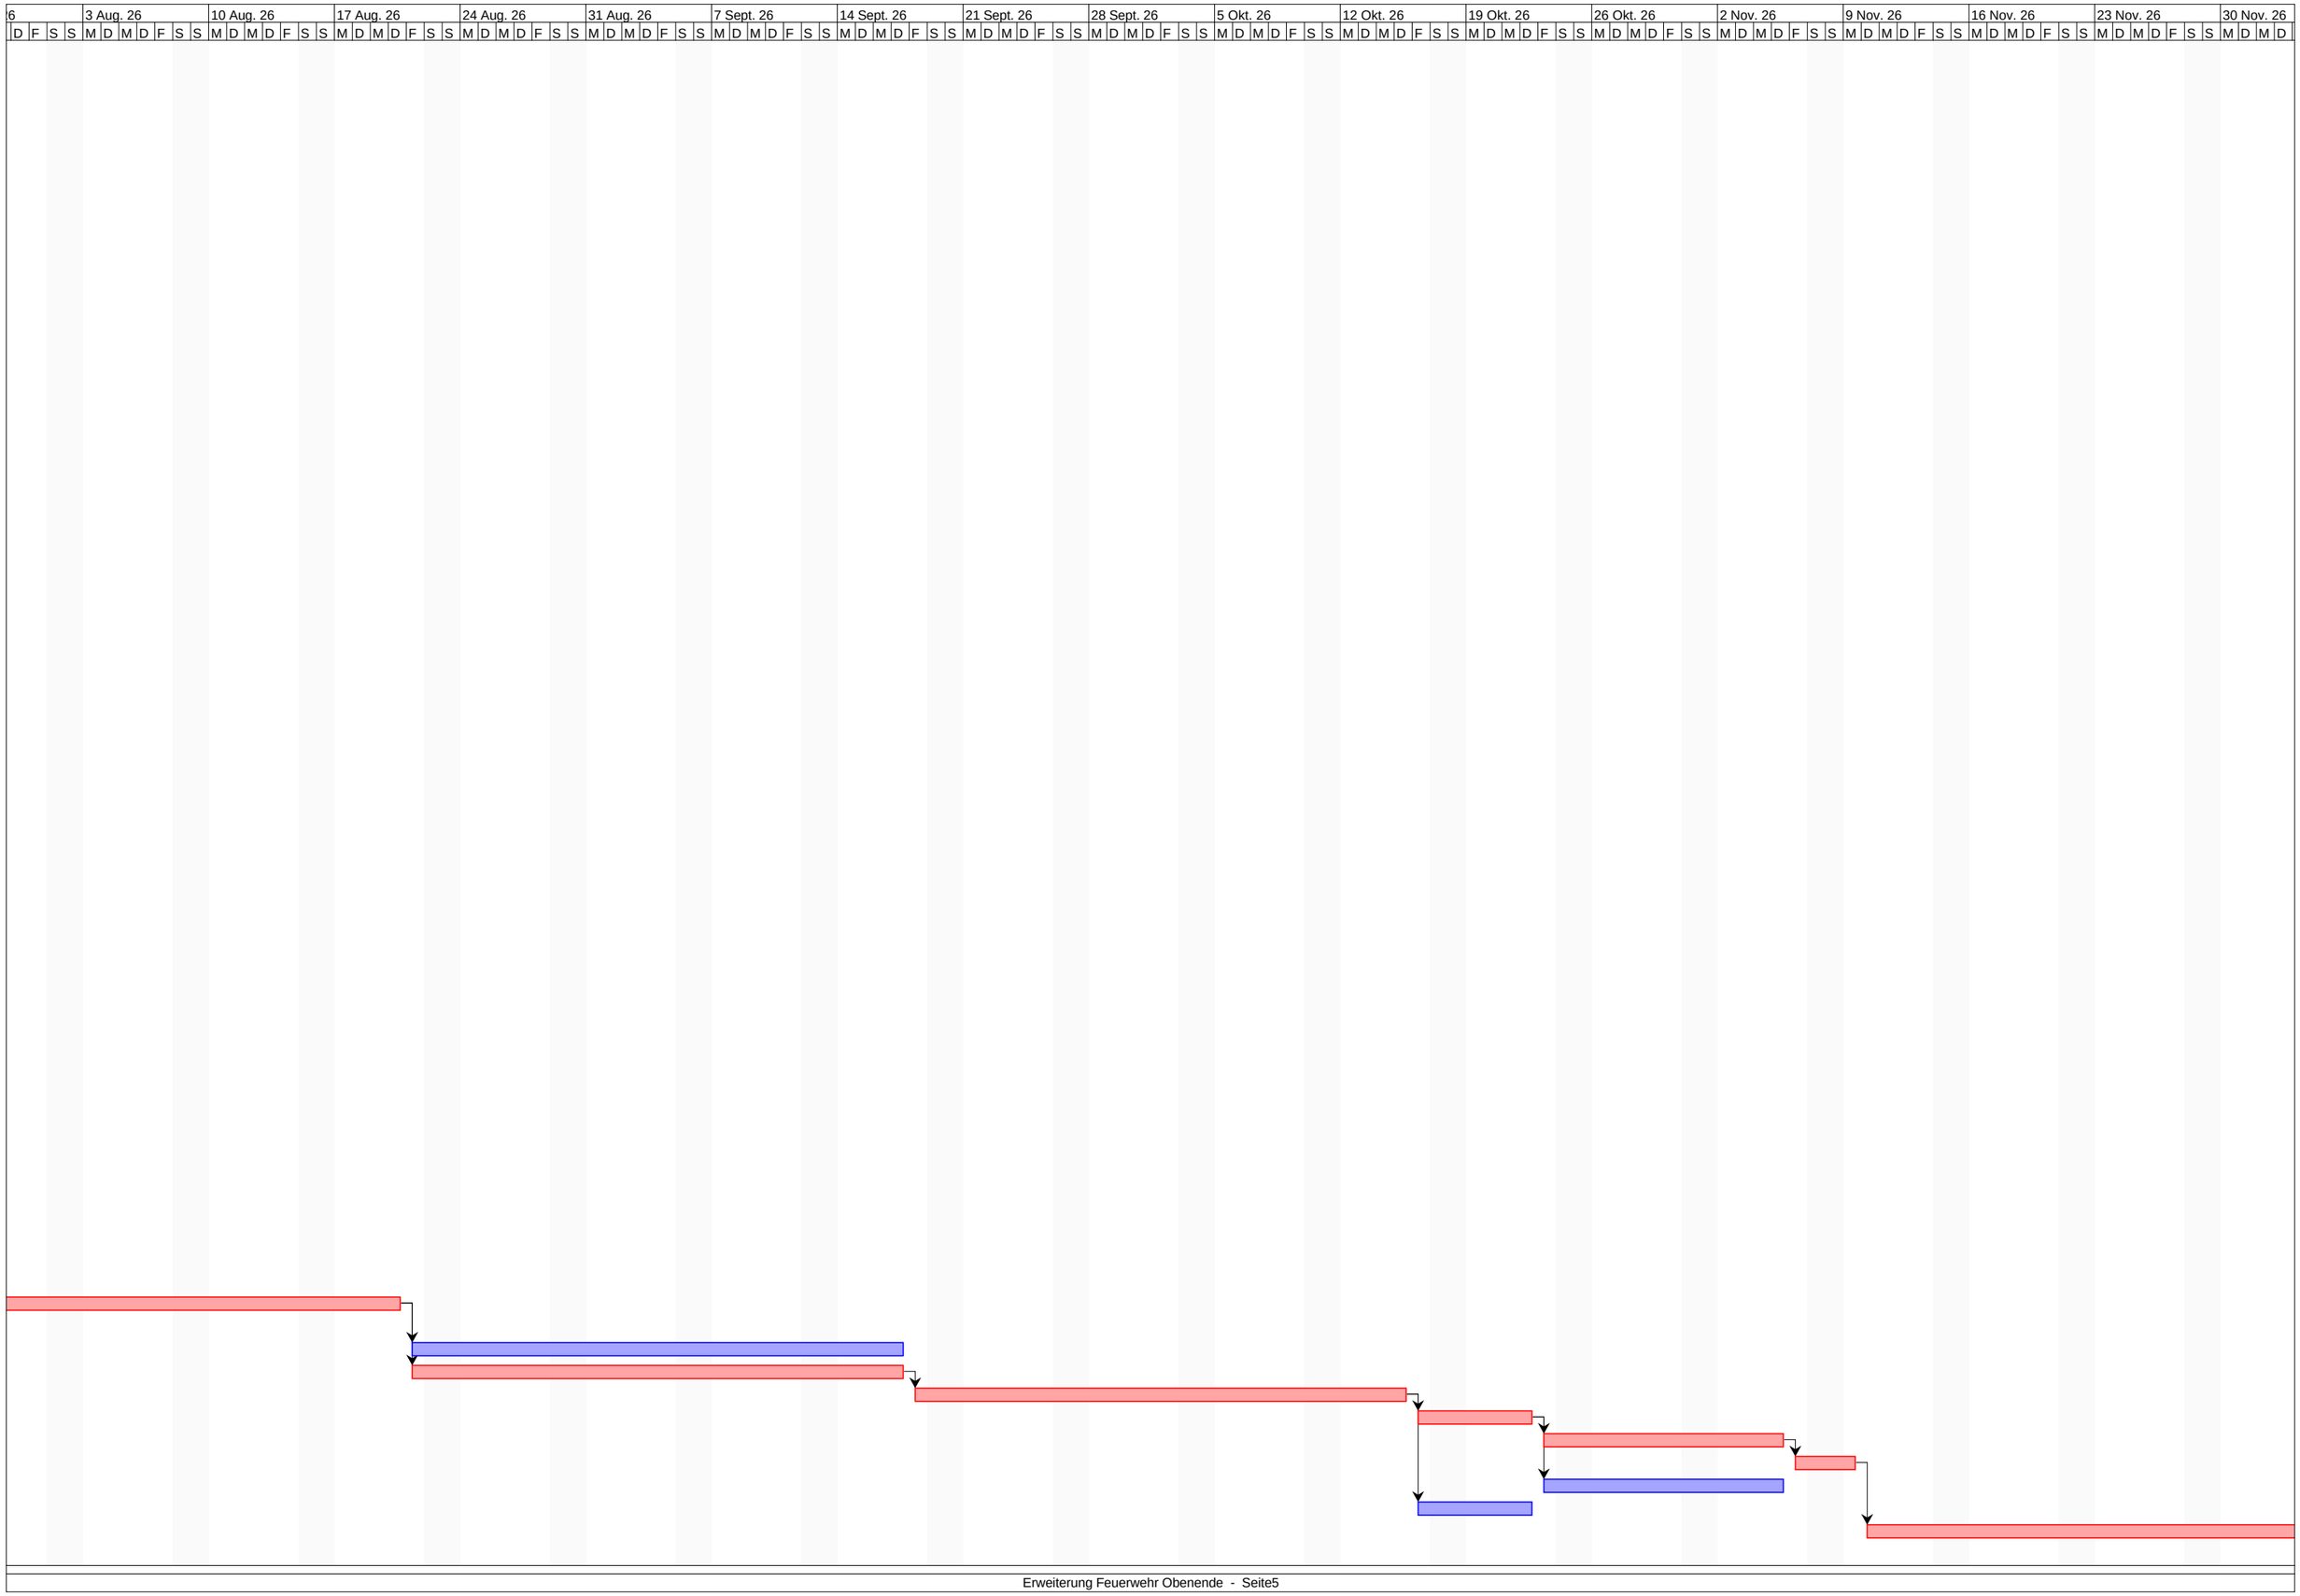
6
3 Aug. 26
10 Aug. 26
17 Aug. 26
24 Aug. 26
31 Aug. 26
7 Sept. 26
14 Sept. 26
21 Sept. 26
28 Sept. 26
5 Okt. 26
12 Okt. 26
19 Okt. 26
26 Okt. 26
2 Nov. 26
9 Nov. 26
16 Nov. 26
23 Nov. 26
30 Nov. 26

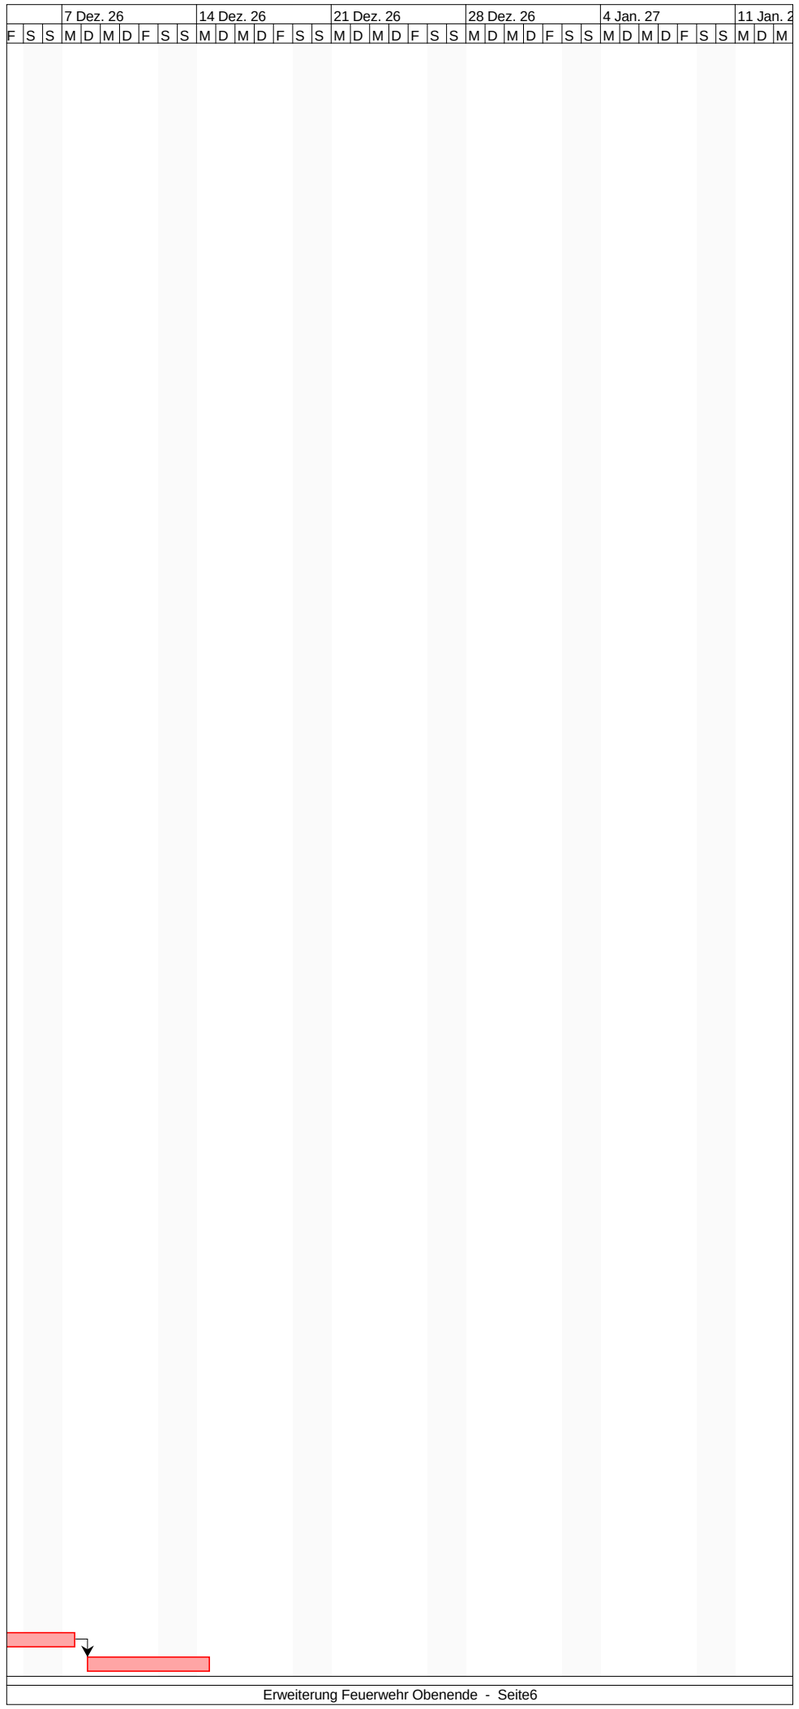
7 Dez. 26
14 Dez. 26
21 Dez. 26
28 Dez. 26
4 Jan. 27
11 Jan. 2
F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M
