Stand: 30.07.2025

Bearbeiter: Vössing Ingenieure

Baustellennr.:

Strecke: Strecke 2550 Osterfeld - Hamm

Baustelle: Gleisemeuerung Gleis Bergkamen - Pelkum
Gleisemeuerung Gleis Pelkum - Bergkamen

Beschreibung: Gleisemeuerung Gleis Bergkamen - Pelkum
km 63,463 - km 65,100 (Gleisnr.Netzbezirk)
vollständige Bettungsmeuerung km 64,463 - km 65,100
maschineller Einbau einer PSS KG 1 km 64,700 - km 64,800

Gleisemeuerung Gleis Pelkum - Bergkamen
km 65,100 (Gleisnr.Netzbezirk) - km 64,492
vollständige Bettungsmeuerung km 65,100 - km 64,492
maschineller Einbau einer PSS KG 1 km 65,100 - km 64,600



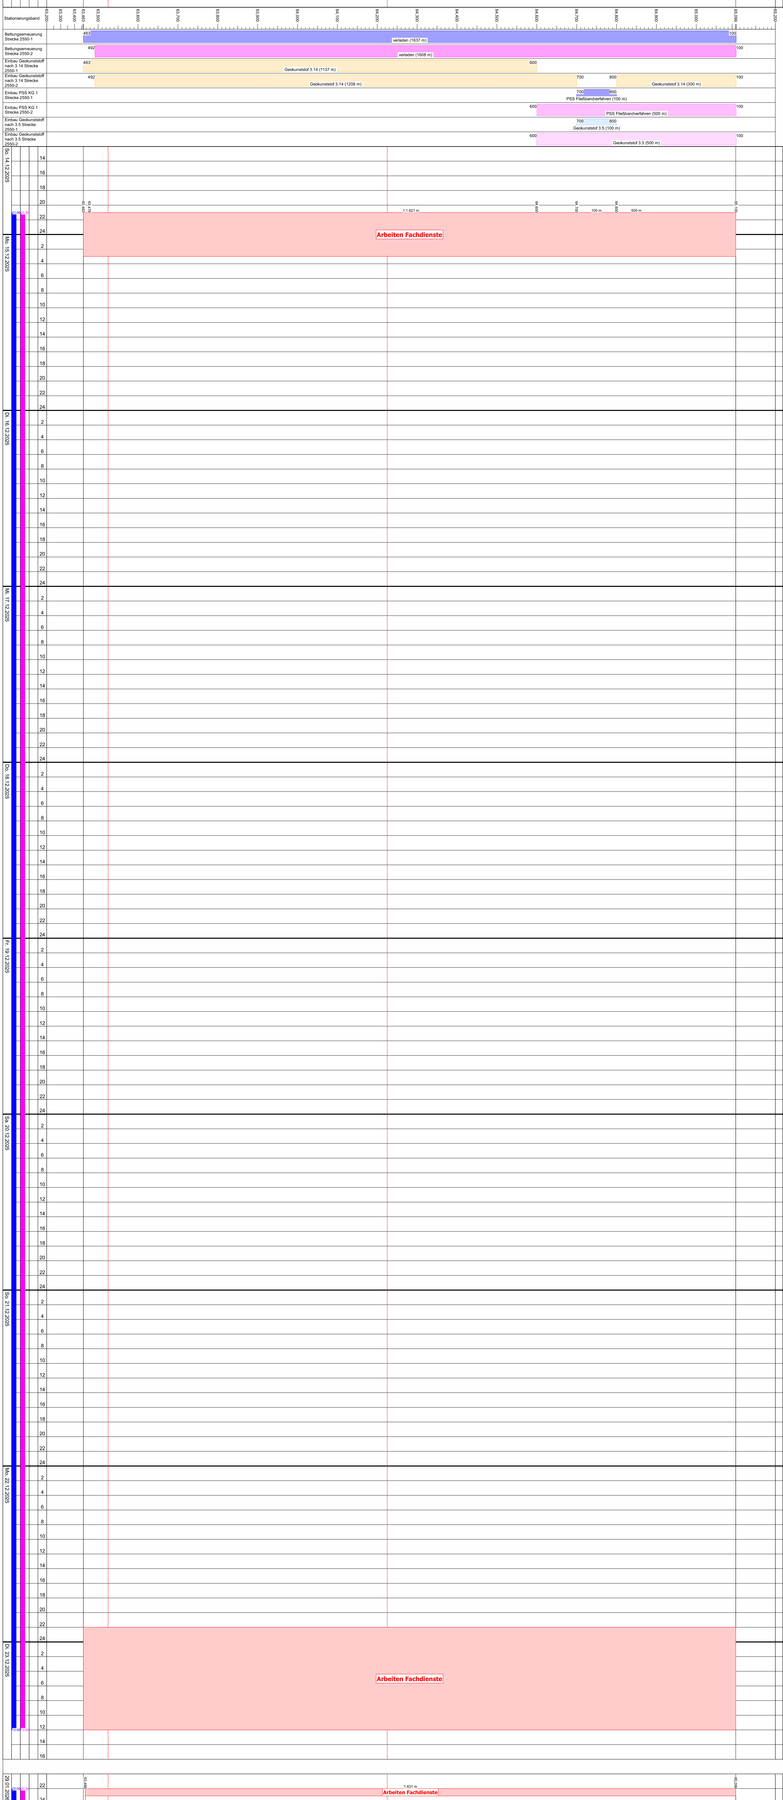

Name	Anzahl	Legende:
		LST- und Erdungsarbeiten / Fachdienste

Baustellennr.:
Strecke: Strecke 2550 Osterfeld - Hamm
Baustelle: Gleisemeuerung Gleis Bergkamen - Pelkum
Gleisemeuerung Gleis Pelkum - Bergkamen

BS:

Bauüberwachung:
Bauleitung:

Auftrags-Kurzn.:
Oberbauverstärkung Ab Ks 60 - 1067 - HH --> Strecke 2250-1
Ks 60 - 1067 - HH --> Strecke 2250-2

bzw. Weichenart-form Neu: ab 60 - 1067 - R70 Gu / 890 Gu --> Strecke 2250-1
ab 60 - 1067 - R70 Gu / 890 Gu --> Strecke 2250-2

Arbeitsverfahren: Gleisumbau im Fließanschaferfahren
vollständige Bettungsmeuerung maschinell
Einbau PSS maschinell

Betriebsart: Totalsperrung (TSP)

Ausführung von 14.12.2025 bis zum 23.12.2025
durch: Unternehmer

Rahmenplan erstellt:
Vössing Ingenieure
Niederlassung Kassel

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers
Bearbeitet
Gezeichnet
Geprüft
Maßstab

Zugelassen:
