Hbf Wuppertal
Rückbau Treppenanlage BSTG 3

Stand 09.09.2025

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)	Dauer	Bemerkungen
1	**Sperrpausen**	Fr, 15.10.27	Fr, 10.12.27	56 Tage	57 Tage	
1.1	Nebenkorridor	Fr, 15.10.27	Fr, 10.12.27	56 Tage	57 Tage	Ende Normal S.Bahnbetrieb 10.12.2027 ab 21:00 Regelbetrieb
1.2						
2	**Rückbau Treppe BSTG 3**	Mo, 06.09.27	Mi, 23.02.28	166 Tage	171 Tage	Aufzugsanlage siehe gesonderte Planung
2.1	**Bauphase 1 - Vorbereitende Arbeiten**	Mo, 06.09.27	Do, 14.10.27	38 Tage	39 Tage	
2.1.1	Baustelle einrichten	Mo, 06.09.27	Fr, 17.09.27	12 Tage	12 Tage	Tarifpunkt Bft. Wuppertal-Steinbeck
2.1.2	Beweissicherung Distelbeck	Mo, 20.09.27	Fr, 24.09.27	5 Tage	5 Tage	
2.1.3	Aufbau der Straßensperrugen Rondsdorf Straße / Distelbeck	Mo, 27.09.27	Fr, 01.10.27	5 Tage	5 Tage	
2.1.4	Herstellung Umfahrung Distelbeck	Mo, 04.10.27	Di, 12.10.27	9 Tage	9 Tage	
2.1.5	Aufbau Mobilkran Distelbeck	Mi, 13.10.27	Do, 14.10.27	2 Tage	2 Tage	
2.2	**Bauphase 2 - Rückbau Treppenanlage BSTG 3**	Fr, 15.10.27	Fr, 10.12.27	56 Tage	57 Tage	
2.2.1	Sicherung OLA-Mast	Fr, 15.10.27	Fr, 15.10.27	1 Tag	1 Tag	
2.2.2	Sichern der Kabel Gewerke 50 Hz/ LST/ KT	Fr, 15.10.27	Fr, 15.10.27	1 Tag	1 Tag	
2.2.3	Aufbau Arbeits- und Traggerüst Gleis 4	Sa, 16.10.27	Di, 19.10.27	4 Tage	4 Tage	mit Schutzwand
2.2.4	Rückbau Treppenanlage BSTG 3	Mi, 20.10.27	Fr, 19.11.27	30 Tage	31 Tage	
2.2.5	Aufbau Hängegerüst	Sa, 16.10.27	So, 17.10.27	2 Tage	2 Tage	
2.2.6	Bodenaushub Straße Distelbeck	Mo, 18.10.27	Di, 19.10.27	2 Tage	2 Tage	
2.2.7	Rückbau Kammer- und Seitenwände WL	Mi, 20.10.27	Do, 21.10.27	2 Tage	2 Tage	
2.2.8	Ausbetonieren WL / Ertüchtigungsarbeiten	Fr, 22.10.27	Fr, 19.11.27	28 Tage	29 Tage	
2.2.9	Rückbau Hängegerüst	Mo, 22.11.27	Di, 23.11.27	2 Tage	2 Tage	
2.2.10	Wiederherstellung Bahnsteigdach BSTG 3	Sa, 13.11.27	Do, 02.12.27	20 Tage	20 Tage	ggegebenfalls
2.2.11	Wiederherstellung Oberfläche BSTG 3	Mo, 22.11.27	Do, 02.12.27	11 Tage	11 Tage	min. im Gefahrenbereich
2.2.12	Einbau Geländer Distelbeck	Sa, 20.11.27	Do, 02.12.27	13 Tage	13 Tage	
2.2.13	Abbau Mobilkran Distelbeck (3)	Fr, 03.12.27	Fr, 03.12.27	1 Tag	1 Tag	
2.2.14	OLA- Arbeiten Fremdgewerk	Fr, 03.12.27	Fr, 10.12.27	8 Tage	8 Tage	Abstimmung erforderlich wenn Arbeiten bis 10.12 gehen sollen/ müssen
2.2.15	Einbau Info- und Wegeleitsystem	Fr, 03.12.27	Fr, 10.12.27	8 Tage	8 Tage	
2.2.16	Einbau Ausstattungselemente BSTG 3	Fr, 03.12.27	Fr, 10.12.27	8 Tage	8 Tage	
2.3	**Bauphase 3**	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27	12 Tage	12 Tage	
2.3.1	Aufbau Schutzwand an Geländer	Mo, 06.12.27	Di, 07.12.27	2 Tage	2 Tage	
2.3.2	Wiederherstellung/ Anpassung Distelbeck	Mi, 08.12.27	Fr, 17.12.27	10 Tage	10 Tage	
2.4	**Bauphase 4**	Mo, 20.12.27	Fr, 14.01.28	23 Tage	26 Tage	
2.4.1	Beweissicherung Distelbeck	Mo, 20.12.27	Fr, 24.12.27	5 Tage	5 Tage	
2.4.2	Räumen Baustelle	Mo, 03.01.28	Fr, 14.01.28	12 Tage	12 Tage	
2.5	**Bauphase 5 Abnahme Aufzug**	Mo, 03.01.28	Mi, 23.02.28	52 Tage	52 Tage	endgültige Angabe nach Aufzugsplaner
2.5.1	PG2 Pflege - ADAM&GSM-R Bauftragung	Mo, 03.01.28	So, 09.01.28	7 Tage	7 Tage	
2.5.2	Internetprüfung	Mo, 10.01.28	So, 16.01.28	7 Tage	7 Tage	
2.5.3	PVI [ZÜS]	Mo, 17.01.28	Mo, 17.01.28	1 Tag	1 Tag	
2.5.4	Probebetrieb + Erstellung + Dokumentation	Di, 18.01.28	Sa, 22.01.28	5 Tage	5 Tage	
2.5.5	Abnahme Prüfung VOB + Fachtechnische Abnahme	So, 23.01.28	So, 23.01.28	1 Tag	1 Tag	
2.5.6	**Teilinbetriebnahme/ Nutzungsfähiger baulicher Zwischenzustand**	Mo, 24.01.28	Mo, 24.01.28	1 Tag	1 Tag	
2.5.7	Kundenfreigabe/ IBN	So, 23.01.28	Mo, 24.01.28	2 Tage	2 Tage	
2.5.8	**MS Inbetriebnahme erfolgt Kommunizierter Termin**	Mi, 23.02.28	Mi, 23.02.28	1 Tag	1 Tag	

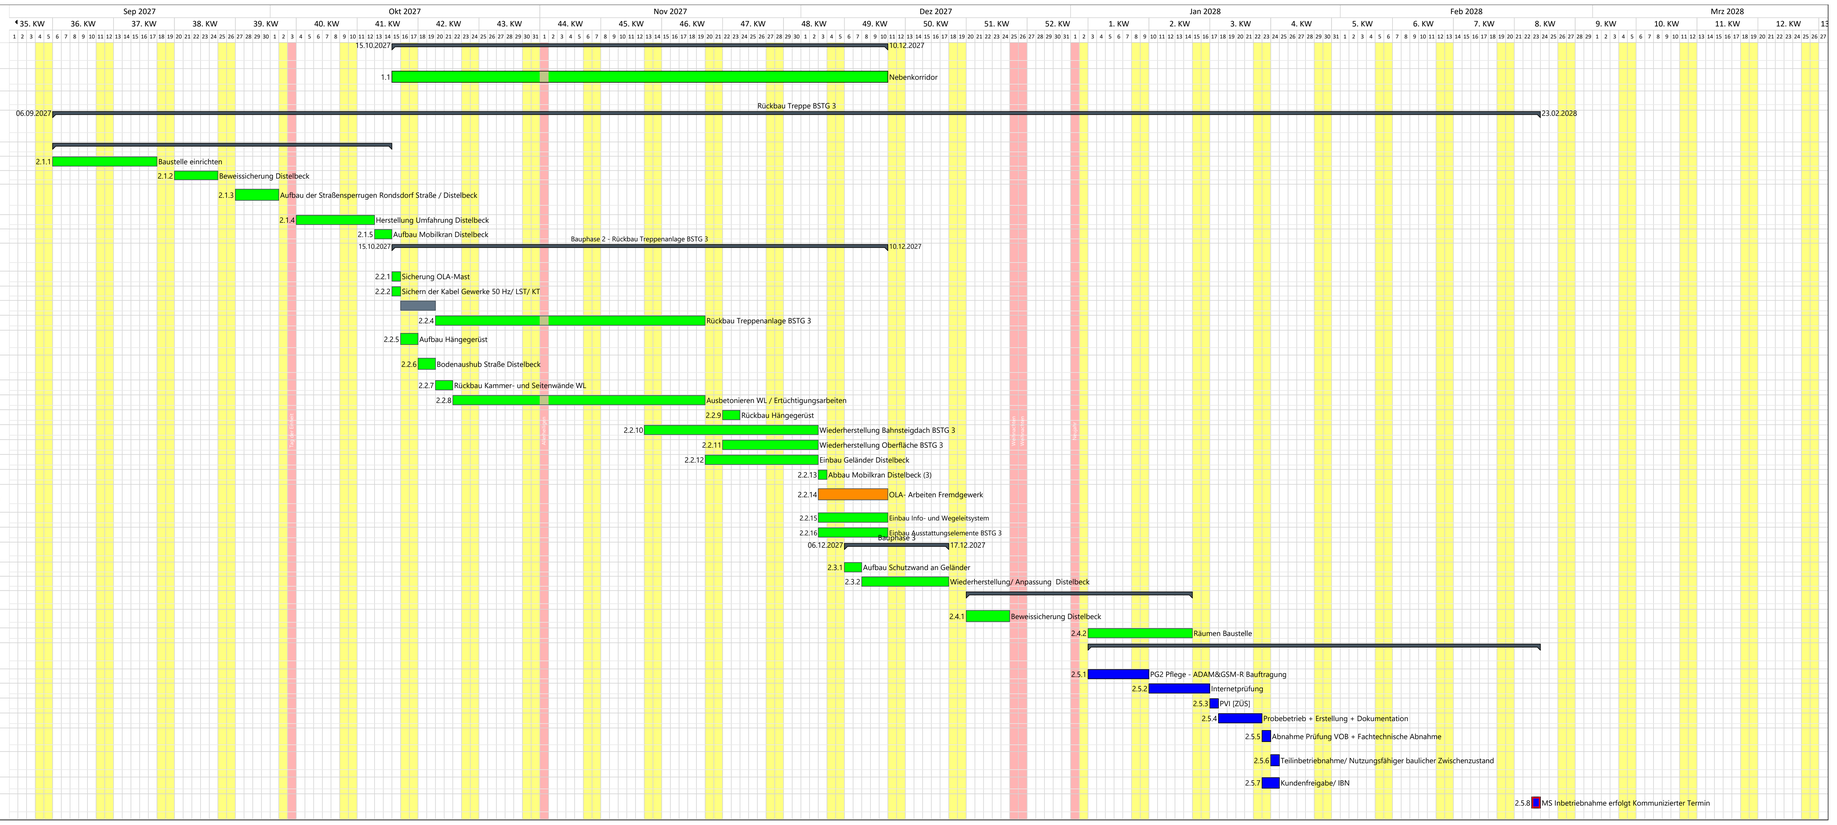

Aufsteller: w+b ingenieure gmbh
an den speichern 5
48157 münster
