Nr.	Vo	Vorgangsname	Anfang	Ende
1		**Tiefbau Grundstück**	**Die 21.10.25**	**Mit 24.06.26**
2		Ausschreibung	Die 21.10.25	Die 20.01.26
3		Durchführung Tiefbauarbeiten (Leitungsbau, Verkehrswege, Außenanlagen)	Don 26.02.26	Mit 24.06.26
4		**Ausschreibung TU**	**Mon 02.02.26**	**Don 08.04.27**
5		**Vorbereitung Ausschreibung TU**	**Mon 02.02.26**	**Fre 27.02.26**
6		Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26
7		Prüfung Ausschreibungsunterlagen und Veröffentlichung Ausschreibung	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26
8		**Durchführung Ausschreibung TU**	**Mon 02.03.26**	**Don 30.07.26**
9		**Teilnahmewettbewerb**	**Mon 02.03.26**	**Don 23.04.26**
10		Erstellung und Abgabe Teilnahmeantrag durch Unternehmen	Mon 02.03.26	Don 02.04.26
11		Auswertung der Anträge und Aufforderung zur Angebotsabgabe	Fre 03.04.26	Don 23.04.26
12		**Angebotsphase**	**Fre 24.04.26**	**Mon 08.06.26**
13		Erstellung Erstangebote durch Unternehmen	Fre 24.04.26	Die 26.05.26
14		Auswertung der Erstangebote	Mit 27.05.26	Mon 08.06.26
15		**Verhandlungsphase**	**Die 09.06.26**	**Mon 15.06.26**
16		Verhandlungen mit den Unternehmen	Die 09.06.26	Mon 15.06.26
17		**Finale Angebotsphase**	**Die 16.06.26**	**Mon 20.07.26**
18		Erstellung finaler Angebote durch Unternehmen	Die 16.06.26	Mon 06.07.26
19		Auswertung der finalen Angebote	Die 07.07.26	Mon 20.07.26
20		Information nichtberücksichtigter Bieter (§134 GWB Schreiben)	Die 21.07.26	Don 30.07.26
21		Bindung TU Kerpen	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
22		**Leistungen TU**	**Mon 03.08.26**	**Don 08.04.27**
23		Planung für Bauleistungen und Entwurfsplanung Container	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
24		Prüfung und Zustimmung zur Entwurfsplanung	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
25		Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
26		Prüfung und Zustimmung zur Ausführungsplanung	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
27		Beantragung und Prüfung Baugenehmigung	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
28		Produktion Container	Mon 23.11.26	Fre 29.01.27
29		**Umsetzung EAE**	**Mit 09.12.26**	**Don 08.04.27**
30		Baustelleneinrichtung	Mit 09.12.26	Fre 18.12.26
31		Lieferung, Aufstellung und Innenausbau Container	Mon 21.12.26	Fre 12.03.27
32		Herstellung Außenanlagen	Mon 15.03.27	Mit 07.04.27
33		Fertigstellung abnahmereif	Don 08.04.27	Don 08.04.27

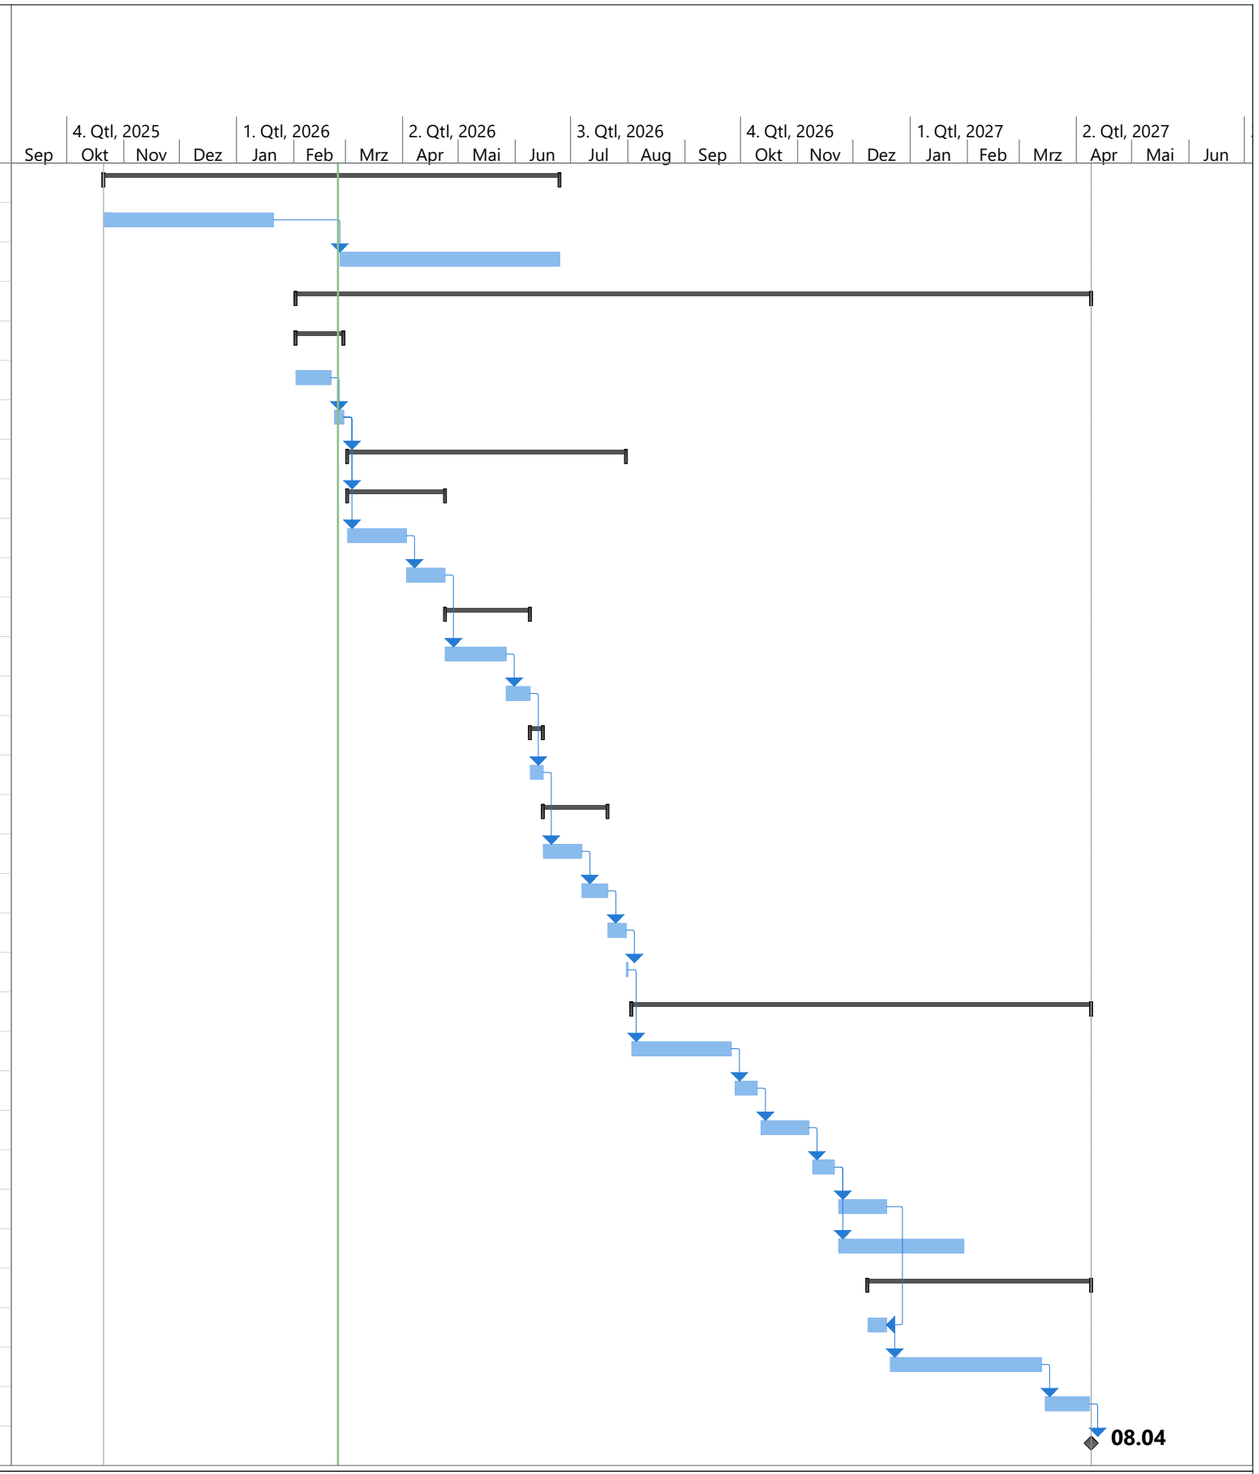

Projekt: EAE Kerpen
Datum: Mit 25.02.26

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			
