Projekt Interimsklassen Kleebachschule
Rahmenterminplan_VORABZUG
Stand Die 03.03.26

Nr.	Vorg	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		**Errichtung von 4 temporären Klassen in 2-geschossiger Containerbauweise, Kleebachschule**					
2		**AUSSCHREIBUNG UND VERGABE**					
3		**LV Fundamente inkl. Erdbau**	**54 Tage**	**Die 03.03.26**	**Don 21.05.26**		
4		LV Erstellung und Abstimmung	10 Tage	Die 03.03.26	Mon 16.03.26	16	
5		**Vergabeverfahren**	**44 Tage**	**Die 17.03.26**	**Don 21.05.26**	**4**	
6		Durchsicht Unterlagen Vergabesstelle	5 Tage	Die 17.03.26	Mon 23.03.26		
7		Veröffentlichung + Fristenentwurf	0 Tage	Mon 23.03.26	Mon 23.03.26	6	
8		Angebotsfrist (min 30 Kalendertage)	21 Tage	Die 24.03.26	Don 23.04.26	7	
9		Submission	0 Tage	Don 23.04.26	Don 23.04.26	8	
10		Prüfphase 1 (Formalprüfung)	3 Tage	Fre 24.04.26	Die 28.04.26	9	
11		Prüfphase 2	4 Tage	Mit 29.04.26	Die 05.05.26	10	
12		Verhandlung/Techn.Klärung/ ggf. Nachforderung (min 6 Kalendertage)	6 Tage	Mit 06.05.26	Mit 13.05.26	11	
13		Erarbeiten Vergabeempfehlung	5 Tage	Fre 15.05.26	Don 21.05.26	12	
14		Vergabe	0 Tage	Don 21.05.26	Don 21.05.26	13	
15		**LV Container inkl. Innenausbau und Dach**	**60 Tage**	**Die 10.02.26**	**Don 07.05.26**		
16		LV Erstellung und Abstimmung	15 Tage	Die 10.02.26	Mon 02.03.26		
17		**Vergabeverfahren**	**45 Tage**	**Die 03.03.26**	**Don 07.05.26**	**16**	
18		Durchsicht Unterlagen Vergabesstelle	5 Tage	Die 03.03.26	Mon 09.03.26		
19		Veröffentlichung + Fristenentwurf	0 Tage	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26	18	
20		Angebotsfrist (min 30 Kalendertage)	21 Tage	Die 10.03.26	Don 09.04.26	19	
21		Submission	0 Tage	Don 09.04.26	Don 09.04.26	20	
22		Prüfphase 1 (Formalprüfung)	3 Tage	Fre 10.04.26	Die 14.04.26	21	
23		Prüfphase 2	4 Tage	Mit 15.04.26	Mon 20.04.26	22	
24		Verhandlung/Techn.Klärung/ ggf. Nachforderung (min 6 Kalendertage)	6 Tage	Die 21.04.26	Die 28.04.26	23	
25		Erarbeiten Vergabeempfehlung	2 Tage	Mit 29.04.26	Don 30.04.26	24	
26		Unterschrift Stadt Aaachen	2 Tage	Mon 04.05.26	Die 05.05.26	25	
27		Prüfung RPA	2 Tage	Mit 06.05.26	Don 07.05.26	26	
28		Vergabe	0 Tage	Don 07.05.26	Don 07.05.26	27	
29		**LV Treppenhäuser**	**61 Tage**	**Die 17.03.26**	**Mit 17.06.26**		
30		LV Erstellung und Abstimmung	15 Tage	Die 17.03.26	Mit 08.04.26	4	
31		**Vergabeverfahren**	**46 Tage**	**Don 09.04.26**	**Mit 17.06.26**	**30**	
32		Durchsicht Unterlagen Vergabesstelle	5 Tage	Don 09.04.26	Mit 15.04.26		
33		Veröffentlichung + Fristenentwurf	0 Tage	Mit 15.04.26	Mit 15.04.26	32	
34		Angebotsfrist (min 30 Kalendertage)	21 Tage	Don 16.04.26	Mon 18.05.26	33	
35		Submission	0 Tage	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	34	
36		Prüfphase 1 (Formalprüfung)	4 Tage	Die 19.05.26	Fre 22.05.26	35	
37		Prüfphase 2	5 Tage	Die 26.05.26	Mon 01.06.26	36	
38		Verhandlung/Techn.Klärung/ ggf. Nachforderung (min 6 Kalendertage)	6 Tage	Die 02.06.26	Mit 10.06.26	37	
39		Erarbeiten Vergabeempfehlung	5 Tage	Don 11.06.26	Mit 17.06.26	38	
40		Vergabe	0 Tage	Mit 17.06.26	Mit 17.06.26	39	
41		**LV Küche**	**56 Tage**	**Don 09.04.26**	**Mit 01.07.26**		
42		LV Erstellung und Abstimmung	10 Tage	Don 09.04.26	Mit 22.04.26	30	
43		**Vergabeverfahren**	**46 Tage**	**Don 23.04.26**	**Mit 01.07.26**	**42**	
52		Vergabe	0 Tage	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	51	
53		**LV Freianlagen**	**60 Tage**	**Don 23.04.26**	**Die 21.07.26**		
54		LV Erstellung und Abstimmung	14 Tage	Don 23.04.26	Mit 13.05.26	42	
55		**Vergabeverfahren**	**46 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Die 21.07.26**		
64		Vergabe	0 Tage	Die 21.07.26	Die 21.07.26	63	
65		**AUSFÜHRUNG**					
66		Erstellung Infrastruktur/ Versorgungskanal/ Baustelleneinrichtung	15 Tage	Mon 11.05.26	Die 02.06.26		
67		Vorlauf/ Arbeitsvorbereitung Rohbau Fundamente inkl. Statik	25 Tage	Mit 01.07.26	Die 04.08.26	14;66;71	
68		Erstellung Fundamente	15 Tage	Mit 05.08.26	Die 25.08.26	67;66	
69		Aushärtung Fundamente bis zur vollständigen Belastbarkeit	20 Tage	Mit 26.08.26	Die 22.09.26	68	
70		Erstellung WM-Planung Container + Nachweise inkl. Freigabe	30 Tage	Fre 08.05.26	Die 23.06.26	28	
71		Freigabe WM-Planung AG inkl. Abstimmung kleinere Punkte	5 Tage	Mit 24.06.26	Die 30.06.26	70	
72		Fertigung/ Arbeitsvorbereitung Container	65 Tage	Mit 01.07.26	Die 29.09.26	71	
73		Errichtung Container	4 Tage	Mit 30.09.26	Mon 05.10.26	72;69	
74		Ausbau Container inkl. Dach inkl. Sockelblende	20 Tage	Die 06.10.26	Mon 02.11.26	73	
75		Errichtung Küche	5 Tage	Die 03.11.26	Mon 09.11.26	52;74	
76		Fertigung/ Arbeitsvorbereitung Stahlbau	25 Tage	Don 18.06.26	Mit 22.07.26	40	
77		Erstellung Treppenhäuser	15 Tage	Mit 07.10.26	Die 27.10.26	73EA+1 Tag;76	
78		Erstellung Freianlagen	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	64;77EA-5 Tage;7	
79		Abnahme	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	78	
80		Übergabe an Nutzer	0 Tage	Fre 27.11.26	Fre 27.11.26	79	
81		Einrichtung durch den Nutzer	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	80	
82		Start Betrieb	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26	81	

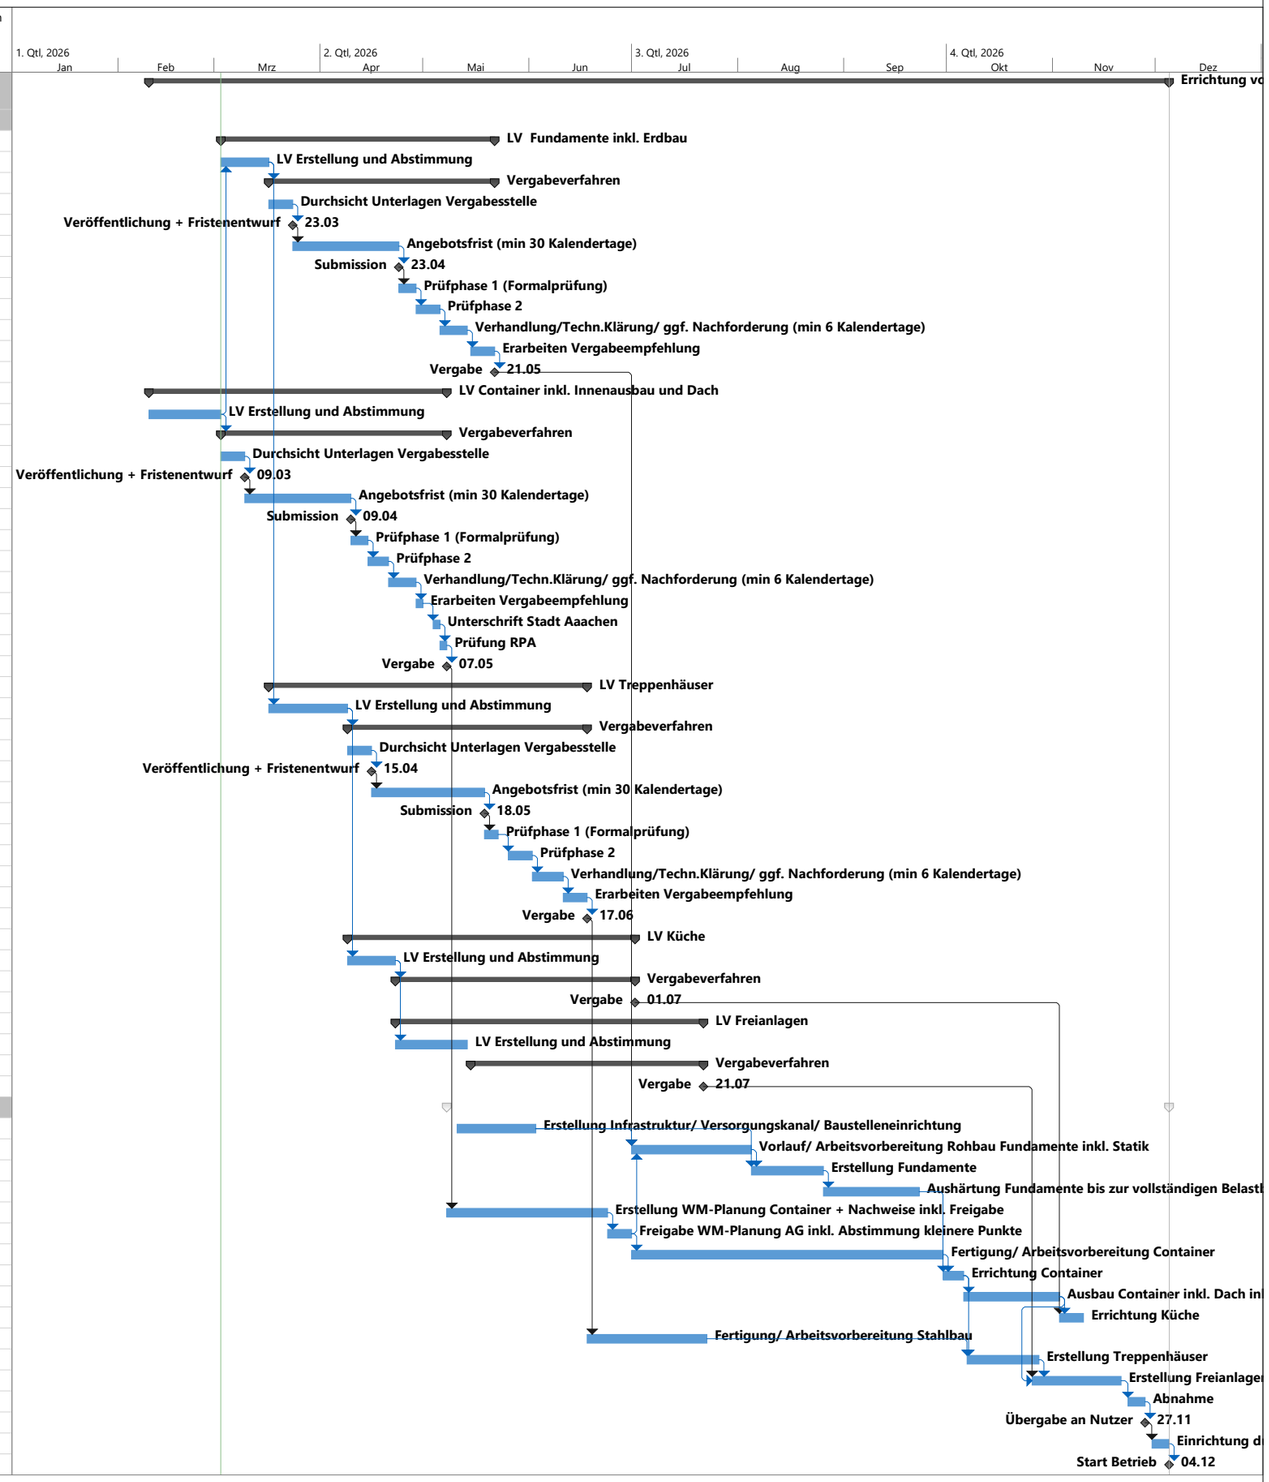

Projekt: Interimskl. Kleebachsc
Datum: Die 03.03.26

Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit	
