Anlage 02

RAHMENTERMINPLAN

2317-FRE Neubau Kita Freckenhorst
Stadt Warendorf

Aktivität	Start Date	Finish Date
Projektenwicklung /	**02.06.2025**	**14.07.2025**
Projektstart	10.07.2024	10.07.2024
Baubeschluß	20.09.2024	20.09.2024
Baugenehmigung	**02.06.2025**	**14.07.2025**
Dauer Genehmigungsverf.	02.06.2025	14.07.2025
Planung Architekt	**01.05.2025**	**09.10.2025**
Vorentwurf		
Entwurf		
Pläne an Vermesser		
Genehmigung	01.05.2025	02.06.2025
Bauantrag	02.06.2025	02.06.2025
Ausführungsplanung	02.06.2025	09.10.2025
Vorb. der Vergabe	01.05.2025	02.06.2025
Bieterkalkulation	02.06.2025	15.07.2025
Mitw. b. d. Vergabe	16.07.2025	12.08.2025
FP Haustechnik	**15.07.2024**	**18.11.2025**
Vorentwurf	15.07.2024	19.07.2024
Entwurf	22.07.2024	01.05.2025
Bauantrag	02.06.2025	02.06.2025
S+D-Pläne	01.08.2025	15.08.2025
Ausführungsplanung	02.06.2025	29.08.2025
Vorb. der Vergabe	15.08.2025	19.09.2025
Bieterkalkulation	22.09.2025	31.10.2025
Mitw. b. d. Vergabe	03.11.2025	18.11.2025
FP Statik	**19.09.2024**	**08.07.2025**
Vorentwurf	19.09.2024	04.10.2024
Entwurf	03.10.2024	01.05.2025
Genehmigung	01.05.2025	02.06.2025
Prüfstatik	02.06.2025	07.07.2025
Ausführungsplanung S+B	02.06.2025	08.07.2025
FP Schall / Wärme / BS	**23.09.2024**	**02.06.2025**
Warmeschutz NW	23.09.2024	26.11.2024
Schallschutz NW / Akustik	23.09.2024	26.11.2024
Brandschutzkonzept	26.09.2024	02.06.2025
FP Aussenanlagen	**26.09.2024**	**08.09.2025**
Entwurf	26.09.2024	01.05.2025
Ausführungspl.	02.05.2025	08.09.2025
Ausschreibung		
DGNB Vorbemerkungen	**23.06.2025**	**23.06.2025**
Architekt: Rohbau, Holzbau, Fenster, Dach	**23.06.2025**	**25.06.2025**
TGA: Blitzschutz und Erdung	26.05.2025	24.06.2025
Kalkulationszeit bis Auftrag	**26.06.2025**	**19.09.2025**
TGA: HLS	**09.06.2025**	**18.09.2025**
TGA: Elektro	**09.06.2025**	**18.09.2025**
Kalkulationszeit bis Auftrag	**19.09.2025**	**19.12.2025**
Aussenanlagen	02.07.2025	31.10.2025
Kalkulationszeit bis Auftrag	17.11.2025	30.01.2026
Sommerferien NRW 2025	**14.07.2025**	**26.08.2025**
Sommerferien NRW 2026	**20.07.2026**	**01.09.2026**
::::::AUSFÜHRUNG::::::		
ROHBAU	**22.10.2025**	**03.02.2026**
Vorlauf Rohbaufirma	22.10.2025	19.11.2025
Grundleitungen	20.11.2025	04.12.2025
Sohle	04.12.2025	23.12.2025
Sockel	23.12.2025	05.01.2026
Auschalzeit Sockel	05.01.2026	21.01.2026
Abdichtung Sohle	21.01.2026	03.02.2026
Fassadengerüst	**23.02.2026**	**21.05.2026**
Aufbau	23.02.2026	05.03.2026
Vorhaltung	09.03.2026	21.05.2026
Blitzschutz	**19.11.2025**	**06.07.2026**
Sohle	19.11.2025	01.12.2025
Fassade	25.05.2026	03.06.2026
Dach	23.06.2026	06.07.2026
HOLZBAU	**05.11.2025**	**31.07.2026**
Holzbau Werkplanung	05.11.2025	07.01.2026
FERTIGUNG	08.01.2026	05.03.2026
MONTAGE	**04.02.2026**	**18.03.2026**
Abschnitt 1	04.02.2026	19.02.2026
Abschnitt 2	20.02.2026	12.03.2026
Abschnitt 3	12.03.2026	18.03.2026
Aussenabdichtung Sockel	09.04.2026	20.04.2026
Beton Sockel	22.04.2026	05.05.2026
Schalung Fassade	06.05.2026	09.06.2026
GK / Innen	22.04.2026	13.05.2026
GK /GK Flankendämmung	22.04.2026	13.05.2026
Holz / Innen Wand	17.06.2026	31.07.2026
Holz / Innen Decke	17.06.2026	31.07.2026
Dachdecker-/	**16.03.2026**	**16.06.2026**
Flachdach / Sattel Not	16.03.2026	24.04.2026
Flachdach	09.04.2026	18.05.2026
Metalldächer	13.05.2026	16.06.2026
Gründach	25.05.2026	05.06.2026
Attika	20.05.2026	09.06.2026
Fenster u. Fassaden	**24.11.2025**	**29.06.2026**
Werkplanung baufrei	24.11.2025	25.12.2025
Fenster	30.03.2026	27.04.2026
Türen	28.04.2026	14.05.2026
Sonnenschutz	10.06.2026	29.06.2026
Gebäude GESCHLOSSEN	**06.05.2026**	**06.05.2026**
Trockenbau	**22.04.2026**	**13.07.2026**
Vorsatzschalen Schienen	22.04.2026	12.05.2026
Vorsatzschalen schliessen	03.06.2026	23.06.2026
Akustikdecken UK	03.06.2026	22.06.2026
Akustikdecken schliessen	24.06.2026	13.07.2026
Estricharbeiten	**08.04.2026**	**11.06.2026**
Dämmung	08.04.2026	23.04.2026
FBH _ Schleifen	20.04.2026	30.04.2026
Estrich Bereich 1	30.04.2026	11.05.2026
Estrich Bereich 2+3	13.05.2026	20.05.2026
Begehbar B1	13.05.2026	13.05.2026
Begehbar B 2+3	20.05.2026	20.05.2026
Aufheizprotokoll B1	11.05.2026	01.06.2026
Aufheizprotokoll B2+3	21.05.2026	11.06.2026
Fliesenarbeiten	**15.06.2026**	**17.07.2026**
Wand / Boden	15.06.2026	17.07.2026
Malerarbeiten	**24.06.2026**	**11.08.2026**
Türen	**24.06.2026**	**10.08.2026**
Stockzargentüren/Innenfenster	24.06.2026	21.07.2026
Türblätter	21.07.2026	28.07.2026
Sondertüren T 30 Türen	21.07.2026	10.08.2026
Oberboden	**01.06.2026**	**23.06.2026**
Bereich 1	01.06.2026	09.06.2026
Bereich 2+3	10.06.2026	23.06.2026
Hausanschlüße	**31.12.2025**	**30.01.2026**
Anträge		
Anschluß	31.12.2025	30.01.2026
Elektro	**02.02.2026**	**14.08.2026**
optional Einbau ELT im Werk	02.02.2026	06.04.2026
roh Sohle / Wände / Decke vor	19.02.2026	05.05.2026
fein	17.06.2026	14.08.2026
PV Dach	17.06.2026	29.06.2026
Sanitär/Heizung	**19.02.2026**	**14.08.2026**
Heizung fertig / Aufheizen	16.04.2026	16.04.2026
roh 1 Sohle / Decke	19.02.2026	08.04.2026
FBH Schleifen	30.03.2026	09.04.2026
roh 2 nach Estrich	22.04.2026	12.05.2026
fein	01.07.2026	14.08.2026
RLT	19.02.2026	16.07.2026
Gebäude Innen 1/2	19.02.2026	21.04.2026
Geräte Dach	20.05.2026	23.06.2026
Fein RLT	01.07.2026	14.08.2026
Tischler	**15.07.2026**	**31.08.2026**
WC Trennwände	15.07.2026	28.07.2026
Wickeltische	17.08.2026	31.08.2026
Garderoben	17.08.2026	31.08.2026
Anlieferung/Aufbau Küche	**02.09.2026**	**16.09.2026**
DGNB Raumluftmessung - 4	**31.08.2026**	**29.09.2026**
Anlieferung/Aufbau Möbel	**01.10.2026**	**15.10.2026**
Grundreinigung	**26.08.2026**	**01.09.2026**
Aussenanlagen	**16.04.2026**	**14.08.2026**
Gewerkeabnahmen	**01.09.2026**	**04.09.2026**
Mängelbeseitigung Gewerke	**01.09.2026**	**15.09.2026**
Abnahme Bauordnungsamt	**15.09.2026**	**15.09.2026**
Abnahme SV RLT	**19.08.2026**	**25.08.2026**
Abnahme SV ELT	**19.08.2026**	**25.08.2026**
Sonstige GUV / Trinkwasser	**05.08.2026**	**11.08.2026**
Beginn Kindergartenjahr	**01.09.2026**	**01.09.2026**
Baubeginn:	**01.10.2025**	**01.10.2025**
Bezugsfertig:	**15.10.2026**	**15.10.2026**

Minimum: 10.07.2024 Maximum: 15.10.2026

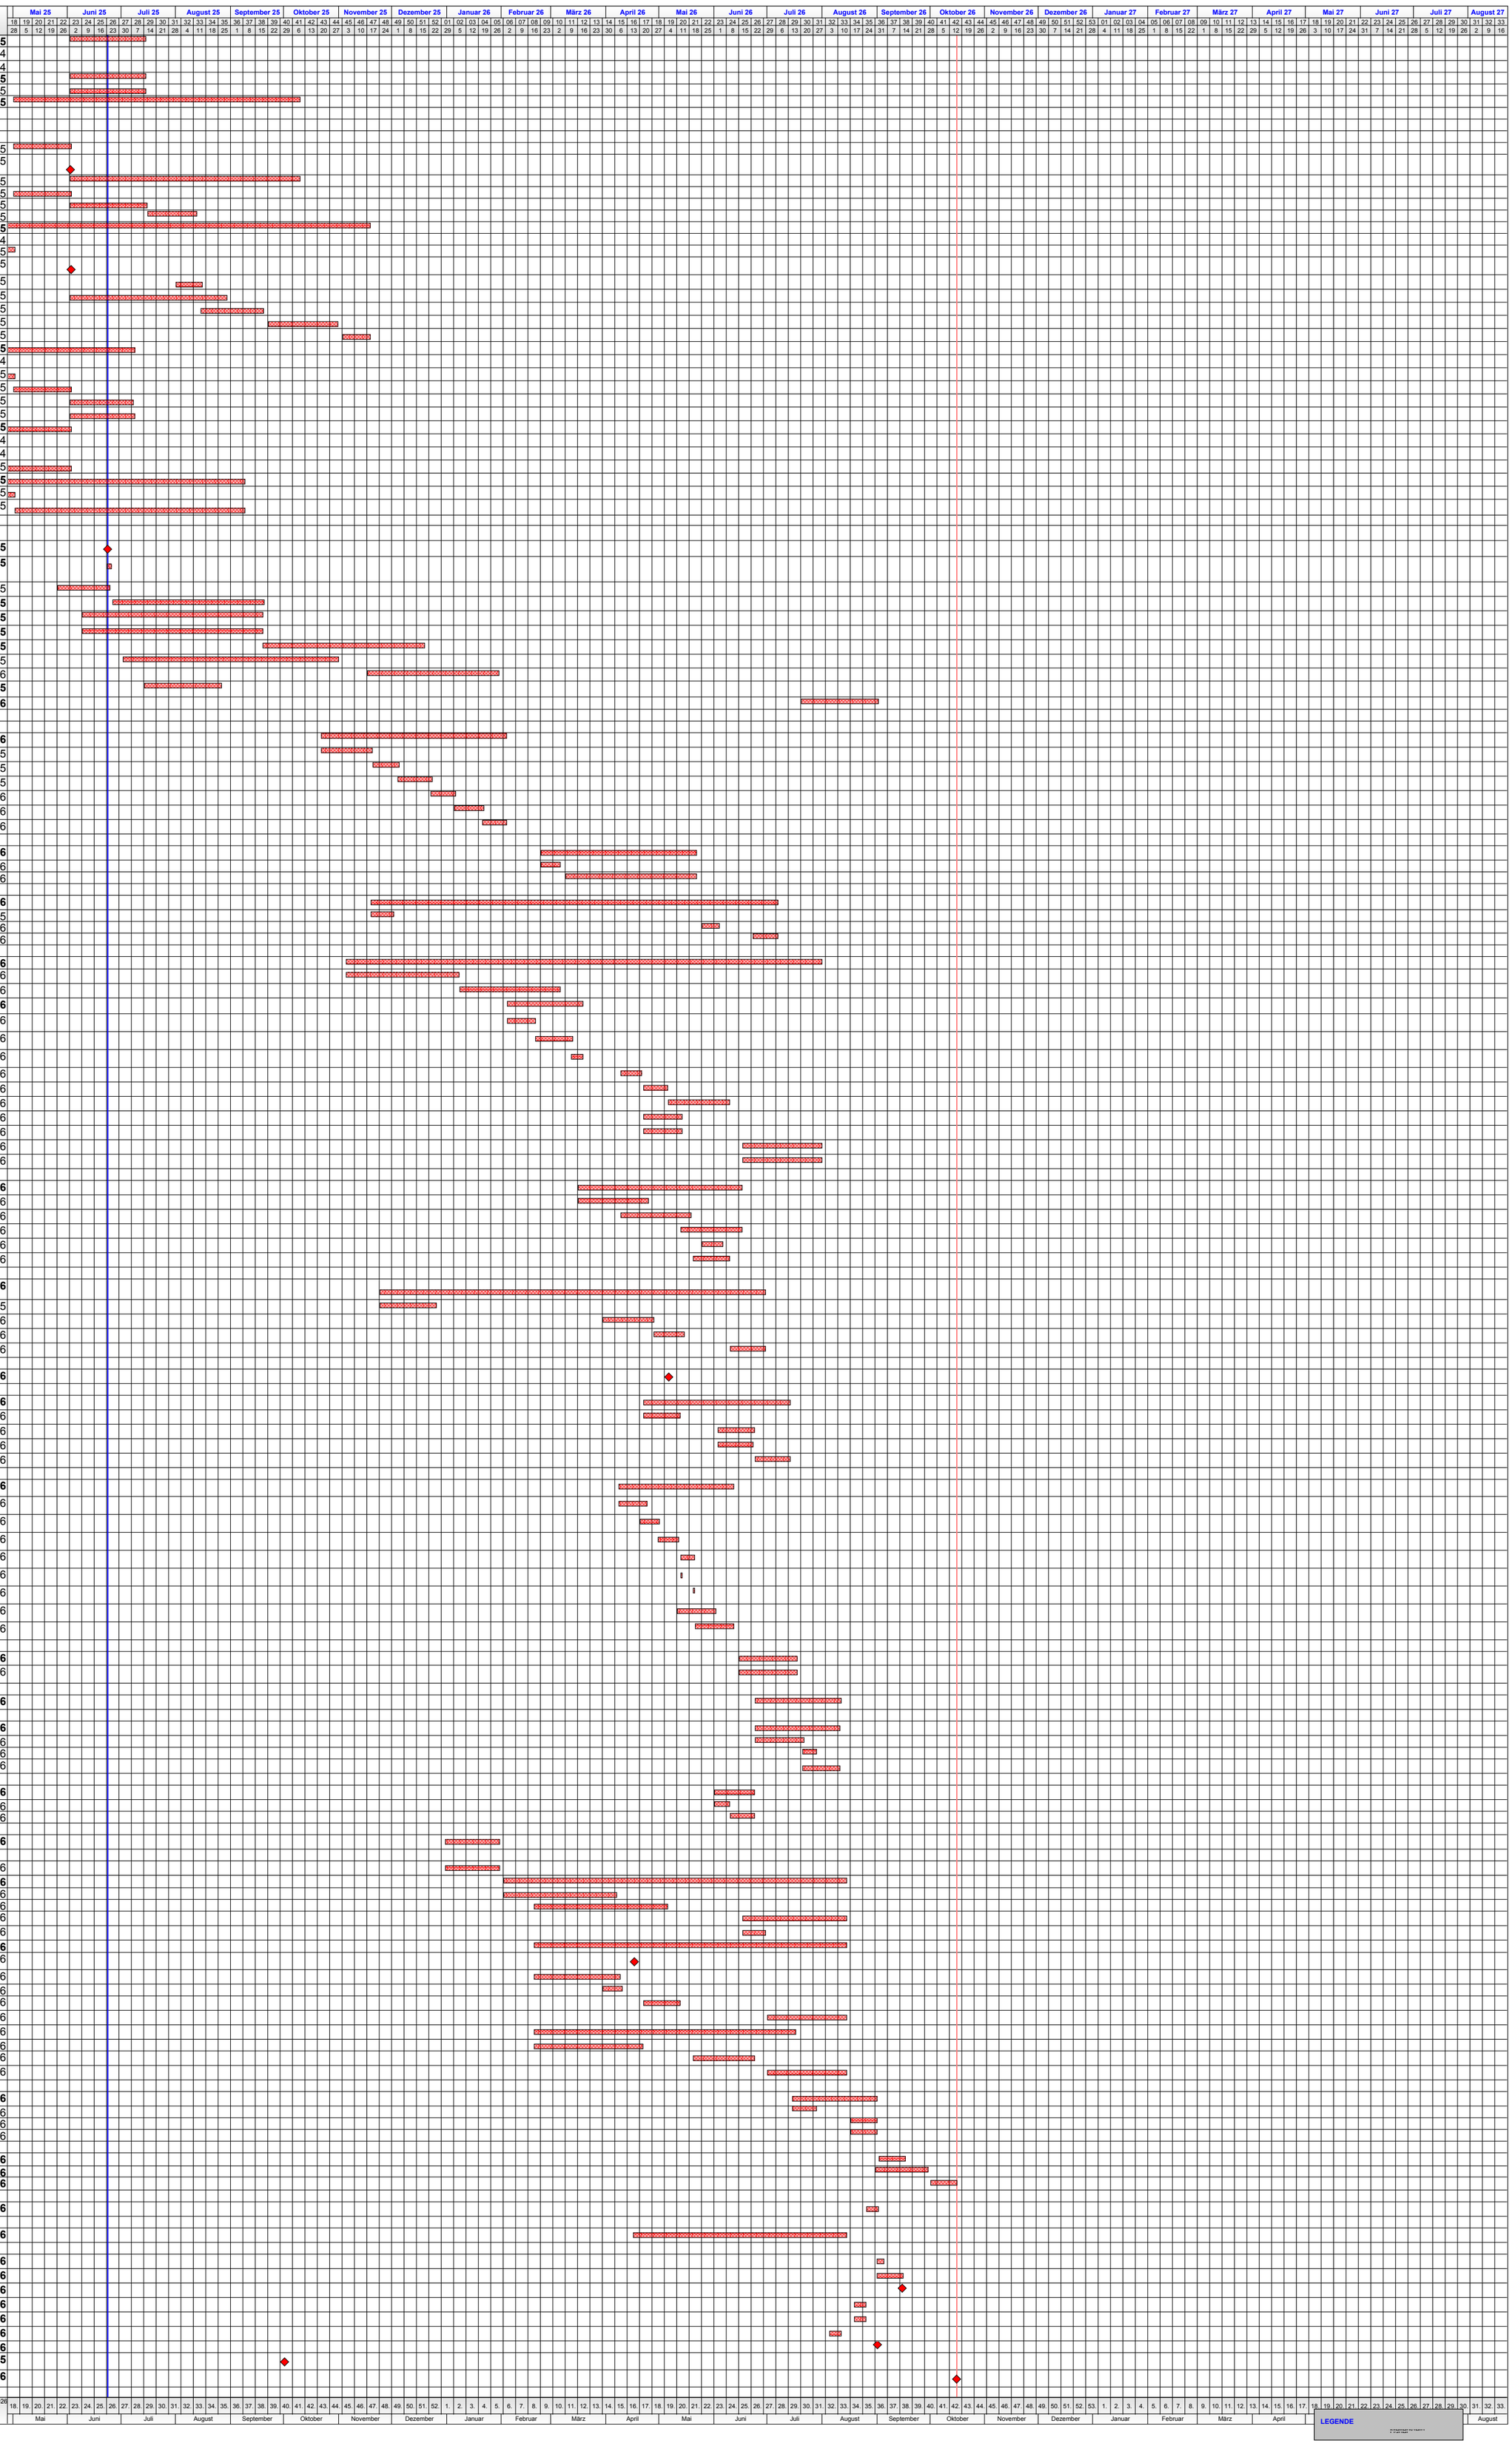

Verteiler: nn --.--.--
Index:

2317_A01-RTMP250622.fts
23. Jun. 2025

Plannr.: 2317/A01
