RAHMENTERMINPLAN

Index: 04 Vorabzug
Stand: Di 16.09.25

NFM - Neubau Feuerwehr Möglingen
Vorabzug
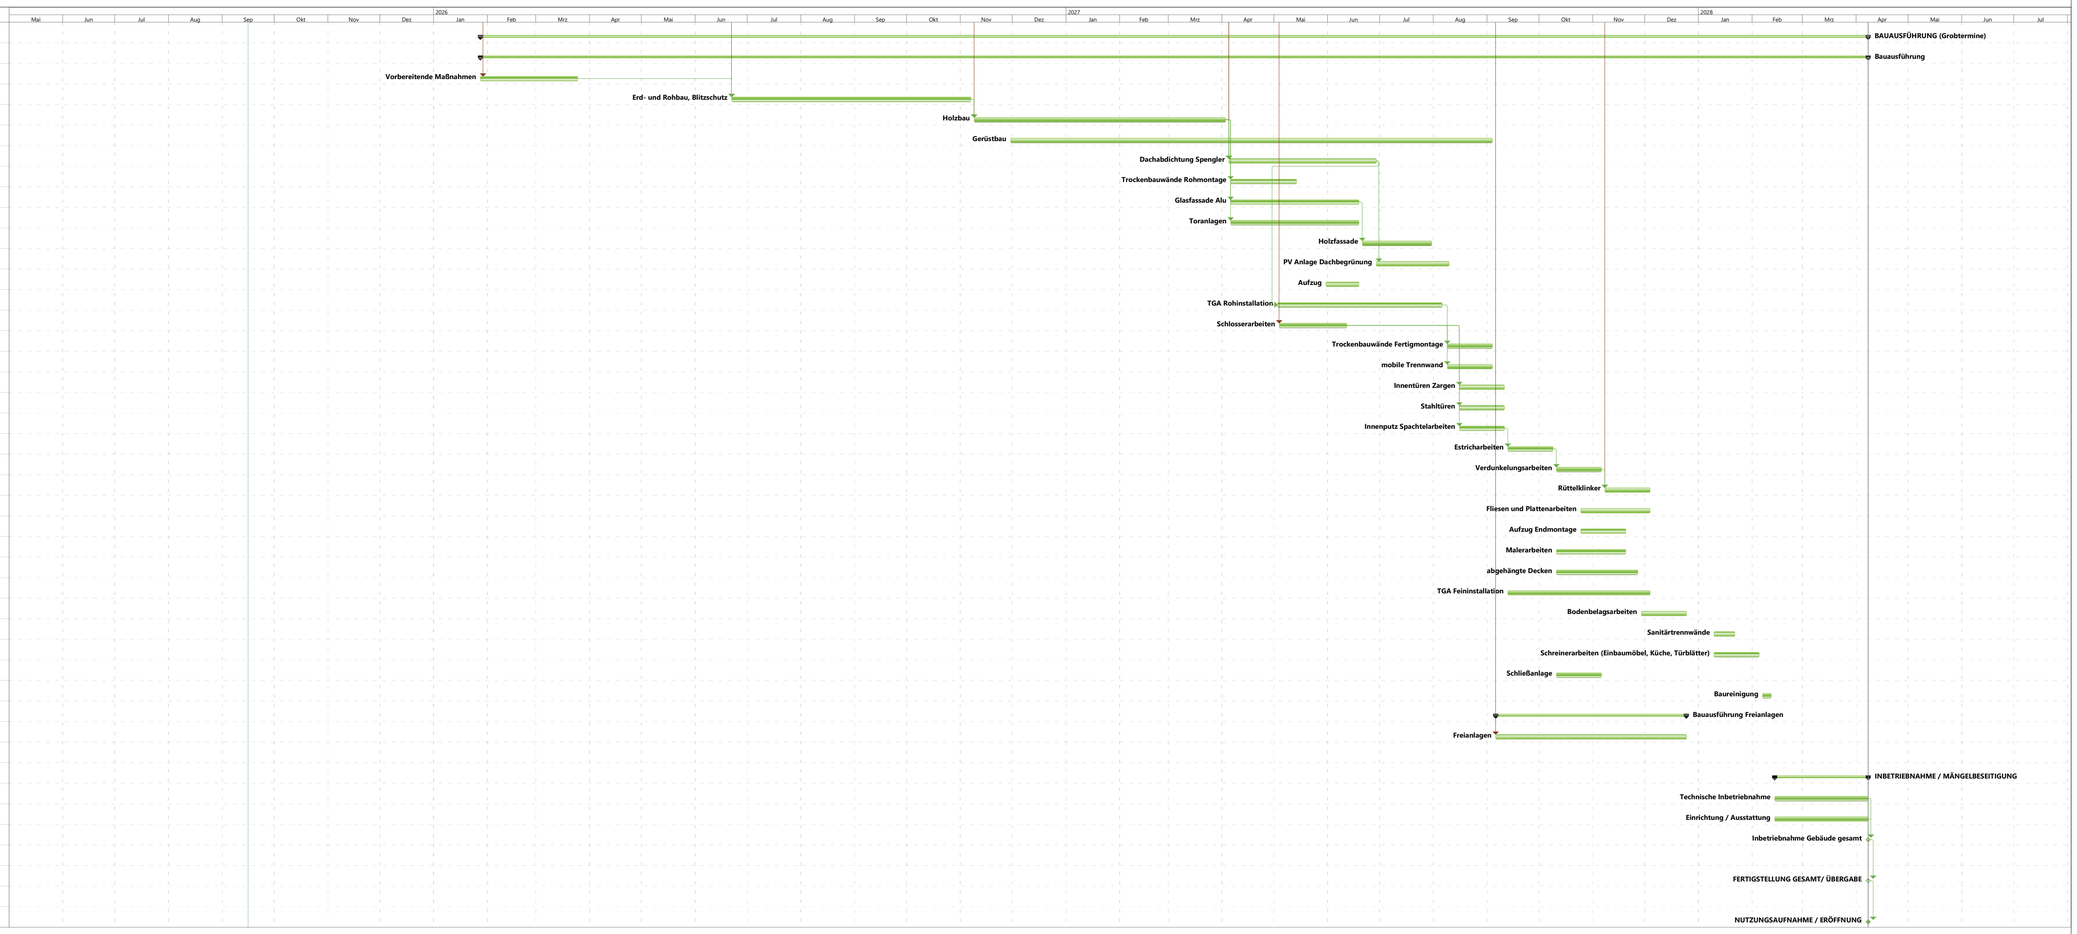
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
229	**11 BAUAUSFÜHRUNG (Grobtermine)**	**561 Tage**	**Mi 28.01.26**	**Fr 07.04.28**
230	**11.1 Bauausführung**	**561 Tage**	**Mi 28.01.26**	**Fr 07.04.28**
231	11.1.1 Vorbereitende Maßnahmen	2 Monate	Mi 28.01.26	Di 24.03.26
232	11.1.2 Erd- und Rohbau, Blitzschutz	5 Monate	Mo 22.06.26	Fr 06.11.26
233	11.1.3 Holzbau	5 Monate	Mo 09.11.26	Fr 02.04.27
234	11.1.4 Gerüstbau	194 Tage	Mo 30.11.26	Fr 03.09.27
235	11.1.5 Dachabdichtung Spengler	3 Monate	Mo 05.04.27	Mo 28.06.27
236	11.1.6 Trockenbauwände Rohmontage	1,4 Monate	Di 06.04.27	Do 13.05.27
237	11.1.7 Glasfassade Alu	2,65 Monate	Di 06.04.27	Fr 18.06.27
238	11.1.8 Toranlagen	2,65 Monate	Di 06.04.27	Fr 18.06.27
239	11.1.9 Holzfassade	1,5 Monate	Mo 21.06.27	Fr 30.07.27
240	11.1.10 PV Anlage Dachbegrünung	1,5 Monate	Di 29.06.27	Mo 09.08.27
241	11.1.11 Aufzug	0,75 Monate	Mo 31.05.27	Fr 18.06.27
242	11.1.12 TGA Rohinstallation	3,4 Monate	Mo 03.05.27	Do 05.08.27
243	11.1.13 Schlosserarbeiten	1,4 Monate	Di 04.05.27	Fr 11.06.27
244	11.1.14 Trockenbauwände Fertigmontage	1 Monat	Mo 09.08.27	Fr 03.09.27
245	11.1.15 mobile Trennwand	1 Monat	Mo 09.08.27	Fr 03.09.27
246	11.1.16 Innentüren Zargen	1 Monat	Mo 16.08.27	Fr 10.09.27
247	11.1.17 Stahltüren	1 Monat	Mo 16.08.27	Fr 10.09.27
248	11.1.18 Innenputz Spachtelarbeiten	1 Monat	Mo 16.08.27	Fr 10.09.27
249	11.1.19 Estricharbeiten	1 Monat	Mo 13.09.27	Fr 08.10.27
250	11.1.20 Verdunkelungsarbeiten	1 Monat	Mo 11.10.27	Fr 05.11.27
251	11.1.21 Rüttelklinker	1 Monat	Mo 08.11.27	Fr 03.12.27
252	11.1.22 Fliesen und Plattenarbeiten	1,5 Monate	Mo 25.10.27	Fr 03.12.27
253	11.1.23 Aufzug Endmontage	1 Monat	Mo 25.10.27	Fr 19.11.27
254	11.1.24 Malerarbeiten	1,5 Monate	Mo 11.10.27	Fr 19.11.27
255	11.1.25 abgehängte Decken	1,75 Monate	Mo 11.10.27	Fr 26.11.27
256	11.1.26 TGA Feininstallation	3 Monate	Mo 13.09.27	Fr 03.12.27
257	11.1.27 Bodenbelagsarbeiten	1 Monat	Mo 29.11.27	Fr 24.12.27
258	11.1.28 Sanitärtrennwände	0,5 Monate	Mo 10.01.28	Fr 21.01.28
259	11.1.29 Schreinerarbeiten (Einbaumöbel, Küche, Türblätter)	1 Monat	Mo 10.01.28	Fr 04.02.28
260	11.1.30 Schließanlage	1 Monat	Mo 11.10.27	Fr 05.11.27
261	11.1.31 Baureinigung	0,25 Monate	Mo 07.02.28	Fr 11.02.28
262	**11.2 Bauausführung Freianlagen**	**80 Tage**	**Mo 06.09.27**	**Fr 24.12.27**
263	11.2.1 Freianlagen	4 Monate	Mo 06.09.27	Fr 24.12.27
264				
265	**12 INBETRIEBNAHME / MÄNGELBESEITIGUNG**	**40 Tage**	**Mo 14.02.28**	**Fr 07.04.28**
266	12.1 Technische Inbetriebnahme	2 Monate	Mo 14.02.28	Fr 07.04.28
267	12.2 Einrichtung / Ausstattung	2 Monate	Mo 14.02.28	Fr 07.04.28
268	12.3 Inbetriebnahme Gebäude gesamt	0 Tage	Fr 07.04.28	Fr 07.04.28
269				
270	**13 FERTIGSTELLUNG GESAMT/ ÜBERGABE**	**0 Tage**	**Fr 07.04.28**	**Fr 07.04.28**
271				
272	**14 NUTZUNGSAUFNAHME / ERÖFFNUNG**	**0 Tage**	**Fr 07.04.28**	**Fr 07.04.28**
