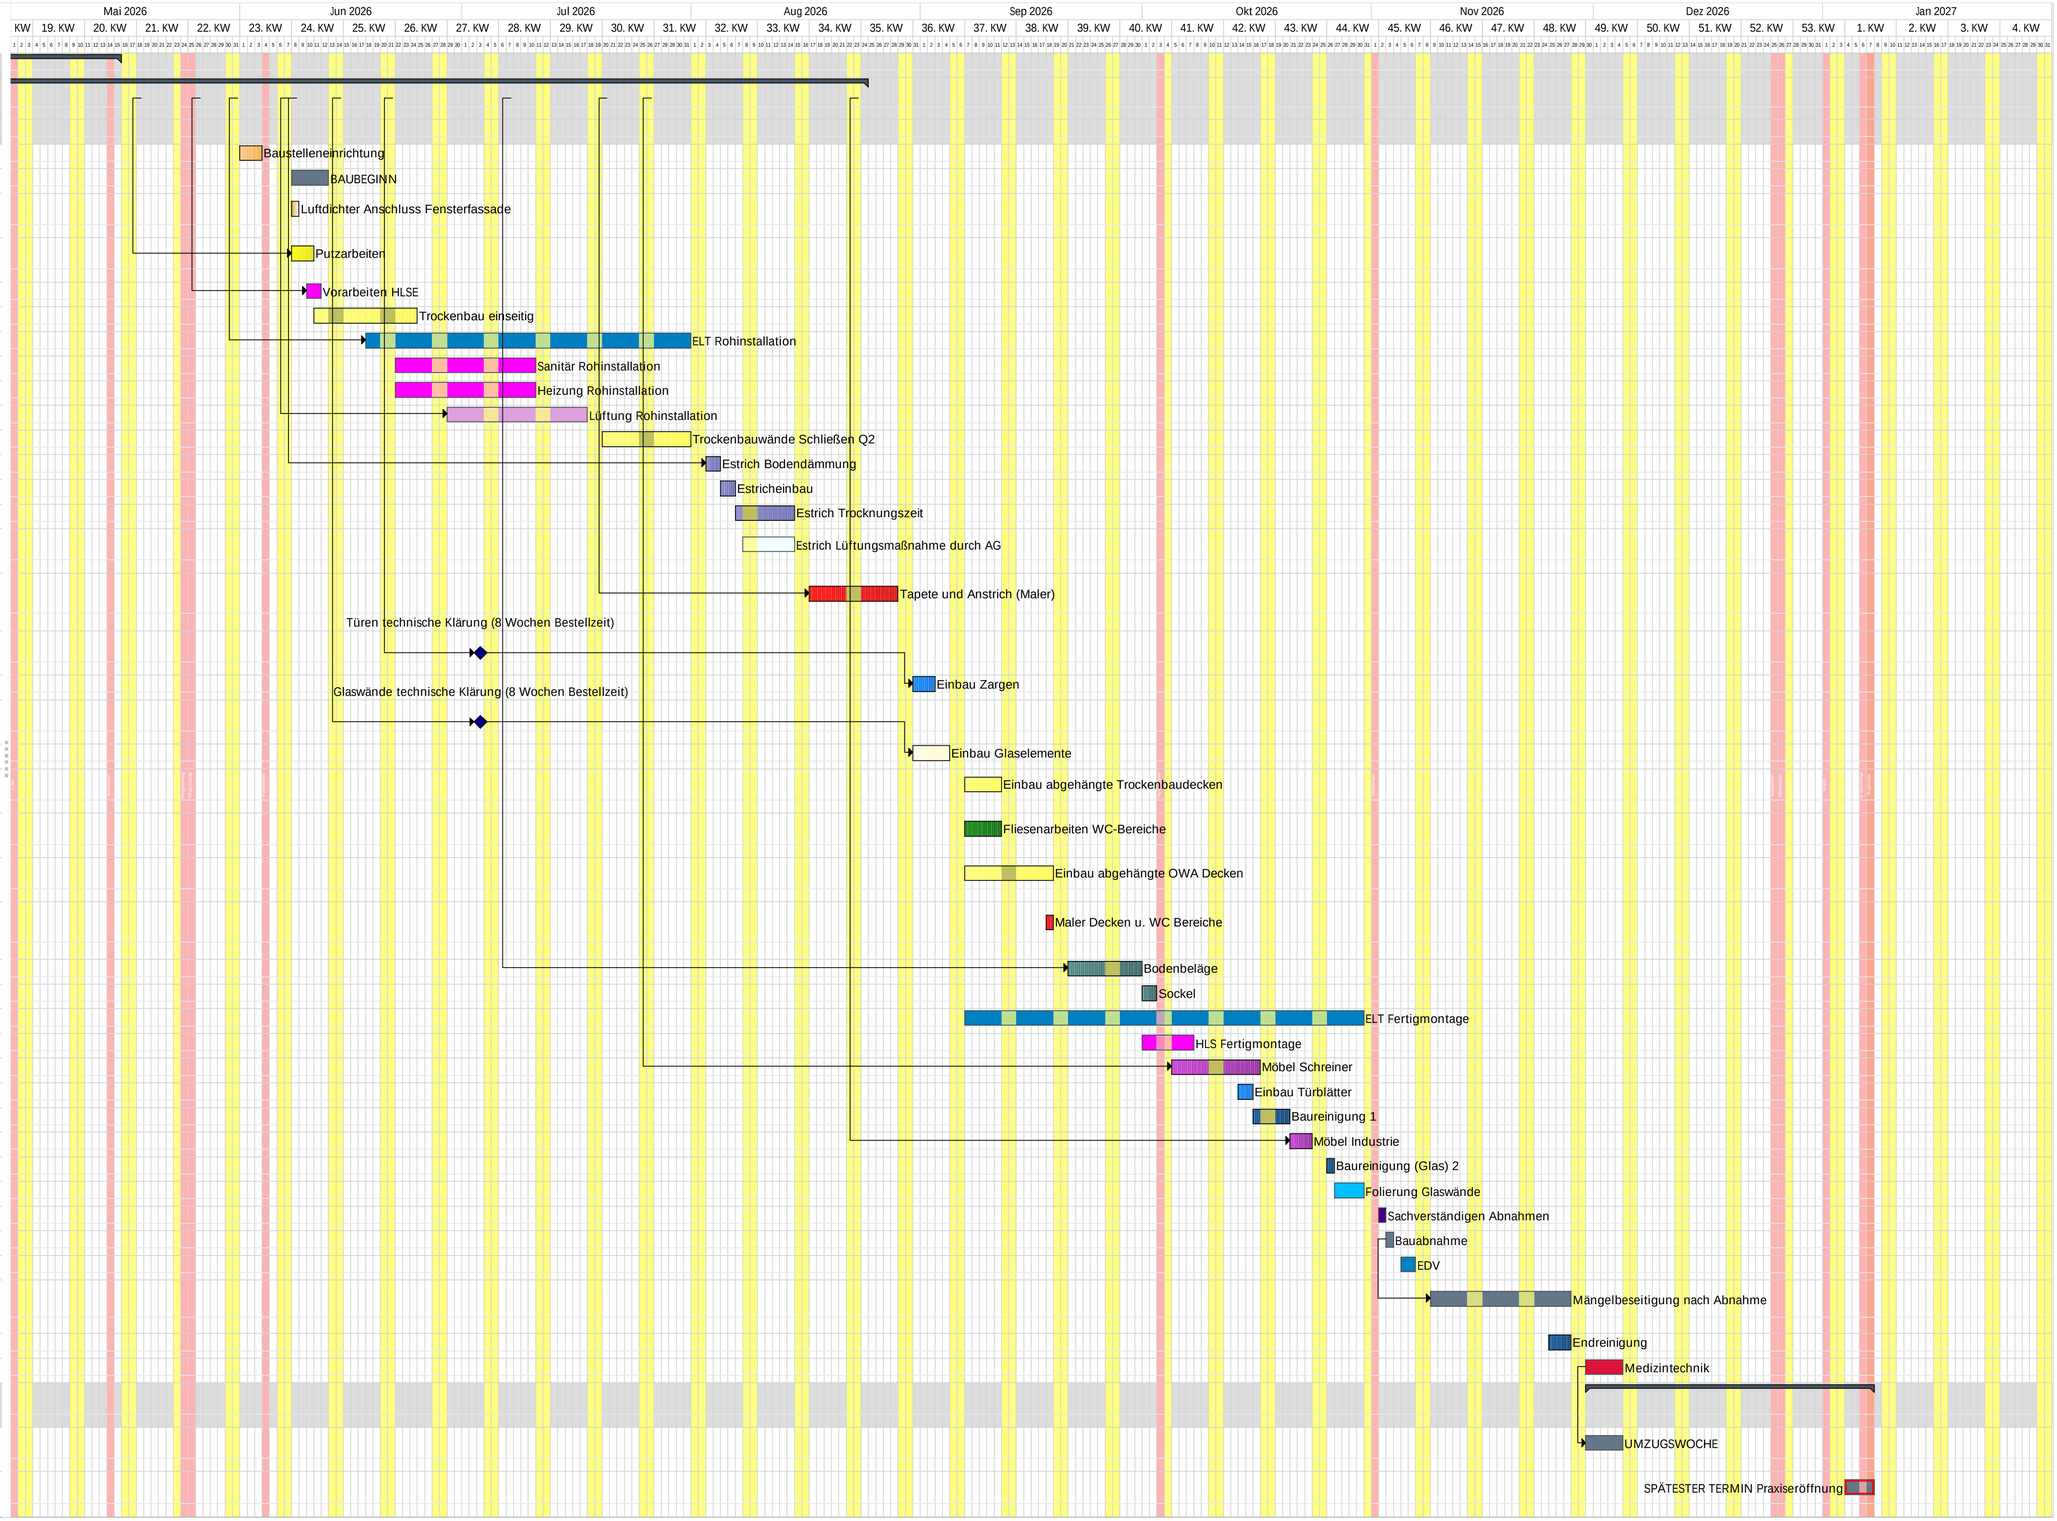Nr	Name	Anfang	Ende
1	⊞ Planung der Planung	Mi, 11.02.26	Fr, 15.05.26
7	⊞ LPH 6,7 Ausschreibung und Vergabe	Mo, 23.03.26	Mo, 24.08.26
25	LPH 8 Bauausführung		
26	Baustelleneinrichtung	Mo, 01.06.26	Mi, 03.06.26
27	BAUBEGINN	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26
28	Luftdichter Anschluss Fensterfassade	Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26
29	Putzarbeiten	Mo, 08.06.26	Mi, 10.06.26
30	Vorarbeiten HLSE	Mi, 10.06.26	Do, 11.06.26
31	Trockenbau einseitig	Do, 11.06.26	Mi, 24.06.26
32	ELT Rohinstallation	Do, 18.06.26	Fr, 31.07.26
33	Sanitär Rohinstallation	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26
34	Heizung Rohinstallation	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26
35	Lüftung Rohinstallation	Mo, 29.06.26	Fr, 17.07.26
36	Trockenbauwände Schließen Q2	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26
37	Estrich Bodendämmung	Mo, 03.08.26	Di, 04.08.26
38	Estricheinbau	Mi, 05.08.26	Do, 06.08.26
39	Estrich Trocknungszeit	Fr, 07.08.26	Fr, 14.08.26
40	Estrich Lüftungsmaßnahme durch AG	Sa, 08.08.26	Fr, 14.08.26
41	Tapete und Anstrich (Maler)	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
42	Türen technische Klärung (8 Wochen Bestellzeit)	Fr, 03.07.26	Fr, 03.07.26
43	Einbau Zargen	Mo, 31.08.26	Mi, 02.09.26
44	Glaswände technische Klärung (8 Wochen Bestellzeit)	Fr, 03.07.26	Fr, 03.07.26
45	Einbau Glaselemente	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
46	Einbau abgehängte Trockenbaudecken	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
47	Fliesenarbeiten WC-Bereiche	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
48	Einbau abgehängte OWA Decken	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26
49	Maler Decken u. WC Bereiche	Fr, 18.09.26	Fr, 18.09.26
50	Bodenbeläge	Mo, 21.09.26	Mi, 30.09.26
51	Sockel	Do, 01.10.26	Fr, 02.10.26
52	ELT Fertigmontage	Mo, 07.09.26	Fr, 30.10.26
53	HLS Fertigmontage	Do, 01.10.26	Mi, 07.10.26
54	Möbel Schreiner	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
55	Einbau Türblätter	Mi, 14.10.26	Do, 15.10.26
56	Baureinigung 1	Fr, 16.10.26	Di, 20.10.26
57	Möbel Industrie	Mi, 21.10.26	Fr, 23.10.26
58	Baureinigung (Glas) 2	Mo, 26.10.26	Mo, 26.10.26
59	Folierung Glaswände	Di, 27.10.26	Fr, 30.10.26
60	Sachverständigen Abnahmen	Mo, 02.11.26	Mo, 02.11.26
61	Bauabnahme	Di, 03.11.26	Di, 03.11.26
62	EDV	Do, 05.11.26	Fr, 06.11.26
63	Mängelbeseitigung nach Abnahme	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26
64	Endreinigung	Mi, 25.11.26	Fr, 27.11.26
65	Medizintechnik	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
66	⊟ Nutzer	Mo, 30.11.26	Do, 07.01.27
67	UMZUGSWOCHE	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
68	SPÄTESTER TERMIN Praxiseröffnung	Mo, 04.01.27	Do, 07.01.27
